

岐阜県駅（仮称）ほか新設 工事便り

2023年
3月
vol. 12

お知らせ

3月の主な作業は、ニューマチックケーソン基礎工事、仮付替道路造成工事、河川切回し工事となります。工事関係車両が公道を通行する際は、安全運転を徹底いたします。皆様には、ご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

工事状況等（2023. 2. 13 時点）

【進捗状況】

- ・ニューマチックケーソン基礎工：基礎3基の沈下掘削及び構築作業を行っております。写真は、ケーソン基礎部のコンクリート打設を行っている状況になります。
- ・仮付替道路造成工：市道坂本69号線仮付替道路の造成工事を行っております。
- ・河川切回し工：仮付替河川となる箇所の鋼矢板打設作業を2月から再開しました。

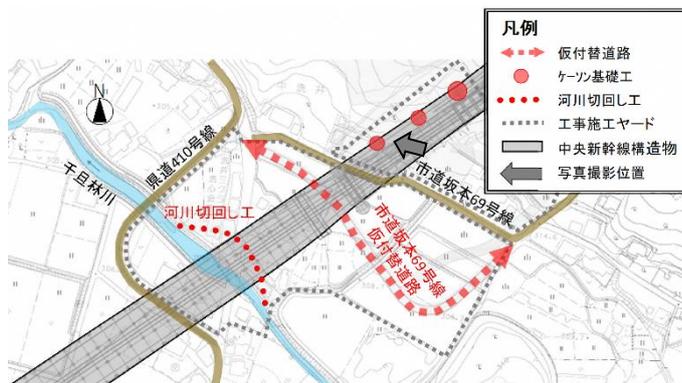


図 当月の主な工事範囲



写真 ケーソン基礎 コンクリート打設状況

【工事工程】

工程	3月	4月	5月	備考
ニューマチックケーソン基礎工				躯体構築、沈下掘削
仮付替道路造成工				路体・路床造成、排水工、舗装工 インフラ設備工
ヤード造成工				施工ヤード造成、排水工
河川切回し工				施工ヤード整備、鋼矢板打設、 土留め工、掘削工、護岸工

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

3月						
日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
			現場稼働日			休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線 岐阜県駅JV工事事務所
 （大成建設・ジェイアール東海建設・大豊建設）
 住所 中津川市茄子川1305-1
 電話 0573-67-7771
 担当者 さとう こめたに ねちと
 佐藤、米谷、根本

岐阜県駅（仮称）ほか新設 工事便り

2023年
2月
vol. 11

お知らせ

2月の主な作業は、ニューマチックケーソン基礎工事、仮付替道路造成工事、河川切回し工事となります。1月11日より、県道410号線仮付替道路の供用が開始いたしました。皆様には、ご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

工事状況等（2023. 1. 12 時点）

【進捗状況】

- ・ニューマチックケーソン基礎工：基礎3基の沈下掘削及び構築作業を行っております。
- ・仮付替道路造成工：市道坂本69号線仮付替道路の造成工事を行っております。
- ・河川切回し工：仮付替河川となる箇所掘削を行っております。
写真は、仮付替河川を掘削している状況写真になります。

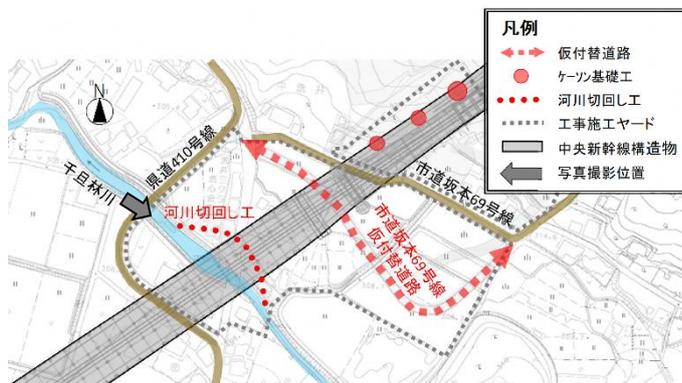


図 当月の主な工事範囲



写真 仮付替河川 掘削状況

【工事工程】

工程	2月	3月	4月	備考
ニューマチックケーソン基礎工				躯体構築、沈下掘削
仮付替道路造成工				路体・路床造成、排水工、舗装工
ヤード造成工				施工ヤード造成、排水工
河川切回し工				施工ヤード整備、鋼矢板打設、土留め工、掘削工、護岸工

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

		2月				
日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				
			現場稼働日			休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線 岐阜県駅JV工事事務所
 （大成建設・ジェイアール東海建設・大豊建設）
 住所 中津川市茄子川1305-1
 電話 0573-67-7771
 担当者 さとう こめたに ねもと
 佐藤、米谷、根本

岐阜県駅（仮称）ほか新設 工事便り

2023年
1月
vol. 10

お知らせ

1月の主な作業は、ニューマチックケーソン基礎工事、仮付替道路造成工事、河川切回し工事となります。県道410号線仮付替工事は完了し、1月より供用を開始する予定です。皆様には、ご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

工事状況等（2022. 12. 13 時点）

【進捗状況】

- ・ニューマチックケーソン基礎工：基礎3基の沈下掘削及び構築作業を行っております。
- ・仮付替道路造成工：市道坂本69号線仮付替道路の造成工事を行っております。
写真は、県道410号線仮付替道路の施工が完了した状況写真になります。
- ・河川切回し工：仮付替河川となる箇所の掘削を行っております。



図 当月の主な工事範囲



写真 県道410号線仮付替道路施工完了

【工事工程】

工程	1月	2月	3月	備考
ニューマチックケーソン基礎工	■	■	■	躯体構築、沈下掘削
仮付替道路造成工	■	■	■	路体・路床造成、排水工、舗装工
ヤード造成工	■	■	■	施工ヤード造成、排水工
河川切回し工	■	■	■	施工ヤード整備、鋼矢板打設

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

1月						
日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				
□	現場稼働日		■ 休工日			

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線 岐阜県駅JV工事事務所
 （大成建設・ジェイアール東海建設・大豊建設）
 住所 中津川市茄子川1305-1
 電話 0573-67-7771
 担当者 さとう こめたに ねもと
 佐藤、米谷、根本

岐阜県駅（仮称）ほか新設 工事便り

2022年
12
vol. 9

お知らせ

12月の主な作業は、ニューマチックケーソン基礎工事、仮付替道路造成工事、河川切回し工事となります。県道410号線仮付替工事は、間もなく完了する予定です。引き続き、安全作業で工事を進めて参りますので、ご理解、ご協力を宜しくお願い致します。

工事状況等（2022.11.11時点）

【進捗状況】

- ・ニューマチックケーソン基礎工：基礎3基の沈下掘削及び構築作業を行っております。
- ・仮付替道路造成工：土工事・舗装工事等を行っております。
写真は、県道410号線仮付替道路の舗装工事が完了した状況写真になります。
引き続き、ガードレール設置、白線引き等の仕上げ工事を進めて参ります。
- ・河川切回し工：仮付替河川を設置するために鋼矢板を打設しております。



図 当月の主な工事範囲



写真 県道410号線仮付替道路施工状況

【工事工程】

工種	12月	1月	2月	備考
ニューマチックケーソン基礎工	■			躯体構築、沈下掘削
仮付替道路造成工	■			舗装工、切土、盛土
ヤード造成工	■			施工ヤード造成、排水工 発生土運搬
河川切回し工	■			施工ヤード整備、鋼矢板打設

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

12月						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
□	現場稼働日		■ 休工日			

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線 岐阜県駅JV工事事務所
 (大成建設・ジェイアール東海建設・大豊建設)
 住所 中津川市茄子川1305-1
 電話 0573-67-7771
 担当者 さとう こめたに ねもと
 佐藤、米谷、根本

岐阜県駅（仮称）ほか新設 工事便り

2022年
11
vol. 8

お知らせ

11月の主な作業は、ニューマチックケーソン基礎工事、仮付替道路造成工事、河川切回し工事となります。一般道路及び河川近傍での作業を引き続き実施しますが、周辺環境に配慮した工事を進めて参りますので、ご理解、ご協力を宜しくお願い致します。

工事状況等（2022. 10. 13 時点）

【進捗状況】

- ・ニューマチックケーソン基礎工：基礎3基の沈下掘削及び構築作業を行っております。写真は、ケーソン基礎の函内から掘削土を揚重している状況写真になります。
- ・仮付替道路造成工：土工事・舗装工事等を行っております。
- ・河川切回し工：仮付替河川を設置するために鋼矢板を打設しております。

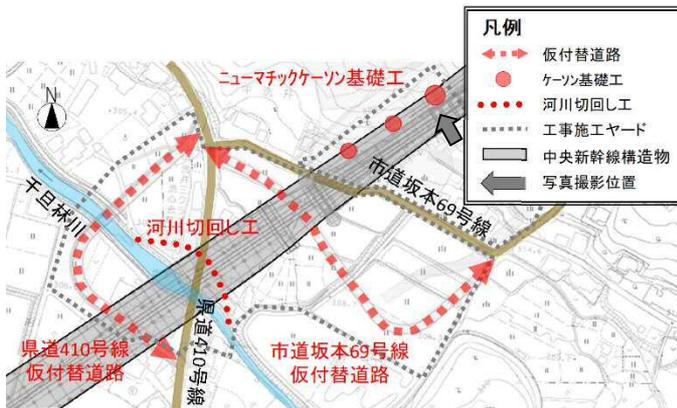


図 当月の主な工事範囲



写真 ケーソン基礎工 沈下掘削状況

【工事工程】

工程	11月	12月	1月	備考
ニューマチックケーソン基礎工				躯体構築、沈下掘削
仮付替道路造成工				路盤工、舗装工 切土、盛土
ヤード造成工				施工ヤード造成、排水工 発生土運搬
河川切回し工				施工ヤード整備、鋼矢板打設

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

11月						
日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			
□	現場稼働日		休工日			

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線 岐阜県駅JV工事事務所
 (大成建設・ジェイアール東海建設・大豊建設)
 住所 中津川市茄子川1305-1
 電話 0573-67-7771
 担当者 さとう こめたに ねもと
 佐藤、米谷、根本

岐阜県駅（仮称）ほか新設 工事便り

2022年
10
vol. 7

お知らせ

10月の主な作業は、ニューマチックケーソン基礎工事、仮付替道路造成工事、千旦林川の隣接構造物を構築するための河川切回し工事となります。環境に配慮した工事を引き続き進めて参りますので、ご理解、ご協力を宜しくお願い致します。

工事状況等（2022. 9. 13 時点）

【進捗状況】

- ・ニューマチックケーソン基礎工：基礎3基の沈下掘削及び構築作業を行っております。
 - ・仮付替道路造成工：土工事・舗装工事等を行っております。
 - ・河川切回し工：仮付替河川を設置するために鋼矢板を打設しております。
- 写真は、移動式クレーンを使用して、鋼矢板を打設している状況写真となります。

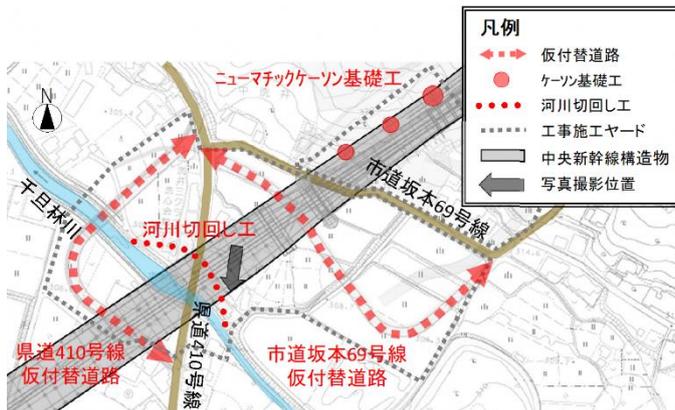


図 当月の主な工事範囲



写真 河川切回し工 鋼矢板打設状況

【工事工程】

工程	10月	11月	12月	備考
ニューマチックケーソン基礎工				躯体構築、掘削
仮付替道路造成工				路盤工、舗装工 切土、盛土
ヤード造成工				施工ヤード造成、排水工 発生土運搬
河川切回し工				施工ヤード整備、矢板打設

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

10月						
日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					
□	現場稼働日		■ 休工日			

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線 岐阜県駅JV工事事務所
 (大成建設・ジェイアール東海建設・大豊建設)
 住所 中津川市茄子川1305-1
 電話 0573-67-7771
 担当者 さとう こめたに ねもと
 佐藤、米谷、根本

岐阜県駅（仮称）ほか新設 工事便り

2022年
9
vol. 6

お知らせ

9月の主な作業は、8月に続きニューマチックケーソン基礎工事と仮付替道路造成工事となります。県道410号線の切替えに向けた、仮付替道路造成工事等について、鋭意工事を進めて参りますので、ご理解・ご協力を宜しくお願い致します。

工事状況等（2022. 8. 9時点）

【進捗状況】

- ・ニューマチックケーソン基礎工：基礎3基の沈下掘削及び構築作業を並行して行っております。写真は、ニューマチックケーソン基礎工3基の施工状況全景になります。
- ・仮付替道路造成工：千旦林川付近での仮橋設置工事が完了しました。引き続き、土工事・舗装工事を進めて参ります。

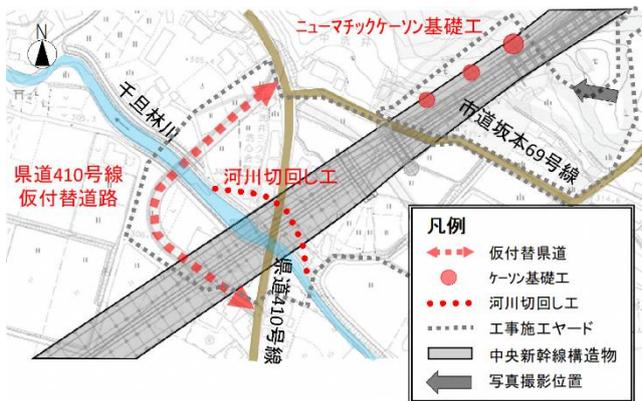


図 主な工事施工ヤード範囲

写真 ニューマチックケーソン基礎工 施工状況全景

【工事工程】

工種	9月	10月	11月	備考
ニューマチックケーソン基礎工				躯体構築、掘削
仮付替道路造成工				切土・盛土、路盤工
ヤード造成工				施工ヤード造成、排水工
河川切回し工				施工ヤード整備、矢板打設

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

9月						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28			
<input type="checkbox"/>	現場稼働日		<input type="checkbox"/>	休工日		

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線 岐阜県駅JV工事事務所
 (大成建設・ジェイアール東海建設・大豊建設)
 住所 中津川市茄子川1305-1
 電話 0573-67-7771
 担当者 さとう、こめたに、うの
 佐藤、米谷、宇野

岐阜県駅（仮称）ほか新設 工事便り

2022年
8
vol. 5

お知らせ

岐阜県駅（仮称）の工事に伴い、県道410号線の一部を仮付替え致します。新しい道路（仮付替道路）への切り替えは、道路造成工事を10月頃（予定）に完了させた後に行います。皆様には、ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力を宜しくお願い致します。

工事状況等（2022. 7. 15時点）

【進捗状況】

- 仮付替道路造成工：引き続き千旦林川付近で仮付替道路（県道410号線）の仮橋設置工事を施工していきます。写真は、仮付替道路の仮橋の組立を実施している状況です。仮橋設置後は、土工事・舗装工事を行います。切り替えに向けて、鋭意工事を進めて参ります。

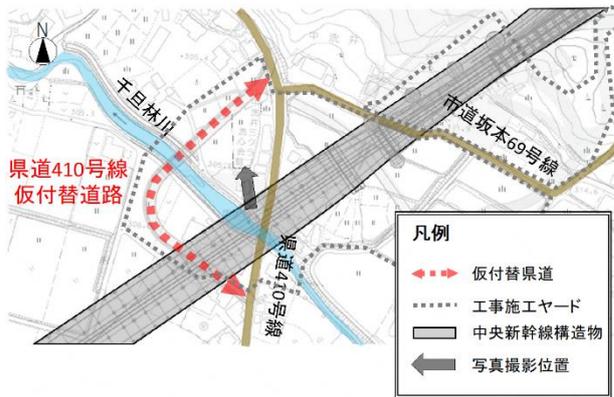


図 主な工事施工ヤード範囲



写真 仮付替道路 仮橋組立状況

【工事工程】

工程	8月	9月	10月	備考
ニューマチックケーン基礎工				躯体構築、掘削
仮付替道路造成工				切土・盛土、路盤工 仮橋設置
ヤード造成工				施工ヤード造成、排水工
河川切回し工				施工ヤード整備、矢板打設

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

		8月				
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
	現場稼働日	休工日				

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線 岐阜県駅JV工事事務所
 （大成建設・ジェイアール東海建設・大豊建設）
 住所 中津川市茄子川1305-1
 電話 0573-67-7771
 担当者 さとう、うの、こめたに
 佐藤、宇野、米谷

岐阜県駅（仮称）ほか新設 工事便り

2022年
7
vol. 4

お知らせ

6月11日に岐阜県駅(仮称)ほか新設工事の安全祈願・起工式を執り行いました。引き続き「安全、環境の保全、地域との連携」を重視し、工事を進めて参ります。ご理解、ご協力を宜しくお願い致します。

工事状況等（2022. 6. 14時点）

【進捗状況】

- ・ニューマチックケーソン基礎工：橋脚基礎3基の掘削・躯体構築を並行して進めています。写真は、コンクリート打設作業を行っているところです。
- ・仮付替道路造成工：引き続き、千旦林川付近で仮橋設置工事を進めて参ります。

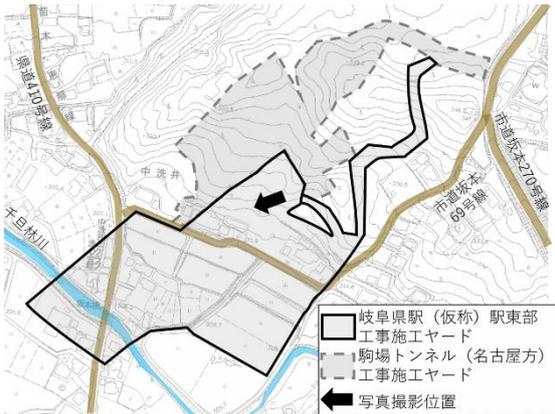


図 主な工事施工ヤード範囲



写真 コンクリート打設状況

【工事工程】

工程	7月	8月	9月	備考
ニューマチックケーソン基礎工				躯体構築、掘削
仮付替道路造成工				切土・盛土、路盤工 仮橋設置
ヤード造成工				施工ヤード造成、排水工
河川切回し工				施工ヤード整備、矢板打設

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

日	月	火	7月 水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						
<input type="checkbox"/>						

現場稼働日 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線 岐阜県駅JV工事事務所
 (大成建設・ジェイアール東海建設・大豊建設)
 住所 中津川市茄子川1305-1
 電話 0573-67-7771
 担当者 さとう、うの、こめたに
 佐藤、宇野、米谷

岐阜県駅（仮称）ほか新設 工事便り

2022年
6
vol. 3

お知らせ

6月の主な作業は、5月に続きニューマチックケーソン基礎工事と仮付替道路造成工事となります。これから雨季になりますが、環境に配慮した工事を引き続き進めて参りますので、ご理解、ご協力を宜しくお願い致します。

工事状況等（2022. 5 .17時点）

【進捗状況】

- ・ニューマチックケーソン基礎工：基礎の構築作業を行っています。
写真は、圧気工法による沈下掘削に向けた設備の設置作業を行っているところです。
- ・仮付替道路造成工：6月から千旦林川付近で仮橋設置工事を開始していきます。

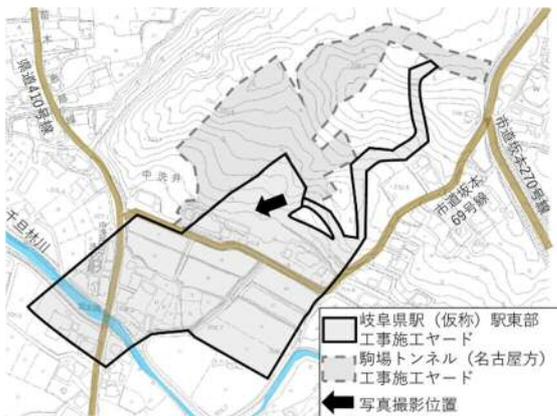


図 主な工事施工ヤード範囲



写真 基礎構築状況

【工事工程】

工種	6月	7月	8月	備考
ニューマチックケーソン基礎工				躯体構築、掘削 仮設備設置
仮付替道路造成工				切土・盛土、路盤工 仮橋設置
ヤード造成工				施工ヤード造成

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

6月						
日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

現場稼働日 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線 岐阜県駅JV工事事務所
 (大成建設・ジェイアール東海建設・大豊建設)
 住所 中津川市茄子川1305-1
 電話 0573-67-7771
 担当者 さとう、うの、こめたに
 佐藤、宇野、米谷

岐阜県駅（仮称）ほか新設 工事便り

2022年
5月
vol.2

お知らせ

5月の主な作業は、4月に続きニューマチックケーソン基礎工事と付替道路造成工事となります。周辺住民の方々の生活環境に配慮しながら工事を進めて参りますので、ご理解、ご協力を宜しくお願い致します。

工事状況等（2022.4.15時点）

【進捗状況】

- ニューマチックケーソン基礎工：基礎の構築作業を行っています。4月上旬に初回の基礎コンクリート打設が完了しました。写真は、基礎コンクリートの型枠の取り外しをしているところです。5月から圧気工法による沈下掘削を開始する予定です。

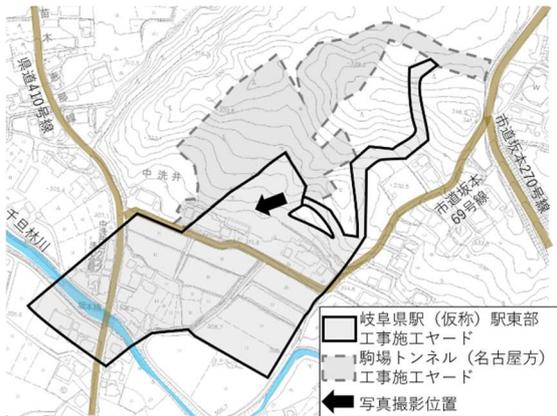


図 主な工事施工ヤード範囲



写真 基礎構築状況

【工事工程】

工程	5月	6月	7月	備考
ニューマチックケーソン基礎工				躯体構築、掘削 仮設備設置
仮付替道路造成工				切土・盛土、路盤工 仮橋設置
ヤード造成工				施工ヤード造成

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

5月						
日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

現場稼働日 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線 岐阜県駅JV工事事務所
 （大成建設・ジェイアール東海建設・大豊建設）
 住所 中津川市茄子川1305-1
 電話 0573-67-7771
 担当者 さとう、うの、こめたに
 佐藤、宇野、米谷
