

中央アルプストンネル(山口) 工事だより

2024 年
3 月
vol. 81

お知らせ

今月も本坑の品川方への掘削と路盤および覆工コンクリート工事を進めます。
3月は月初と月末とでは大きく気候が変わりますので、作業開始前の情報収集を行い、気候の急変にも対応できる準備と心構えをもって作業を行います。
皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご協力をよろしくお願いいたします。

工事状況等(2024.2.10時点)

【進捗状況】

- トンネル工：現在、本坑を品川方へ掘削しています。約2,060m分の掘削が完了しています。その後方で路盤と覆工のコンクリート打設工事を交互に行っています。


【工事工程】

工 種	4月	5月	6月	備考
トンネル工				
発生土運搬 (坂本地区)				1日40台(4往復)程度運搬予定
(中津西地区)				1日10台(5往復)程度運搬予定
(馬籠地区)				状況により運搬することあり



覆工コンクリート工事

【進捗図】

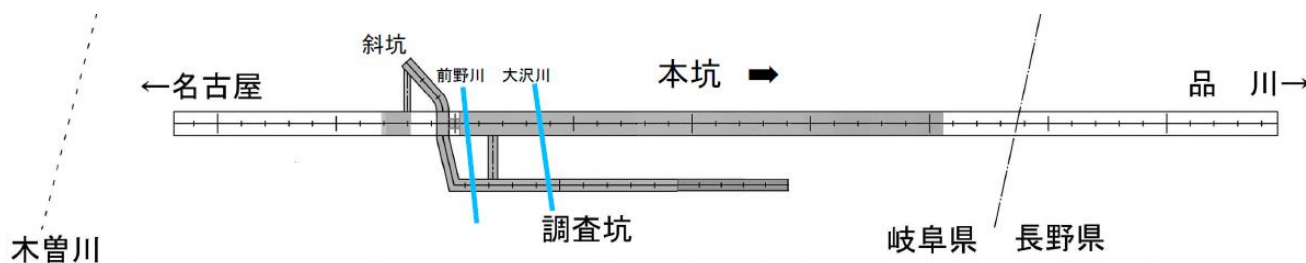

3月						
日	月	火	水	木	金	土
3	4	5	6	7	1	2
10	11	12	13	14	8	9
17	18	19	20	21	15	16
24	25	26	27	28	22	23
31					29	30

発生土運搬予定日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

鹿島・日本国土開発・吉川特定建設工事共同企業体
中央アルプストンネル(山口)JV工事事務所
住 所 中津川市山口1605-1
電 話 0573-67-9317
(渉外担当：永柄、発生土運搬担当：熊谷)

中央アルプストンネル(山口) 工事だより

2024 年
2 月
vol. 80

お知らせ

今月も本坑の品川方への掘削と路盤および覆工コンクリート工事を進めます。
寒暖差が大きくなりやすい時期です。しっかりとした体調管理を行い、万全の体調にて
安全作業、安全運転を努めてまいります。
皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご協力をよろしくお願いいたします。

工事状況等(2024.1.12時点)

【進捗状況】

- トンネル工：現在、本坑を品川方へ掘削しています。約 2,020m 分の掘削が完了して
います。その後方で路盤と覆工のコンクリート打設工事を交互に行ってい
ます。


【工事工程】

工 種	2月	3月	4月	備考
トンネル工				
発生土運搬 (坂本地区)				1日40台(4往復)程度運搬予定
(中津西地区)				1日10台(5往復)程度運搬予定
(馬籠地区)				状況により運搬することあり



本坑品川方 2000m 到達時

【進捗図】

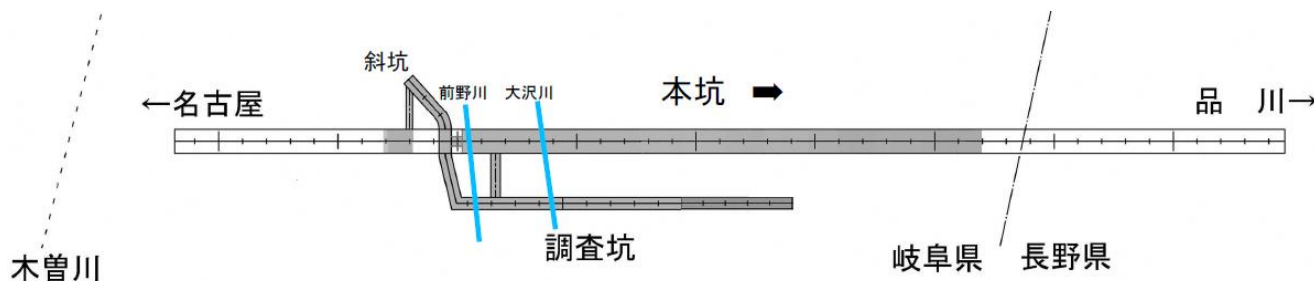

2月

日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29		
発生土運搬予定日						

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

鹿島・日本国土開発・吉川特定建設工事共同企業体
中央アルプストンネル(山口)JV工事事務所
住 所 中津川市山口1605-1
電 話 0573-67-9317
(渉外担当：永柄、発生土運搬担当：熊谷)

中央アルプストンネル(山口) 工事だより

2024 年
1 月
vol. 79

お知らせ

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
今月から路盤および覆工コンクリート工事を再開しますので、生コン車の往来が増えます。工事同様に車両の運転においても安全に注意してまいります。
本年も昨年同様に皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

工事状況等(2023.12.11時点)

【進捗状況】

- トンネル工：現在、本坑を品川方へ掘削しています。約2,000m分の掘削が完了しています。


【工事工程】

工種	1月	2月	3月	備考
トンネル工				
発生土運搬 (坂本地区)				1日40台(4往復)程度運搬予定
(中津西地区)				1日10台(5往復)程度運搬予定
(馬籠地区)				状況により運搬することあり



本坑

【進捗図】

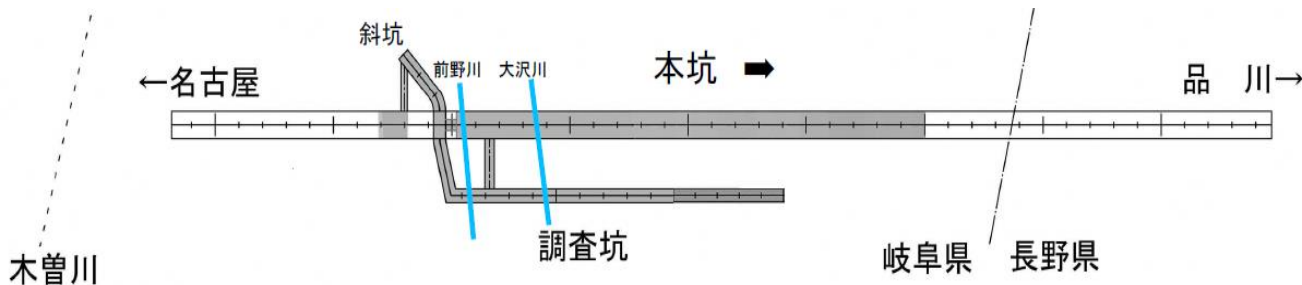

1月						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
	発生土運搬予定日					

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

鹿島・日本国土開発・吉川特定建設工事共同企業体
中央アルプストンネル(山口)JV工事事務所
住所 中津川市山口1605-1
電話 0573-67-9317
(渉外担当：永柄、発生土運搬担当：熊谷)

中央アルプストンネル(山口) 工事だより

2023年
12月
vol. 78

お知らせ

今月も引き続き、本坑の品川方への掘削を進めます。
今年には新型コロナの5類移行、酷暑などありましたが、皆様のご協力のもと、工事を安全に進めることができました。今年も残すところあと1ヶ月。笑顔で年末年始をむかえるためにも引き続き安全第一で工事を進めてまいります。

工事状況等(2023.11.10時点)

【進捗状況】

- トンネル工：現在、本坑を品川方へ掘削しています。約1,950m分の掘削が完了しています。


【工事工程】

工種	12月	1月	2月	備考
トンネル工				
発生土運搬 (坂本地区)				1日40台(4往復)程度運搬予定
(中津西地区)				1日10台(5往復)程度運搬予定
(馬籠地区)				状況により運搬することあり



坑口部

【進捗図】

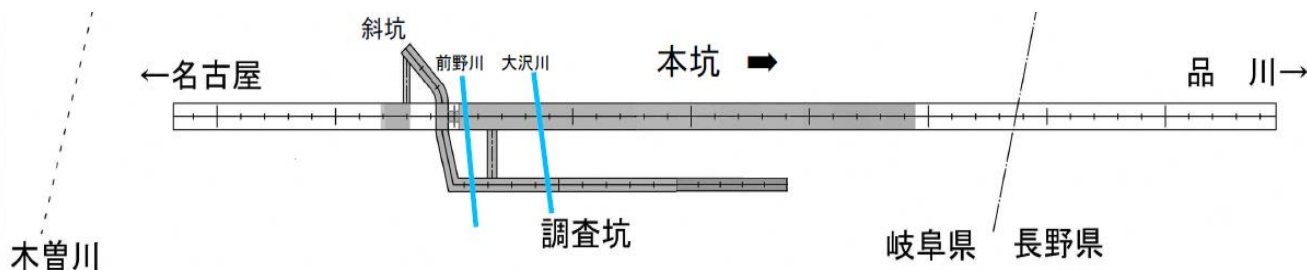

12月						
日	月	火	水	木	金	土
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

発生土運搬予定日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

鹿島・日本国土開発・吉川特定建設工事共同企業体
中央アルプストンネル(山口)JV工事事務所
住所 中津川市山口1605-1
電話 0573-67-9317
(渉外担当：永柄、発生土運搬担当：熊谷)

中央アルプストンネル(山口) 工事だより

2023 年
11 月
vol. 77

お知らせ

今月も引き続き、本坑の品川方への掘削を進めます。路盤および覆工コンクリート工事は年内まで一時的に休止することから、生コン車の運搬が従来よりも減る見込みです。工事の施工、ダンプの運転とも安全第一に進めて参ります。皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

工事状況等(2023. 10. 11 時点)

【進捗状況】

- トンネル工：現在、本坑を品川方へ掘削しています。約 1,880m 分の掘削が完了しています。その後方で路盤と覆工のコンクリート打設工事を交互に行っています。


【工事工程】

工 種	11月	12月	1月	備考
トンネル工				
発生土運搬 (坂本地区)				1日40台(4往復)程度運搬予定
(中津西地区)				1日10台(5往復)程度運搬予定
(馬籠地区)				状況により運搬することあり



路盤・覆工状況

【進捗図】

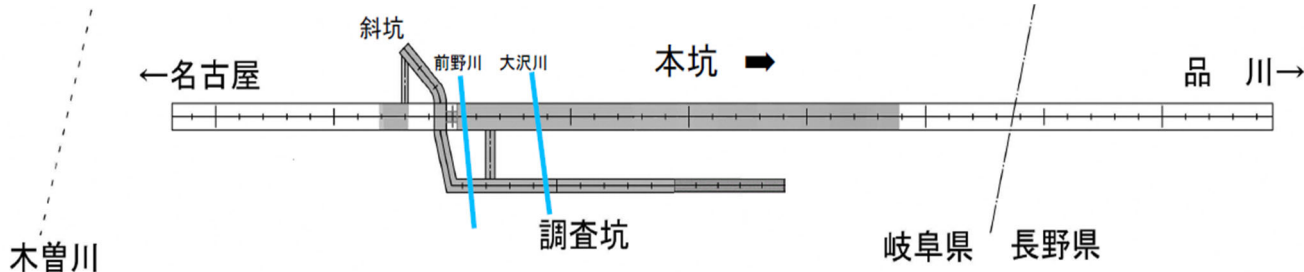

11月

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

☐ 発生土運搬予定日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

鹿島・日本国土開発・吉川特定建設工事共同企業体
中央アルプストンネル(山口)JV工事事務所
住 所 中津川市山口1605-1
電 話 0573-67-9317
(渉外担当：永柄、発生土運搬担当：熊谷)

中央アルプストンネル(山口) 工事だより

2023年
10月
vol. 76

お知らせ

今月も本坑の品川方への掘削と路盤および覆工コンクリート工事を進めます。
秋のつるべ落としと言われるように、この時期はすぐに暗くなるので早めのライト点灯を
心掛けダンプの安全運行に努めて参ります。
皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

工事状況等(2023.9.11時点)

【進捗状況】

- トンネル工：現在、本坑を品川方へ掘削しています。約 1,830m分の掘削が完了して
います。その後方で路盤と覆工のコンクリート打設工事を交互に行ってい
ます。


【工事工程】

工 種	10月	11月	12月	備考
トンネル工				
発生土運搬 (坂本地区)				1日50台(4往復)程度運搬予定
(中津西地区)				1日10台(5往復)程度運搬予定
(馬籠地区)				状況により運搬することあり



本 坑

【進捗図】

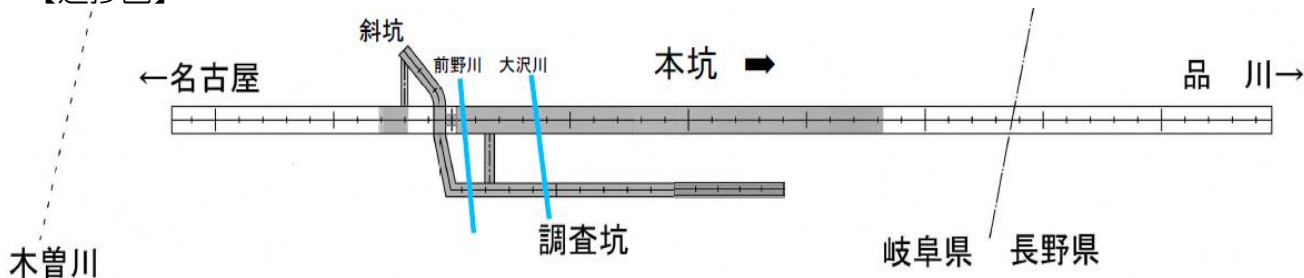

10月						
日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

☐ 発生土運搬予定日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

鹿島・日本国土開発・吉川特定建設工事共同企業体
中央アルプストンネル(山口)JV工事事務所
住 所 中津川市山口1605-1
電 話 0573-67-9317
(渉外担当：永柄、発生土運搬担当：熊谷)

中央アルプストンネル(山口) 工事だより

2023 年
9 月
vol. 75

お知らせ

今月も本坑の品川方への掘削と路盤および覆工コンクリート工事を進めます。
天候の急変に加え、台風上陸が多い季節になってきましたので、車両運行時には車間距離の確保と安全な速度による走行に留意して参ります。
皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

工事状況等(2023.8.10時点)

【進捗状況】

- トンネル工：現在、本坑を品川方へ掘削しています。約 1,820m分の掘削が完了しています。その後方で路盤と覆工のコンクリート打設工事を交互に行っています。


【工事工程】

工 種	9月	10月	11月	備考
トンネル工				
発生土運搬 (坂本地区)				1日50台(4往復)程度運搬予定
(中津西地区)				1日10台(5往復)程度運搬予定
(馬籠地区)				状況により運搬することあり



中津川消防署との救護訓練状況

【進捗図】

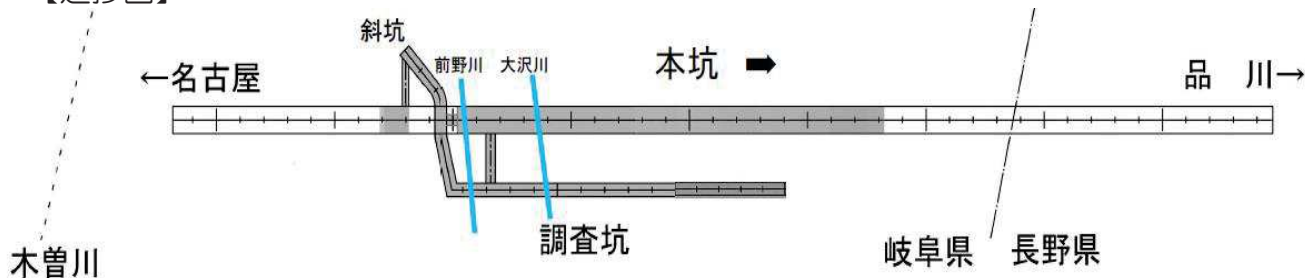

9月						
日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
発生土運搬予定日						

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

鹿島・日本国土開発・吉川特定建設工事共同企業体
中央アルプストンネル(山口)JV工事事務所
住 所 中津川市山口1605-1
電 話 0573-67-9317
(渉外担当：永柄、発生土運搬担当：熊谷)

中央アルプストンネル(山口) 工事だより

2023 年
8 月
vol. 74

お知らせ

今月も本坑の品川方への掘削と路盤および覆工コンクリート工事を進めます。
夏本番を迎え、猛暑の時期となってきました。熱中症に気を付けながら安全第一で作業を進めて参ります。
皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

工事状況等(2023.7.10時点)

【進捗状況】

- トンネル工：現在、本坑を品川方へ掘削しています。約 1,800m 分の掘削が完了しています。その後方で路盤と覆工のコンクリート打設工事を交互に行っています。


【工事工程】

工 種	8月	9月	10月	備考
トンネル工				
発生土運搬 (坂本地区)				1日50台(4往復)程度運搬予定
(中津西地区)				1日10台(5往復)程度運搬予定
(馬籠地区)				状況により運搬することあり



路盤・覆工コンクリート状況

【進捗図】

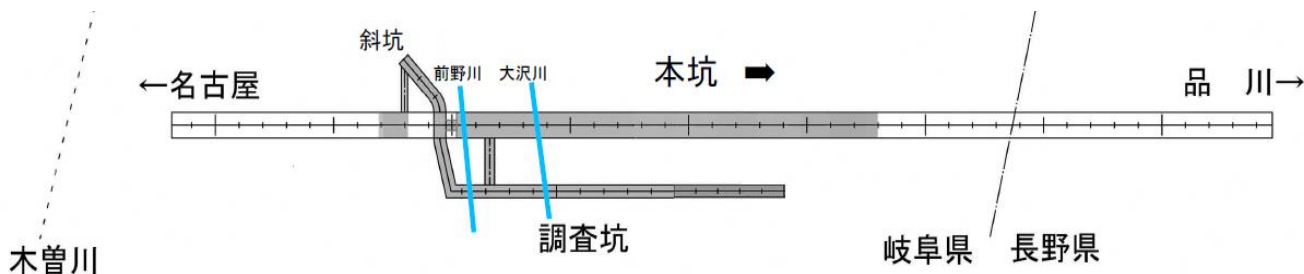

8月						
日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
発生土運搬予定日						

【工事に関するご意見・お問い合わせ】
鹿島・日本国土開発・吉川特定建設工事共同企業体
中央アルプストンネル(山口)JV工事事務所
住 所 中津川市山口1605-1
電 話 0573-67-9317
(渉外担当：永柄、発生土運搬担当：熊谷)

中央アルプストンネル(山口) 工事だより

2023年
7月
vol. 73

お知らせ

今月も本坑の品川方への掘削と路盤および覆工コンクリート工事を進めます。
暑い夏の時期だけでなく、身体が暑さに慣れていない梅雨明け時期から熱中症の発症リスクが高くなってきますので、予防対策をしっかりと行い安全に作業を進めて参ります。
皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

工事状況等(2023. 6. 9 時点)

【進捗状況】


- トンネル工：現在、本坑を品川方へ掘削しています。約 1,740m分の掘削が完了し、順調に掘削を進めております。その後方でコンクリート工事を施工しています。
トンネルの切羽は安定しており、切羽面での湧水も多くありません。

【工事工程】

工 種	7月	8月	9月	備考
トンネル工				
発生土運搬 (坂本地区)				1日50台(4往復)程度運搬予定
(中津西地区)				1日10台(5往復)程度運搬予定
(馬籠地区)				状況により運搬することあり



【進捗図】

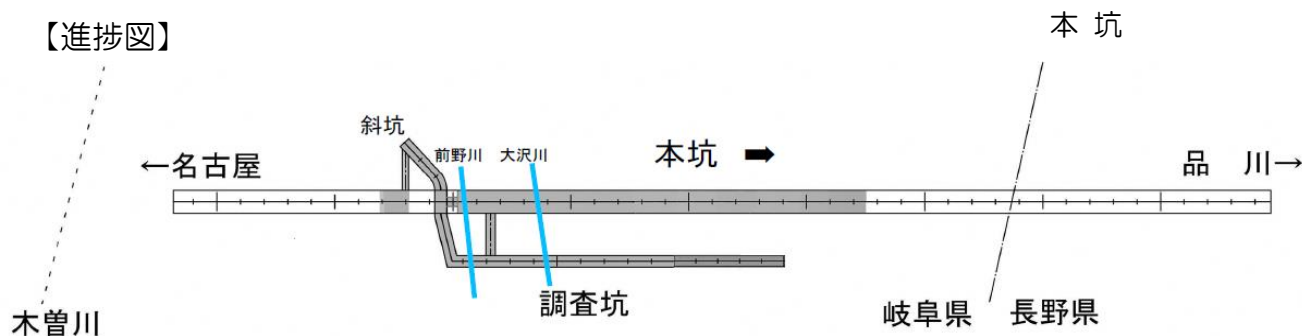

7月						
日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					
発生土運搬予定日						

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

鹿島・日本国土開発・吉川特定建設工事共同企業体
中央アルプストンネル(山口)JV工事事務所
住 所 中津川市山口1605-1
電 話 0573-67-9317
(渉外担当：永柄、発生土運搬担当：熊谷)

中央アルプストンネル(山口) 工事だより

2023年
6月
vol. 72

お知らせ

今月も本坑の品川方への掘削と路盤および覆工コンクリート工事を進めます。
梅雨の時期となりますので、車両運行時にはスリップや視界不良の危険を回避するため、
十分な車間距離の確保と安全速度での運転に努めます。
皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

工事状況等(2023.5.12時点)

【進捗状況】


- ・トンネル工：現在、本坑を品川方へ掘削しています。約1,650m分の掘削が完了し、
順調に掘削を進めております。その後方でコンクリート工事を施工して
います。
トンネルの切羽は安定しており、切羽面での湧水も多くありません。

【工事工程】

工 種	6月	7月	8月	備考
トンネル工				
発生土運搬 (坂本地区)				1日50台(4往復)程度運搬予定
(中津西地区)				1日10台(5往復)程度運搬予定
(馬籠地区)				状況により運搬することあり



【進捗図】

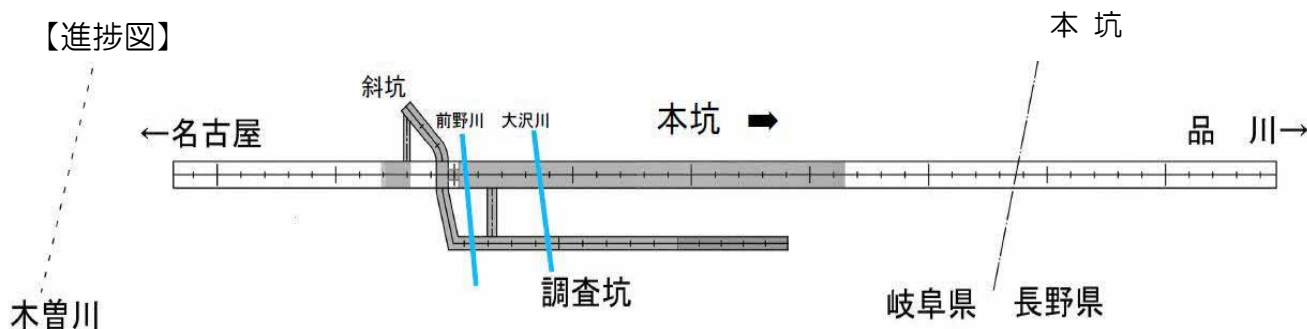

6月						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

発生土運搬予定日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

鹿島・日本国土開発・吉川特定建設工事共同企業体
中央アルプストンネル(山口)JV工事事務所
住 所 中津川市山口1605-1
電 話 0573-67-9317
(渉外担当：永柄、発生土運搬担当：熊谷)

中央アルプストンネル(山口) 工事だより

2023 年
5 月
vol. 71

お知らせ

今月も本坑の品川方への掘削と路盤のコンクリート工事を進めます。
また、今月からトンネル壁面をコンクリートで覆う作業、
覆工（ふっこう）コンクリート工事也开始する予定です。
皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

工事状況等（2023. 4. 10 時点）

【進捗状況】


- ・トンネル工：現在、本坑を品川方へ掘削しています。約 1,600m 分の掘削が完了し、順調に掘削を進めております。その後方でコンクリート工事を施工しています。
トンネルの切羽は安定しており、切羽面での湧水も多くありません。

【工事工程】

工 種	5月	6月	7月	備考
トンネル工				
発生土運搬 (坂本地区)				1日50台(4往復)程度運搬予定
(中津西地区)				1日10台(5往復)程度運搬予定
(馬籠地区)				状況により運搬することあり



【進捗図】

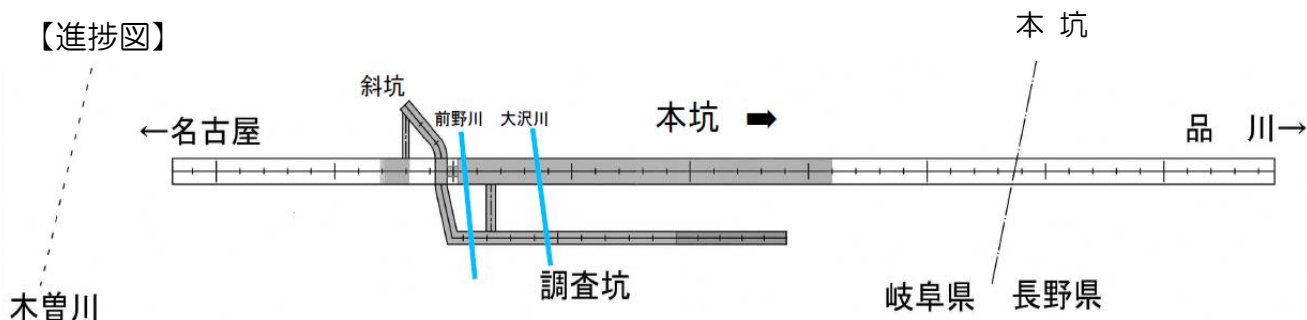

5月

日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

発生土運搬予定日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

鹿島・日本国土開発・吉川特定建設工事共同企業体
中央アルプストンネル(山口)JV工事事務所
住 所 中津川市山口1605-1
電 話 0573-67-9317
(渉外担当：永柄、発生土運搬担当：熊谷)

※4/29(土)～5/7(日)は休工を予定しておりますが、電話でのご意見・お問い合わせは可能となっております。

中央アルプストンネル(山口) 工事だより

2023 年
4 月
vol. 70

お知らせ

今月も本坑の品川方への掘削およびコンクリート工事を進めます。
新年度を迎え、「安全は全てに優先する」ことを改めて肝に銘じ、工事を進めてまいります。
皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

工事状況等(2023.3.8時点)

【進捗状況】

- トンネル工：現在、本坑を品川方へ掘削しています。約 1,480m 分の掘削が完了し、順調に掘削を進めております。その後方でコンクリート工事を施工しています。
トンネルの切羽は安定しており、切羽面での湧水も多くありません。


【工事工程】

工 種	4月	5月	6月	備考
トンネル工				
発生土運搬 (坂本地区)				1日50台(4往復)程度運搬予定
(中津西地区)				1日10台(5往復)程度運搬予定
(馬籠地区)				状況により運搬することあり



本 坑

【進捗図】

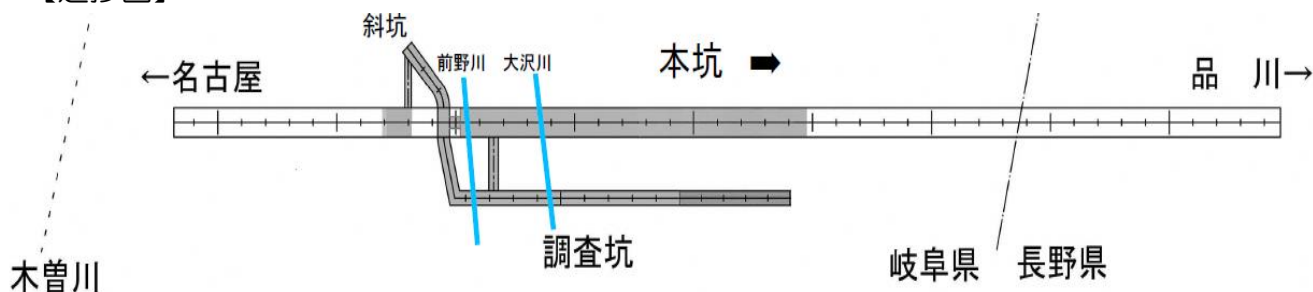

4月						
日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

☐ 発生土運搬予定日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

鹿島・日本国土開発・吉川特定建設工事共同企業体
中央アルプストンネル(山口)JV工事事務所
住 所 中津川市山口1605-1
電 話 0573-67-9317
(渉外担当：永柄、発生土運搬担当：熊谷)
