

中央新幹線自立式ガイドウェイ側壁 製作保管（中津川地区）工事だより

2025年
3月
vol. 30

お知らせ


中央新幹線ガイドウェイ資材置場ヤード内にて盛土工、門型クレーン設置工、電気部品取付テント等設置工の工事を進めます。
工事に伴い資材等の運搬を予定していますので、交通マナーや交通ルールを守り工事を進めます。
地域の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

現場状況等（2025. 2. 14日時点）

- ・盛土工（他工事発生土）：搬入した土で掘削部を盛土しています。



盛土工

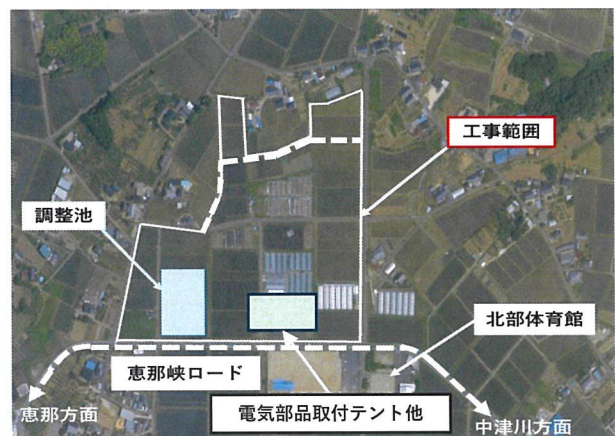

本工事の工事範囲

【工事工程】

工 種	3 月	4 月	5 月	備考
盛土工（他工事発生土）				主にトンネル発生土をダンプで搬入し盛土します。
門型クレーン設置工				門型クレーンの設置をします。
電気部品取付けテント等設置工				電気部品取付テント等の設置をします。

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

3 月						
日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31		現場稼働日			休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

- ・盛土工・門型クレーン設置工
三井住友建設・ジェイアール東海建設JV 担当：池田
住所 中津川市千旦林1574地内
電話 0573-78-2515
- ・電気部品取付テント等設置工
ジェイアール東海建設名古屋統括作業所 担当：熊田
住所 愛知県名古屋市中村区亀島 2-1-1
電話 052-454-3522

中央新幹線自立式ガイドウェイ側壁 製作保管（中津川地区）工事日より

2025年
2月
vol. 29

お知らせ

構造物の基礎部を構築するための、他工事発生土を運搬して整地する造成工事を進めていきます。


皆様にはご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。

現場状況等（2025. 1. 15日時点）

- ・盛土工（他工事発生土）：搬入した土で掘削部を盛土しています。



盛土工

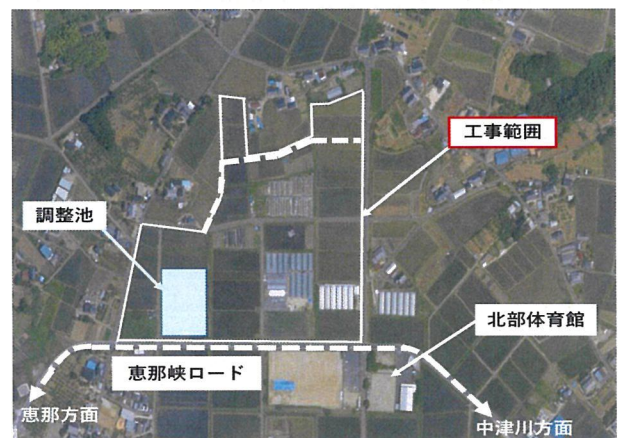

本工事の工事範囲

【工事工程】

工 種	2月	3月	4月	備考
盛土工（他工事発生土）				主にトンネル発生土をダンプで搬入し盛土します。

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

2 月						
日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

現場稼働日 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

ガイドウェイ製作保管工事JV工事事務所
（三井住友建設・ジェイアール東海建設JV）

住 所 中津川市千旦林1574地内

電 話 0573-78-2515

中央新幹線自立式ガイドウェイ側壁 製作保管（中津川地区）工事だより

2025年
1月
vol. 28

お知らせ

構造物の基礎部を構築するための、他工事発生土を運搬して整地する造成工事を進めていきます。

皆様にはご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。

現場状況等（2024. 12. 15日時点）

- ・盛土工（他工事発生土）：搬入した土で掘削部を盛土しています。



盛土工



本工事の工事範囲

【工事工程】

工 種	1月	2月	3月	備考
盛土工（他工事発生土）				主にトンネル発生土をダンプで搬入し盛土します。

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

1 月						
日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
			現場稼働日			休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

ガイドウェイ製作保管工事JV工事事務所
（三井住友建設・ジェイアール東海建設JV）
住 所 中津川市千旦林1574地内
電 話 0573-78-2515

中央新幹線自立式ガイドウェイ側壁 製作保管（中津川地区）工事だより

2024年
12月
vol. 27

お知らせ

構造物の基礎部を構築するための、他工事発生土を運搬して整地する造成工事を進めていきます。


皆様にはご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。

現場状況等（2024. 11. 15日時点）

- 盛土工（他工事発生土）：搬入した土で掘削部を盛土しています。



盛土工

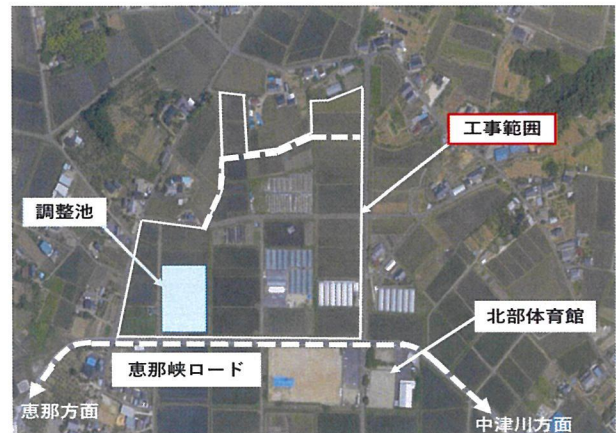

本工事の工事範囲

【工事工程】

工 種	12月	1月	2月	備考
盛土工（他工事発生土）				主にトンネル発生土をダンプで搬入し盛土します。

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

12月						
日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				
			現場稼働日	休工日		

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

ガイドウェイ製作保管工事JV工事事務所
（三井住友建設・ジェイアール東海建設JV）
住 所 中津川市千旦林1574地内
電 話 0573-78-2515

中央新幹線自立式ガイドウェイ側壁 製作保管（中津川地区）工事日より

2024年
11月
vol. 26

お知らせ

構造物の基礎部を構築するための、他工事発生土を運搬して整地する造成工事を進めていきます。
皆様にはご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。

現場状況等（2024. 10. 15日時点）

- ・盛土工（他工事発生土）：搬入した土で掘削部を盛土しています。
- ・基礎工：コンクリートの基礎の構築をしています。



盛土工



本工事の工事範囲

【工事工程】

工 種	1 1 月	1 2 月	1 月	備考
盛土工（他工事発生土）				主にトンネル発生土をダンプで搬入し盛土します。
基礎工				コンクリートで基礎を構築します。
運搬クレーン設置工				運搬クレーンの設置をします。

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

11 月						
日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
			現場稼働日			休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

ガイドウェイ製作保管工事JV工事事務所
（三井住友建設・ジェイアール東海建設JV）
住 所 中津川市千旦林字中原1574地内
電 話 0573-78-2515
※11月6日より記載の住所に移転します。

中央新幹線自立式ガイドウェイ側壁 製作保管（中津川地区）工事だより

2024年
10月
vol. 25

お知らせ


構造物の基礎部を構築するための、他工事発生土を運搬して整地する造成工事や、コンクリートの基礎の構築を進めていきます。
皆様にはご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。

現場状況等（2024. 9. 10日時点）

- ・盛土工（他工事発生土）：搬入した土で掘削部を盛土しています。
- ・基礎工：コンクリートの基礎の構築をしています。



盛土工

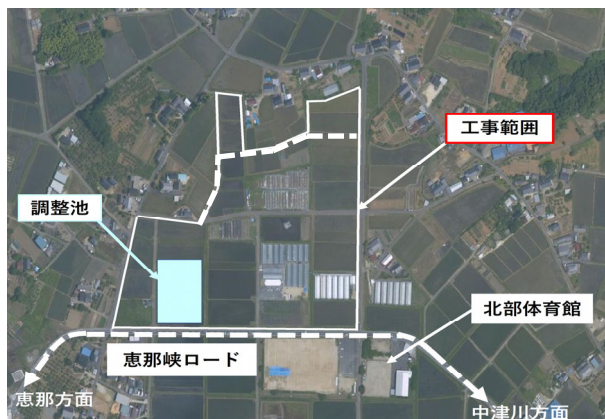

本工事の工事範囲

【工事工程】

工 種	10月	11月	12月	備考
盛土工（他工事発生土）				主にトンネル発生土をダンプで搬入し盛土します。
基礎工				コンクリートで基礎を構築します。

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

10月						
日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
			現場稼働日			休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

ガイドウェイ製作保管工事JV工事事務所
（三井住友建設・ジェイアール東海建設JV）
住 所 中津川市茄子川中垣外1642
電 話 0573-78-2515

中央新幹線自立式ガイドウェイ側壁 製作保管（中津川地区）工事だより

2024年
9月
vol. 24

お知らせ

構造物の基礎部を構築するための、他工事発生土を運搬して整地する造成工事を進めています。

皆様にはご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。

現場状況等（2024. 8. 9日時点）

- 盛土工（他工事発生土）：搬入した土で掘削部を盛土しています。



盛土工



本工事の工事範囲

【工事工程】

工 種	9月	10月	11月	備考
盛土工（他工事発生土）				主にトンネル発生土をダンプで搬入し盛土します。

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

9 月						
日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30		現場稼働日			休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

ガイドウェイ製作保管工事JV工事事務所
（三井住友建設・ジェイアール東海建設JV）
住 所 中津川市茄子川中垣外1642
電 話 0573-78-2515

中央新幹線自立式ガイドウェイ側壁 製作保管（中津川地区）工事だより

2024年
8月
vol. 23

お知らせ

構造物の基礎部を構築するための、他工事発生土を運搬して整地する造成工事を進めていきます。

皆様にはご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。

現場状況等（2024. 7. 11日時点）

- 盛土工（他工事発生土）：搬入した土で掘削部を盛土しています。



盛土工



本工事の工事範囲

【工事工程】

工 種	8月	9月	10月	備考
盛土工（他工事発生土）				主にトンネル発生土をダンプで搬入し盛土します。

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

8 月						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
			現場稼働日			休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

ガイドウェイ製作保管工事JV工事事務所
（三井住友建設・ジェイアール東海建設JV）

住 所 中津川市茄子川中垣外1642

電 話 0573-78-2515

自立式ガイドウェイ側壁製作保管（中津川地区）

中央新幹線自立式ガイドウェイ側壁
製作保管（中津川地区）工事だより

2024年
7月
vol. 22

お知らせ

構造物の基礎部を構築するための、他工事発生土を運搬して整地する造成工事を進めていきます。


皆様にはご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。

現場状況等（2024. 6. 14日時点）

- ・盛土工（他工事発生土）：搬入した土で掘削部を盛土しています。



盛土工

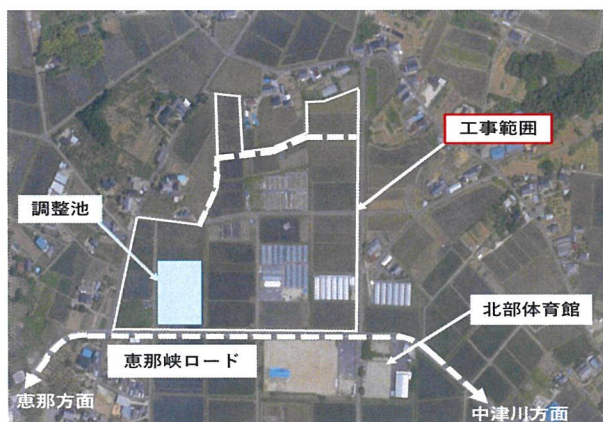

本工事の工事範囲

【工事工程】

工 種	7月	8月	9月	備考
盛土工（他工事発生土）				主にトンネル発生土をダンプで搬入し盛土します。

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

7 月						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
			現場稼働日			休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

ガイドウェイ製作保管工事JV工事事務所
(三井住友建設・ジェイアール東海建設JV)
住 所 中津川市茄子川中垣外1642
電 話 0573-78-2515

中央新幹線自立式ガイドウェイ側壁 製作保管（中津川地区）工事だより

2024年
6月
vol. 21

お知らせ

構造物の基礎部を構築するための、他工事発生土を運搬して整地する造成工事を進めていきます。


皆様にはご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。

現場状況等（2024. 5. 15日時点）

- ・盛土工（他工事発生土）：搬入した土で掘削部を盛土しています。



盛土工

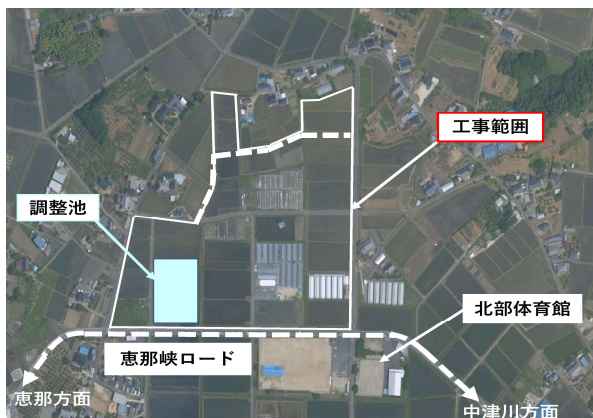

本工事の工事範囲

【工事工程】

工 種	6月	7月	8月	備考
盛土工（他工事発生土）				主にトンネル発生土をダンプで搬入し盛土します。

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

6 月						
日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						
			現場稼働日			休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

ガイドウェイ製作保管工事JV工事事務所
（三井住友建設・ジェイアール東海建設JV）

住 所 中津川市茄子川中垣外1642

電 話 0573-78-2515

中央新幹線自立式ガイドウェイ側壁 製作保管（中津川地区）工事だより

2024年
5月
vol. 20

お知らせ

構造物の基礎部を構築するための、他工事発生土を運搬して整地する造成工事を進めていきます。


皆様にはご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。

現場状況等（2024. 4. 15日時点）

- ・盛土工（他工事発生土）：搬入した土で掘削部を盛土しています。



盛土工

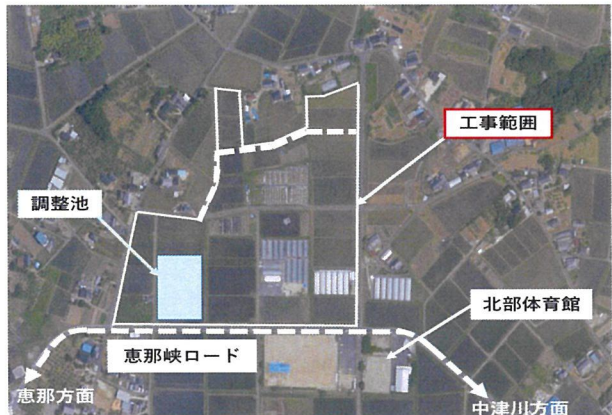

本工事の工事範囲

【工事工程】

工 種	5月	6月	7月	備考
盛土工（他工事発生土）				主にトンネル発生土をダンプで搬入し盛土します。

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

5 月						
日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
			現場稼働日			休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

ガイドウェイ製作保管工事JV工事事務所
（三井住友建設・ジェイアール東海建設JV）

住 所 中津川市茄子川中垣外1642

電 話 0573-78-2515

中央新幹線自立式ガイドウェイ側壁 製作保管（中津川地区）工事だより

2024年
4月
vol. 19

お知らせ

構造物の基礎部を構築するための、他工事発生土を運搬して整地する造成工事を進めていきます。
皆様にはご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。


現場状況等（2024. 3. 15日時点）

【進捗状況】

- ・掘削工：構造物の基礎部を構築するため掘削しています。（3月完了）
- ・盛土工（掘削土）：掘削した土を工事範囲内で運搬・盛土しています。（3月完了）
- ・盛土工（他工事発生土）：搬入した土で掘削部を盛土しています。



盛土工

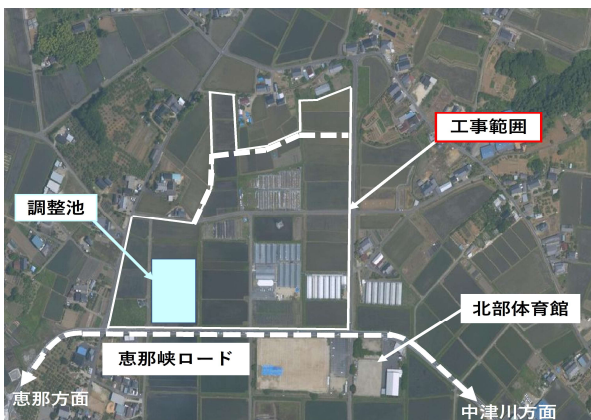

本工事の工事範囲

【工事工程】

工 種	4 月	5 月	6 月	備考
盛土工（他工事発生土）				主にトンネル発生土をダンプで搬入し盛土します。

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

4 月						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

☐ 現場稼働日
 ☐ 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

ガイドウェイ製作保管工事JV工事事務所
（三井住友建設・ジェイアール東海建設JV）
住 所 中津川市茄子川中垣外1642
電 話 0573-78-2515
