

中央アルプストンネル(山口) 工事だより

2025年
3月
vol. 93

お知らせ

今月も本坑の品川方への掘削と路盤・覆工コンクリート工事を進めます。
3月もまだ雪や凍結の可能性がありますので、車両を運行する際には、事前に天候や交通状況を把握して安全運転に努めます。
皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご協力をよろしくお願いいたします。

工事状況等 (2025. 2. 10 時点)

【進捗状況】

- トンネル工：現在、本坑を品川方へ掘削しています。約 2,630m (本坑全長約 4,700m) の掘削が完了しています。その後方で路盤と覆工のコンクリート打設工事を行っています。

【工事工程】


工種	3月	4月	5月	備考
トンネル工				
発生土運搬 (坂本地区)				1日120台程度運搬予定
(中津西地区)				1日50台程度運搬予定

※上記運行台数は往路・復路の合計台数となります



本坑品川方 2,500m到達時

【進捗図】

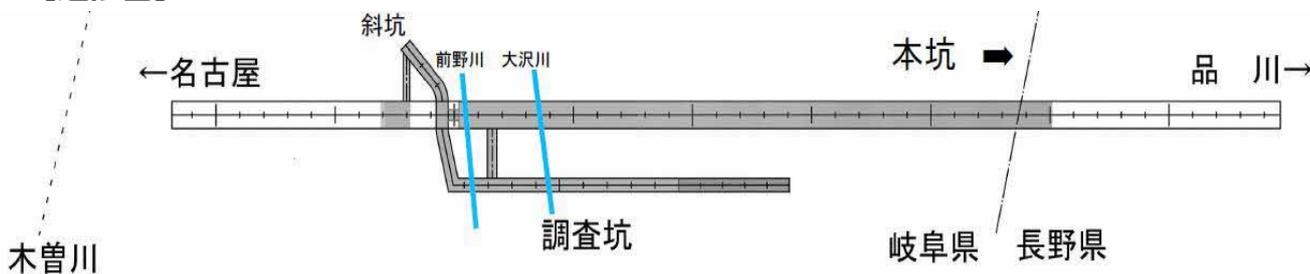

3月						
日	月	火	水	木	金	土
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

発生土運搬予定日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

鹿島・日本国土開発・吉川特定建設工事共同企業体
中央アルプストンネル(山口)JV工事事務所
住所 中津川市山口1605-1
電話 0573-67-9317
(渉外担当：永柄、発生土運搬担当：熊谷)

中央アルプストンネル(山口) 工事だより

2025年
2月
vol. 92

お知らせ

今月も本坑の品川方への掘削と路盤・覆工コンクリート工事を進めます。
まだ雪や凍結により路面状況が悪くなる可能性がある時期なので、車両を運行する際には、事前に天候や交通状況を把握して安全運転に努めます。
皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご協力をよろしくお願いいたします。

工事状況等 (2025. 1. 10 時点)

【進捗状況】

- トンネル工：現在、本坑を品川方へ掘削しています。約 2,600m (本坑全長約 4,700m) の掘削が完了しています。その後方で路盤と覆工のコンクリート打設工事を行っています。

【工事工程】


工種	2月	3月	4月	備考
トンネル工				
発生土運搬 (坂本地区)				1日120台程度運搬予定
(中津西地区)				1日50台程度運搬予定

※上記運行台数は往路・復路の合計台数となります



覆工施工状況

【進捗図】

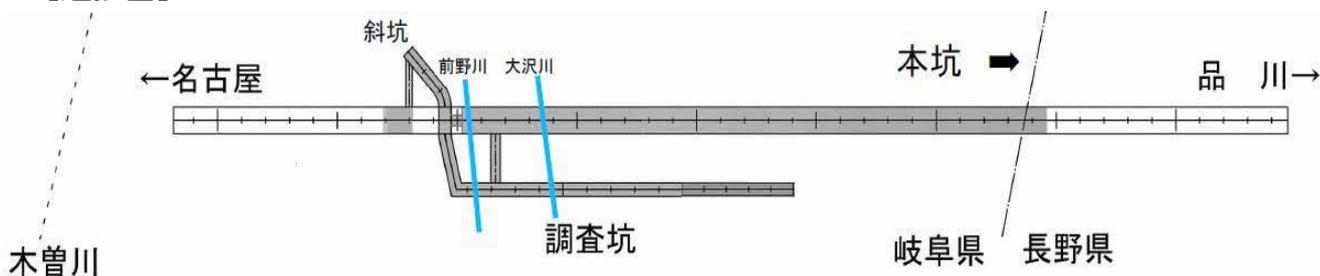

2月						
日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	
<input type="checkbox"/> 発生土運搬予定日						

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

鹿島・日本国土開発・吉川特定建設工事共同企業体
中央アルプストンネル(山口)JV工事事務所
住所 中津川市山口1605-1
電話 0573-67-9317
(渉外担当：永柄、発生土運搬担当：熊谷)

中央アルプストンネル(山口) 工事だより

2025年
1月
vol. 91

お知らせ

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
今月も本坑の品川方への掘削と路盤・覆工コンクリート工事を進めます。
本年も安全第一で工事を進めてまいります。
昨年同様皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

工事状況等 (2024. 12. 12 時点)

【進捗状況】

- トンネル工：現在、本坑を品川方へ掘削しています。約 2,580m (本坑全長約 4,700m) の掘削が完了しています。その後方で路盤と覆工のコンクリート打設工事を行っています。


【工事工程】

工種	1月	2月	3月	備考
トンネル工				
発生土運搬 (坂本地区)				1日30台(4往復)程度運搬予定
(中津西地区)				1日10台(5往復)程度運搬予定



山口小学校の皆さんにトンネル内を見学していただきました

【進捗図】

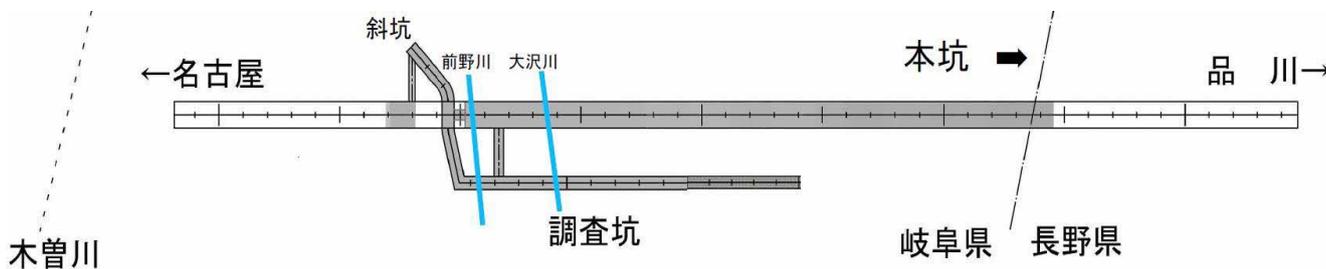

1月						
日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
□ 発生土運搬予定日						

【工事に関するご意見・お問い合わせ】
鹿島・日本国土開発・吉川特定建設工事共同企業体
中央アルプストンネル(山口)JV工事事務所
住所 中津川市山口1605-1
電話 0573-67-9317
(渉外担当：永柄、発生土運搬担当：熊谷)

※12/29(日)～1/5(日)は休工を予定しておりますが、電話でのご意見・お問い合わせは可能となっております。

中央アルプストンネル(山口) 工事だより

2024年
12月
vol. 90

お知らせ

今月も本坑の品川方への掘削と路盤・覆工コンクリート工事を進めます。
今年も残すところあと1ヶ月。気を抜くことなく安全第一で工事を進めてまいります。
皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご協力をよろしくお願いいたします。

工事状況等(2024.11.12時点)

【進捗状況】

- トンネル工：現在、本坑を品川方へ掘削しています。約2,540m(本坑全長約4,700m)の掘削が完了しています。その後方で路盤と覆工のコンクリート打設工事を行っています。


【工事工程】

工種	12月	1月	2月	備考
トンネル工				
発生土運搬 (坂本地区)				1日30台(4往復)程度運搬予定
(中津西地区)				1日10台(5往復)程度運搬予定



本坑

【進捗図】

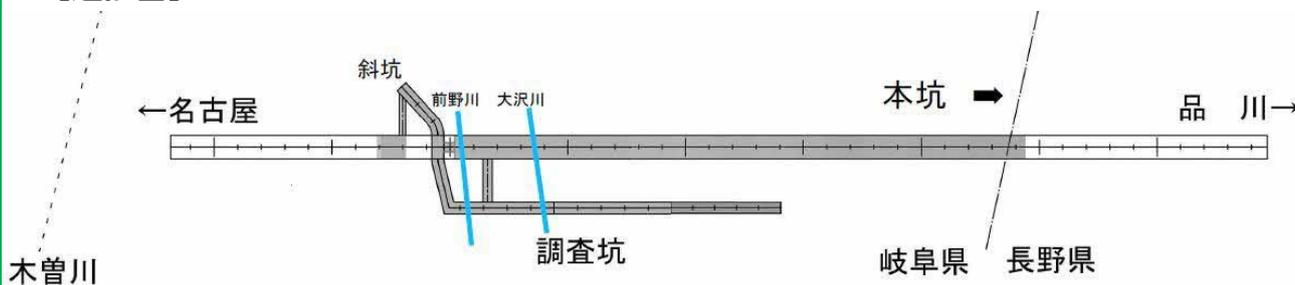

12月

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

□ 発生土運搬予定日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

鹿島・日本国土開発・吉川特定建設工事共同企業体
中央アルプストンネル(山口)JV工事事務所
住所 中津川市山口1605-1
電話 0573-67-9317
(渉外担当：永柄、発生土運搬担当：熊谷)

中央アルプストンネル(山口) 工事だより

2024年
11月
vol. 89

お知らせ

今月も本坑の品川方への掘削と路盤・覆工コンクリート工事を進めます。
皆様のご協力により 10月10日長野県に無事入りました。
ご協力・ご支援ありがとうございました。今後もよろしくお願いいたします。

工事状況等 (2024. 10.15 時点)

【進捗状況】

- トンネル工：現在、本坑を品川方へ掘削しています。約2,520m(本坑全長約4,700m)の掘削が完了しています。その後方で路盤と覆工のコンクリート打設工事を行っています。


【工事工程】

工種	11月	12月	1月	備考
トンネル工				
発生土運搬 (坂本地区)				1日30台(4往復)程度運搬予定
(中津西地区)				1日10台(5往復)程度運搬予定



覆工

【進捗図】



11月						
日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
□ 発生土運搬予定日						

【工事に関するご意見・お問い合わせ】
鹿島・日本国土開発・吉川特定建設工事共同企業体
中央アルプストンネル(山口)JV工事事務所
住所 中津川市山口1605-1
電話 0573-67-9317
(渉外担当：永柄、発生土運搬担当：熊谷)

中央アルプストンネル(山口) 工事だより

2024年
10月
vol. 88

お知らせ

今月も本坑の品川方への掘削と路盤・覆工コンクリート工事を進めます。
この時期は日の入り時間が急激に早まりますので、車両の運転にあたっては早めのライト点灯をおこない、交通事故防止に努めてまいります。
皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご協力をよろしくお願いいたします。

工事状況等 (2024.9.8時点)

【進捗状況】

- トンネル工：現在、本坑を品川方へ掘削しています。約2,460m(本坑全長約4,700m)の掘削が完了しています。その後方で路盤と覆工のコンクリート打設工事を行っています。


【工事工程】

工種	10月	11月	12月	備考
トンネル工				
発生土運搬 (坂本地区)				1日30台(4往復)程度運搬予定
(中津西地区)				1日10台(5往復)程度運搬予定



インバート工

【進捗図】

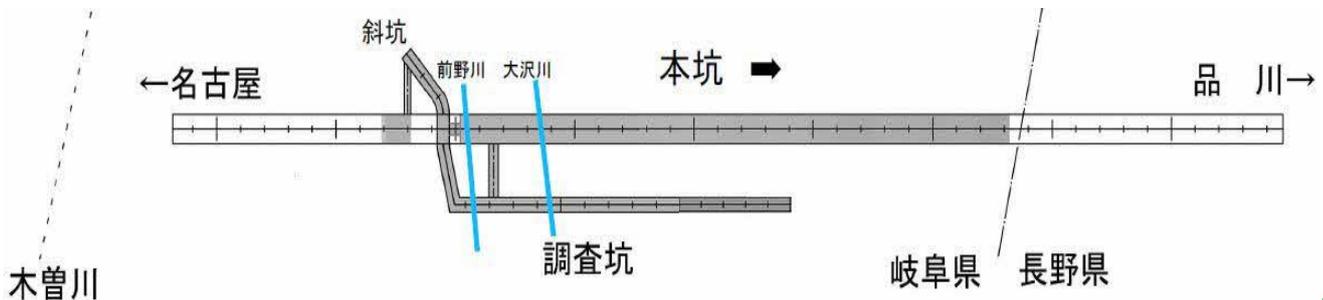

10月						
日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

発生土運搬予定日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】
鹿島・日本国土開発・吉川特定建設工事共同企業体
中央アルプストンネル(山口)JV工事事務所
住所 中津川市山口1605-1
電話 0573-67-9317
(渉外担当：永柄、発生土運搬担当：熊谷)

中央アルプストンネル (山口) 工事だより

2024年
9月
vol. 87

お知らせ

今月も本坑の品川方への掘削と路盤・覆工コンクリート工事を進めます。
長期休暇明けは、しっかりとした機械設備の始業前点検と体調管理に留意して参ります。
皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご協力をよろしくお願いいたします。

工事状況等 (2024. 8. 8 時点)

【進捗状況】


- トンネル工：現在、本坑を品川方へ掘削しています。約 2,450m (本坑全長約 4,700m) の掘削が完了しています。その後方で路盤と覆工のコンクリート打設工事を交互に行っています。

【工事工程】

工種	9月	10月	11月	備考
トンネル工				
発生土運搬 (坂本地区)				1日30台(4往復)程度運搬予定
(中津西地区)				1日10台(5往復)程度運搬予定



【進捗図】

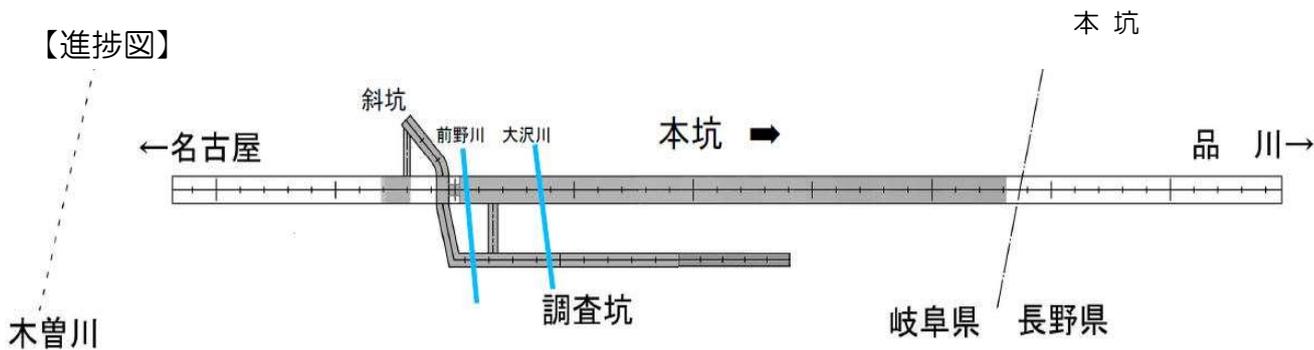

9月						
日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

発生土運搬予定日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】
鹿島・日本国土開発・吉川特定建設工事共同企業体
中央アルプストンネル(山口)JV工事事務所
住所 中津川市山口1605-1
電話 0573-67-9317
(渉外担当：永柄、発生土運搬担当：熊谷)

中央アルプストンネル(山口) 工事だより

2024年
8月
vol. 86

お知らせ

今月も本坑の品川方への掘削と路盤および覆工コンクリート工事を進めます。
工事車両の走行時は、交通ルールの順守、一般車両優先で安全運転に努めてまいります。
皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご協力をよろしくお願いいたします。

工事状況等 (2024.7.12時点)

【進捗状況】

- トンネル工：現在、本坑を品川方へ掘削しています。約2,410m(本坑全長約4,700m)の掘削が完了しています。その後方で路盤と覆工のコンクリート打設工事を交互に行っています。


【工事工程】

工種	8月	9月	10月	備考
トンネル工				
発生土運搬 (坂本地区)				1日40台(4往復)程度運搬予定
(中津西地区)				1日10台(5往復)程度運搬予定
(馬籠地区)				状況により運搬することあり



覆工施工状況

【進捗図】

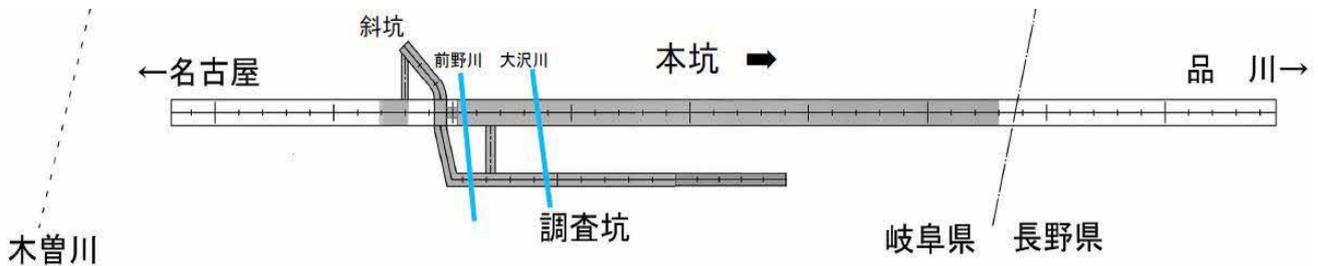

8月						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
□ 発生土運搬予定日						

【工事に関するご意見・お問い合わせ】
鹿島・日本国土開発・吉川特定建設工事共同企業体
中央アルプストンネル(山口)JV工事事務所
住所 中津川市山口1605-1
電話 0573-67-9317
(渉外担当：永柄、発生土運搬担当：熊谷)

※8/10(土)~8/18(日)は夏季休暇を予定しておりますが、電話でのご意見・お問い合わせは可能となっております。

中央アルプストンネル(山口) 工事だより

2024年
7月
vol. 85

お知らせ

今月も本坑の品川方への掘削と路盤および覆工コンクリート工事を進めます。
暑い時期なので、熱中症には十分気をつけて安全第一で工事を進めてまいります。
皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご協力をよろしくお願いいたします。

工事状況等(2024.6.10時点)

【進捗状況】

- トンネル工: 現在、本坑を品川方へ掘削しています。約2,380m(本坑全長は約4,700m)の掘削が完了しています。その後方で路盤と覆工のコンクリート打設工事を交互に行っています。


【工事工程】

工種	7月	8月	9月	備考
トンネル工				
発生土運搬 (坂本地区)				1日40台(4往復)程度運搬予定
(中津西地区)				1日10台(5往復)程度運搬予定
(馬籠地区)				状況により運搬することあり



中津川リレーマラソンに参加しました

【進捗図】

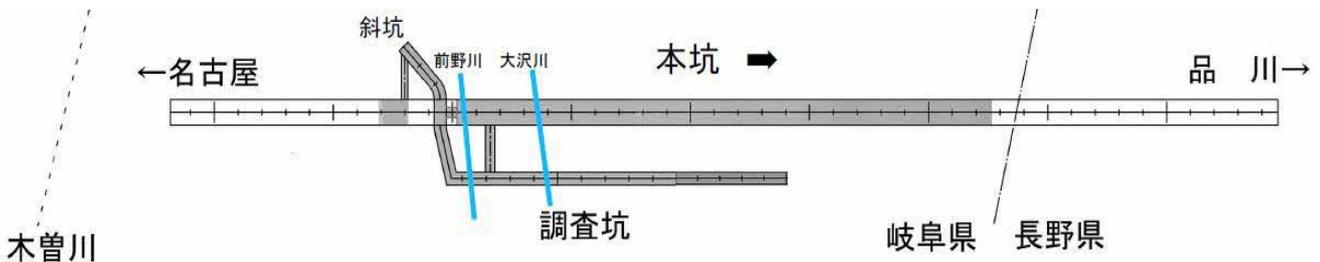

7月

日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

発生土運搬予定日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

鹿島・日本国土開発・吉川特定建設工事共同企業体
中央アルプストンネル(山口)JV工事事務所
住所 中津川市山口1605-1
電話 0573-67-9317
(渉外担当: 永柄、発生土運搬担当: 熊谷)

中央アルプストンネル(山口) 工事だより

2024年
6月
vol. 84

お知らせ

今月も本坑の品川方への掘削と路盤および覆工コンクリート工事を進めます。
梅雨の時期なので、車両運行時には十分な車間距離の確保と安全な速度走行によりスリップなどの事故防止に努めます。
皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご協力をよろしくお願いいたします。

工事状況等 (2024.5.17時点)

【進捗状況】

- トンネル工: 現在、本坑を品川方へ掘削しています。約2,210m(本坑全長は約4,700m)の掘削が完了しています。その後方で路盤と覆工のコンクリート打設工事を交互に行っています。


【工事工程】

工種	7月	8月	9月	備考
トンネル工				
発生土運搬 (坂本地区)				1日40台(4往復)程度運搬予定
(中津西地区)				1日10台(5往復)程度運搬予定
(馬籠地区)				状況により運搬することあり



インバートコンクリート打設状況

【進捗図】

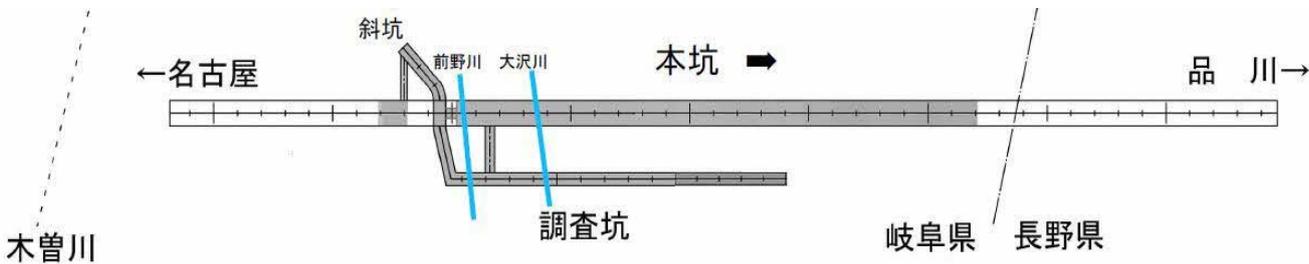

6月						
日	月	火	水	木	金	土
2	3	4	5	6	7	1
9	10	11	12	13	14	8
16	17	18	19	20	21	15
23	24	25	26	27	28	22
30						29

□ 発生土運搬予定日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】
鹿島・日本国土開発・吉川特定建設工事共同企業体
中央アルプストンネル(山口)JV工事事務所
住所 中津川市山口1605-1
電話 0573-67-9317
(渉外担当: 永柄、発生土運搬担当: 熊谷)

中央アルプストンネル(山口) 工事だより

2024年
5月
vol. 83

お知らせ

今月も本坑の品川方への掘削と路盤および覆工コンクリート工事を進めます。
大型連休明けは、作業開始前の作業手順の再確認と機械・設備の点検をしっかりと行い、安全作業に努めます。
皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご協力をよろしくお願いいたします。

工事状況等(2024.4.12時点)

【進捗状況】

- トンネル工: 現在、本坑を品川方へ掘削しています。約2,180m(本坑全長は約4,700m)の掘削が完了しています。その後方で路盤と覆工のコンクリート打設工事を交互に行っています。


【工事工程】

工種	6月	7月	8月	備考
トンネル工				
発生土運搬 (坂本地区)				1日40台(4往復)程度運搬予定
(中津西地区)				1日10台(5往復)程度運搬予定
(馬籠地区)				状況により運搬することあり



本坑

【進捗図】

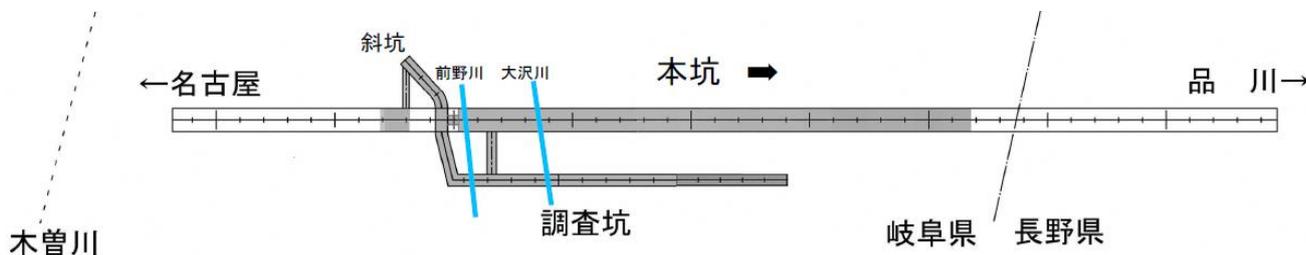

5月						
日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
□ 発生土運搬予定日						

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

鹿島・日本国土開発・吉川特定建設工事共同企業体
中央アルプストンネル(山口)JV工事事務所
住所 中津川市山口1605-1
電話 0573-67-9317
(渉外担当: 永柄^{ながえ}、発生土運搬担当: 熊谷^{くまがい})

※4/28(日)~5/6(月)は休工を予定しておりますが、電話でのご意見・お問い合わせは可能となっております。

中央アルプストンネル(山口) 工事だより

2024年
4月
vol. 82

お知らせ

今月も本坑の品川方への掘削と路盤および覆工コンクリート工事を進めます。
新学期が始まるこの時期は、交通ルールに不慣れな新入学児童がいるので、発生土運搬の際には通学路ではいつも以上の思いやり運転の徹底を行ってまいります。
皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご協力をよろしくお願いいたします。

工事状況等 (2024.3.12時点)

【進捗状況】

- トンネル工：現在、本坑を品川方へ掘削しています。約2,100m(本坑全長は約4,700m)の掘削が完了しています。その後方で路盤と覆工のコンクリート打設工事を交互に行っています。


【工事工程】

工種	5月	6月	7月	備考
トンネル工				
発生土運搬 (坂本地区)				1日40台(4往復)程度運搬予定
(中津西地区)				1日10台(5往復)程度運搬予定
(馬籠地区)				状況により運搬することあり



現場見学会開催しました

【進捗図】



4月						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				
<input type="checkbox"/>	発生土運搬予定日					

【工事に関するご意見・お問い合わせ】
鹿島・日本国土開発・吉川特定建設工事共同企業体
中央アルプストンネル(山口)JV工事事務所
住所 中津川市山口1605-1
電話 0573-67-9317
(渉外担当：永柄、発生土運搬担当：熊谷)

※4/28(日)~5/6(月)は休工を予定しておりますが、電話でのご意見・お問い合わせは可能となっております。
