

瀬戸トンネル 工事便り

2023年
3月
vol. 44

お知らせ

☆3月の作業予定

3月の主な作業は、引き続きトンネル掘削とズリのダンプ運搬です。今月は斜坑と本坑の交差部を掘削し、その後本坑の本格掘削に向けての仮設備の準備を行います。

3月下旬は、学校の春休みの時期ですので、特に小中学生の歩行者や自転車に注意して、安全運転を行います。

現在のトンネルの進捗は、斜坑の掘削が約530m（2月13日現在）まで進んでおります（全長は約600m）。

写真は、斜坑内の側面および鏡面へ、吹付けコンクリートを施工している状況です。地山状況によりますが、コンクリートの厚さは約10cm～15cmです。



写真-1 吹付け状況

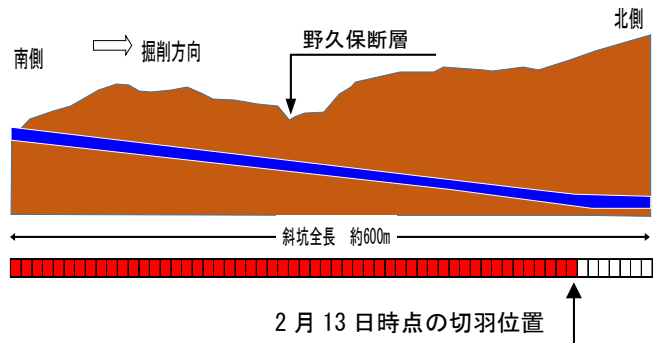


図-1 トンネル掘削進捗縦断面図

主な工事工程

工種	土の運搬先	2月	3月	4月	備考
トンネル掘削(斜坑)	瀬戸地区埋立て事業	■			100～300台 (往復※)
交差部(斜坑・本坑)	同上		■		
トンネル掘削(本坑)	同上			■	

※運行台数は、両方向の合計交通量を示しています

☆工事に関するご意見・お問い合わせ☆
中央新幹線 瀬戸トンネルJV工事事務所
電話0573-64-2980
