

中部総合車両基地ほか新設 工事だより

2023年
5月
vol. 14

お知らせ

5月は準備工事、仮設工事、防災工事、先行盛土工事を進めます。
これまで同様に安全第一で工事を進めてまいります。
皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご協力をよろしくお願いいたします。


工事状況等（2023.4.3時点）

【進捗状況】

- ・準備工事、先行盛土工事：測量、伐採、表土すきとりや先行盛土準備を進めています。
- ・仮設工事：仮囲いや工事用道路、仮迂回路の設置を行います。
- ・防災工事：沈砂池工や暗渠（盛土下）排水工を行います。



【進出入路仮設ゲート・発生土受入】

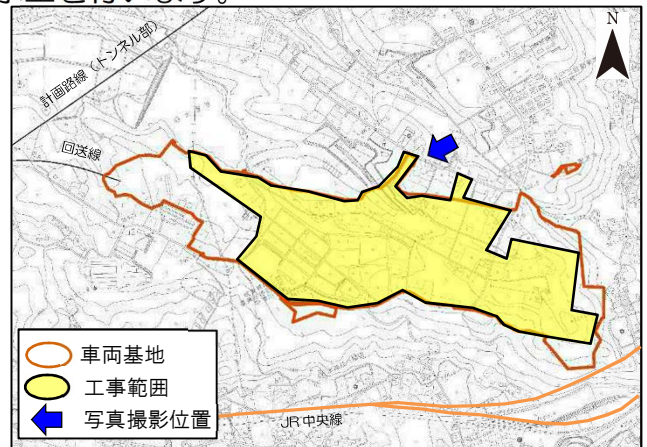

【当月の主な工事範囲】

【工事工程】

工種	5月	6月	7月	備考
準備工				測量工、伐採、表土すきとり
仮設工事				仮囲い・工事用道路・仮迂回路設置
防災工事				沈砂池工、暗渠（盛土下）排水工
先行盛土工				準備工

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

5月

日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
	現場稼働日		休工日			

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中部総合車両基地JV工事事務所
（鹿島・ジェイアール東海建設・飛島JV）
住所 中津川市千旦林鍛冶屋平 643-7
電話 0573-68-3670
担当者 あすま まえだ はなむら あたち やぎ
東、前田、花村、安達、八木
