

中央アルプストンネル(山口) 工事だより

2024年
2月
vol. 80

お知らせ

今月も本坑の品川方への掘削と路盤および覆工コンクリート工事を進めます。寒暖差が大きくなりやすい時期です。しっかりとした体調管理を行い、万全の体調にて安全作業、安全運転を努めてまいります。皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご協力をよろしくお願いいたします。

工事状況等(2024.1.12時点)

【進捗状況】

- トンネル工：現在、本坑を品川方へ掘削しています。約2,020m分の掘削が完了しています。その後方で路盤と覆工のコンクリート打設工事を交互に行っています。


【工事工程】

工種	2月	3月	4月	備考
トンネル工				
発生土運搬 (坂本地区)				1日40台(4往復)程度運搬予定
(中津西地区)				1日10台(5往復)程度運搬予定
(馬籠地区)				状況により運搬することあり



本坑品川方 2000m到達時

【進捗図】

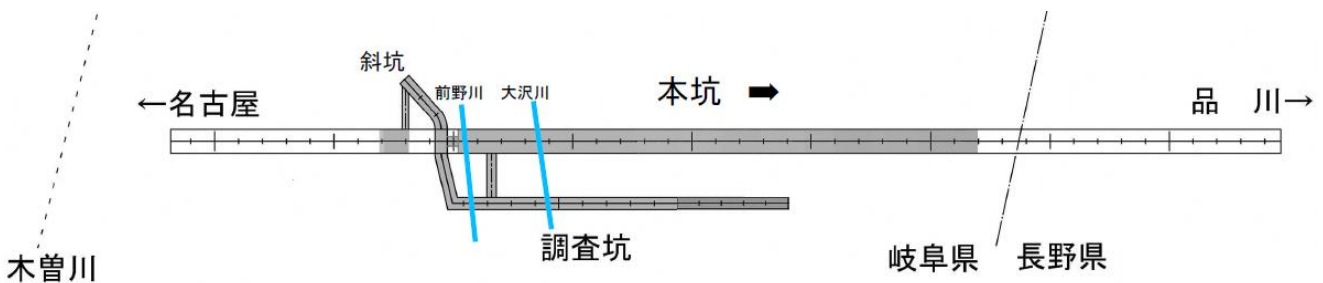

2月						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29		
<input type="checkbox"/> 発生土運搬予定日						

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

鹿島・日本国土開発・吉川特定建設工事共同企業体
中央アルプストンネル(山口)JV工事事務所
住所 中津川市山口1605-1
電話 0573-67-9317
(渉外担当：永柄、発生土運搬担当：熊谷)
