

中央アルプストンネル(山口) 工事だより

2025 年
5 月
vol. 95

お知らせ

今月も本坑の品川方への掘削と路盤・覆工コンクリート工事を進めます。
大型連休明けは、重機・車両、設備の始業前点検を行い、気を引き締めて安全第一で作業、
運転を行います。
皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご協力をよろしくお願いいたします。

工事状況等 (2025. 4 .7 時点)

【進捗状況】

- トンネル工：現在、本坑を品川方へ掘削しています。約 2,700m (本坑全長約 4,700m) の掘削が完了しています。その後方で路盤と覆工のコンクリート打設工事を行っています。

【工事工程】


工 種	5月	6月	7月	備考
トンネル工				
発生土運搬 (坂本地区)				1日120台程度運搬予定
(中津西地区)				1日50台程度運搬予定

※上記運行台数は往路・復路の合計台数となります



山口地区の方々に現場を見学していただきました

【進捗図】

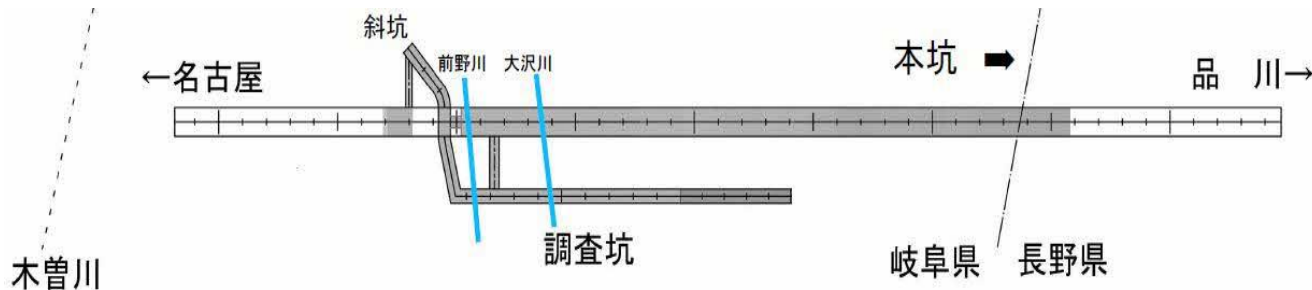

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

鹿島・日本国土開発・吉川特定建設工事共同企業体
中央アルプストンネル(山口)JV工事事務所
住 所 中津川市山口1605-1
電 話 0573-67-9317
(渉外担当：永柄、発生土運搬担当：熊谷)

5月						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

☐ 発生土運搬予定日

※4/26(土)～5/6(火)は休工を予定しておりますが、電話でのご意見・お問い合わせは可能となっております。
