


第二木曽川橋りょう 工事便り

2025年
12月

お知らせ

【2025年12月の作業予定】
1. P2橋脚止水工
2. P3、P4橋脚ケーソン構築
3. 巨石撤去
P3、P4橋脚ケーソン構築 は土祝も稼働をさせていただき、令和8年1月より昼夜施工を予定しております。
※工事の進捗状況により日曜日も作業をさせていただく可能性があります。
※上地区取付道路は、一般供用開始しています。工事用道路としても、工事用車両(ダンプ、生コン車等)の通行を予定しています。コンクリート打設日は、特に生コン車の通行が多くなるため、ご協力をお願いします(初回は12月18日を予定)。ご理解のほどよろしくお願いします。

工事状況等 (2025.11.6時点)

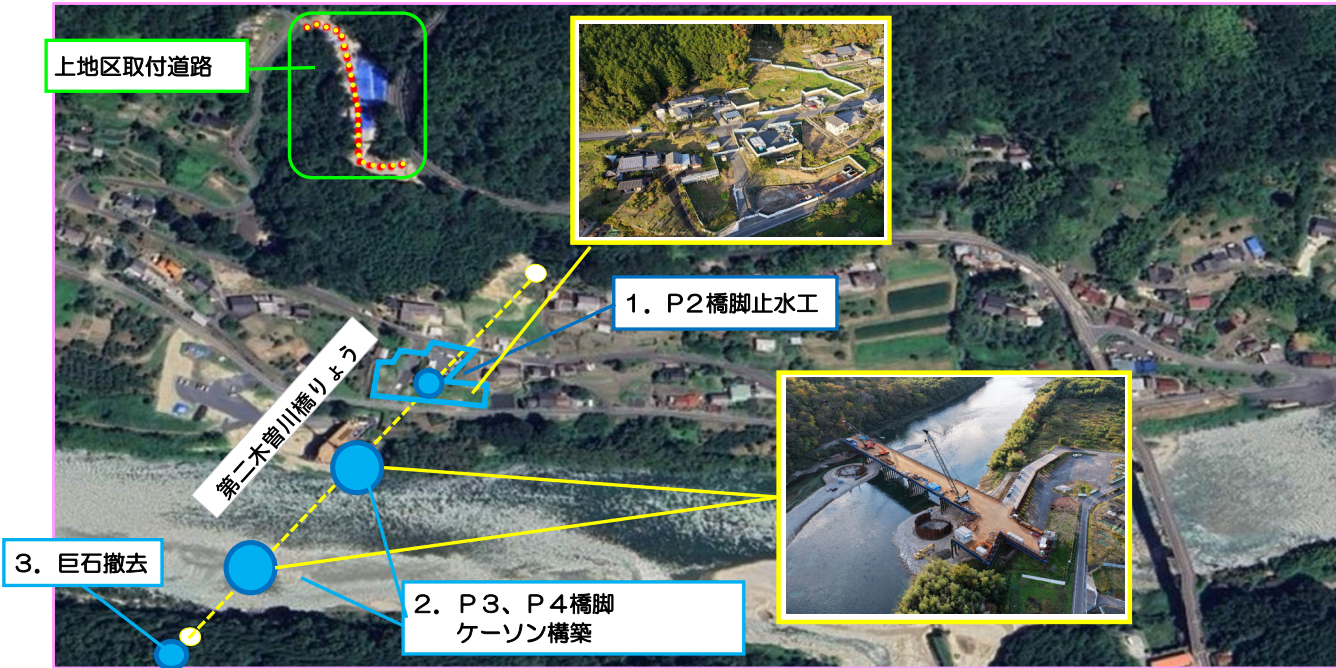

※上地広場から栈橋周辺への立入りはご遠慮下さい。

【工事工程】

月		令和7年12月				令和8年1月	
		11月 下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	
1. P2橋脚止水工		P2橋脚止水工					作業時間最大:8:00~18:00
2. P3橋脚 ケーソン構築	昼	ケーソン構築		コンクリート打設	ケーソン構築		12月作業時間最大:7:00~22:00 1月昼間作業時間最大:7:00~22:00 1月夜間作業時間最大:17:00~8:00 生コン車通行予定時間:8:00~18:00 ※工事状況等により変更の可能性が あります。 土祝も稼働します。
	夜					ケーソン掘削	
2. P4橋脚 ケーソン構築	昼	ケーソン構築				コンクリート打設	
	夜					ケーソン掘削	
3. 巨石撤去			準備工(立木伐採~モノレール設置)				

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合がございます。

12月						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

現場稼働日 休工日

工事に関するご意見・お問い合わせ

中央新幹線
第二木曽川橋りょうほか新設工事作業所
住所：岐阜県中津川市北野町4-30
電話：0573-67-8517
