

中央新幹線自立式ガイドウェイ側壁 製作保管（中津川地区）工事だより

2023年
3月
vol. 6

お知らせ

構造物の基礎部を構築するため掘削し、その土を、工事範囲内に盛土します。
一月の回覧でお知らせさせていただいた通り、市道坂本250号・252号を、
一時撤去（共用廃止）させていただきます。
皆様には、ご不便をおかけしますが、何卒ご協力をよろしくお願いします。


現場状況等（2023. 2. 13時点）

【進捗状況】

- ・掘削工：構造物の基礎部を構築するため掘削します。
- ・盛土工：掘削した土を工事範囲内で運搬・盛土します。



掘削工

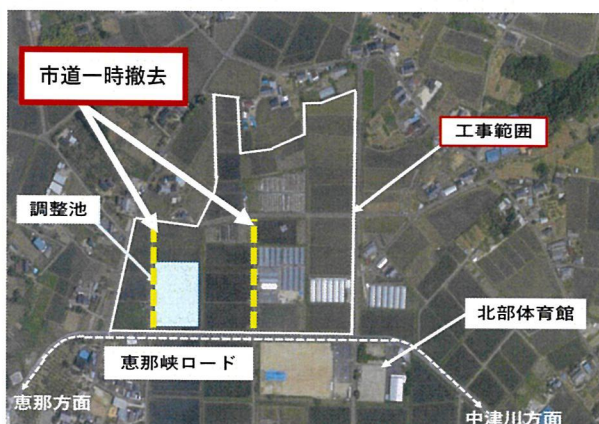

本工事の工事範囲

【工事工程】

工 種	3 月	4 月	5 月	備考
掘削工				構造物の基礎部を構築するため掘削します。
盛土工				掘削した土を工事範囲内で運搬・盛土します。

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

3 月						
日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
			現場稼働日			休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

ガイドウェイ製作保管工事JV工事事務所
（三井住友建設・ジェイアール東海建設JV）
住 所 中津川市茄子川中垣外1642
電 話 0573-78-2515

中央新幹線自立式ガイドウェイ側壁 製作保管（中津川地区）工事だより

2023年
2月
vol. 5

お知らせ

耕作土鋤取り、既設水路の撤去及び、構造物の基礎部を構築するため掘削します。
皆様には、ご不便をおかけしますが、何卒ご協力をよろしくお願いします。

現場状況等（2023. 1. 11時点）

【進捗状況】

- 耕作土鋤取り工：工事範囲内の耕作土を鋤取り、ヤード内で移動保管しています。
- 既設構造物撤去工：工事範囲内の、既設水路を撤去しています。
- 掘削工：構造物の基礎部を構築するため掘削します。



耕作土鋤取り工



本工事の工事範囲

【工事工程】

工 種	2 月	3 月	4 月	備考
耕作土鋤取り工				耕作土を鋤取り場内に保管
既設構造物撤去工				既設水路を撤去
掘削工				構造物の基礎部を構築するため掘削します。

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

2 月						
日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				
			現場稼働日			休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

ガイドウェイ製作保管工事JV工事事務所
（三井住友建設・ジェイアール東海建設JV）
住 所 中津川市茄子川中垣外1642
電 話 0573-78-2515

中央新幹線自立式ガイドウェイ側壁 製作保管（中津川地区）工事だより

2023年
1月
vol. 4

お知らせ

耕作土鋤取り、仮囲いを設置及び、既設水路を撤去します。
皆様には、ご不便をおかけしますが、何卒ご協力をよろしくお願いします。

現場状況等（2022. 12. 12時点）

【進捗状況】

- 耕作土鋤取り工：工事範囲内の耕作土を鋤取り、ヤード内で移動保管しています。
- 仮囲い設置工：工事範囲外周部に、安全対策のため仮囲いを設置しています。
- 既設構造物撤去工：工事範囲内の、既設水路を撤去しています。



耕作土鋤取り工



本工事の工事範囲

【工事工程】

工 種	1 月	2 月	3 月	備考
耕作土鋤取り工				耕作土を鋤取り場内に保管
仮囲い設置工				工事範囲外周に設置
既設構造物撤去工				既設水路を撤去

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

1 月						
日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				
			現場稼働日			休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

ガイドウェイ製作保管工事JV工事事務所
（三井住友建設・ジェイアール東海建設JV）
住 所 中津川市茄子川中垣外1642
電 話 0573-78-2515

中央新幹線自立式ガイドウェイ側壁
製作保管（中津川地区）工事だより

2022年
12月
vol. 3

お知らせ

耕作土鋤取り、仮囲いを設置及び、既設水路を撤去します。
皆様には、ご不便をおかけしますが、何卒ご協力をよろしくお願いします。

現場状況等（2022. 11. 15時点）

【進捗状況】

- 耕作土鋤取り工：工事範囲内の耕作土を鋤取り、ヤード内で移動保管しています。
- 仮囲い設置工：工事範囲外周部に、安全対策のため仮囲いを設置しています。
- 既設構造物撤去工：工事範囲内の、既設水路を撤去します。



耕作土鋤取り工



本工事の工事範囲

【工事工程】

工 種	12月	1月	2月	備考
耕作土鋤取り工				耕作土を鋤取り場内に保管
仮囲い設置工				工事範囲外周に設置
既設構造物撤去工				既設水路を撤去

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

12月						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
			現場稼働日			休日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

ガイドウェイ製作保管工事JV工事事務所
(三井住友建設・ジェイアール東海建設JV)

住所 中津川市茄子川中垣外1642

電話 0573-78-2515

中央新幹線自立式ガイドウェイ側壁 製作保管（中津川地区）工事だより

2022年
11月
vol. 2

お知らせ

耕作土鋤取り及び、仮囲いを設置します。工事場所は中津川資材置場です。皆様には、ご不便をおかけしますが、何卒ご協力をよろしくお願いします。

現場状況等（2022.10.18時点）

【進捗状況】

- ・耕作土鋤取り工：工事範囲内の耕作土を鋤取り、ヤード内で移動保管します。
- ・仮囲い設置工：工事範囲外周部に、安全対策のため仮囲いを設置します。



仮囲い設置工（例）



本工事の工事範囲

【工事工程】

工 種	11月	12月	1月	備考
耕作土鋤取り工				耕作土を鋤取り場内に保管
仮囲い設置工				工事範囲外周に設置

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

11月						
日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

☐ 現場稼働日
 ☐ 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

ガイドウェイ製作保管工事JV工事事務所
(三井住友建設・ジェイアール東海建設JV)

住 所 中津川市茄子川中垣外1642

電 話 0573-78-2515

中央新幹線自立式ガイドウェイ側壁

製作保管（中津川地区）工事だより

10月

お知らせ



除草→耕作土鋤取り、及び仮囲い設置→盛土による造成、又、調整池設置等→舗装の順序で施工する予定です。工事場所は中津川資材置場です。

皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご協力をよろしくお願いします。

現場状況等

【進捗状況】

- ・除草工：工事範囲内全体の草刈りを実施します。除草した草は、外部に搬出します。
- ・耕作土鋤取り工：工事範囲内の耕作土を鋤取り、ヤード内で移動し保管します。

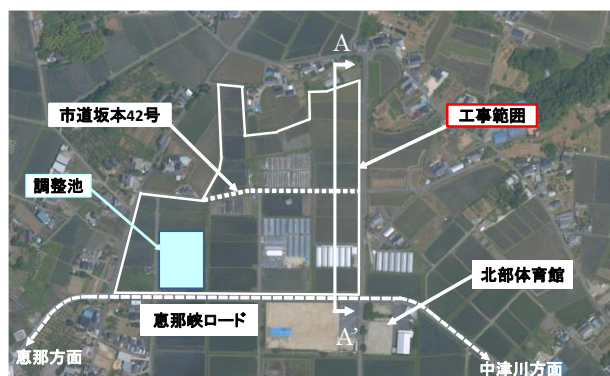

本工事の工事範囲

工 種	10月	11月	12月	備考
除草工				工事範囲内の草刈り
耕作土鋤取り工				耕作土を鋤取り場内に保管

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

10月						
日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					
			現場稼働日			休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

ガイドウェイ製作保管工事JV工事事務所
(三井住友建設・ジェイアール東海建設 JV)

住 所 中津川市茄子川中垣外 1642

電 話 0573-78-2515
