

中部総合車両基地ほか新設 工事だより

2023年
3月
vol. 12

お知らせ

3月は準備工事、仮設工事、防災工事、先行盛土工事を進めます。
これまで同様に安全第一で工事を進めてまいります。
皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご協力をよろしくお願い致します。


工事状況等（2023. 2. 2 時点）

【進捗状況】

- ・準備工事、先行盛土工事：測量、伐採、表土すきとりや先行盛土を進めています。
- ・仮設工事：仮囲いや工事用道路の設置、仮迂回路設置の準備を行います。
- ・防災工事：本設沈砂池工や暗渠（盛土下）排水工を行います。



【進出入路仮設ゲート・発生土受入】

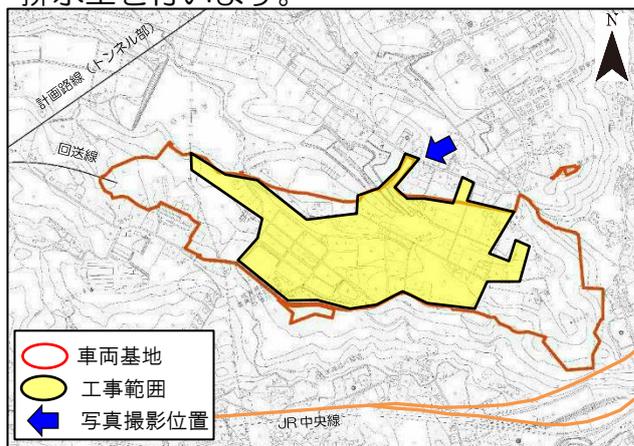

【当月の主な工事範囲】

【工事工程】

工種	3月	4月	5月	備考
準備工				測量工、伐採、表土すきとり
仮設工事				仮囲い、工事用道路設置、仮迂回路設置準備
防災工事				本設沈砂池工、暗渠(盛土下)排水工
先行盛土工				トンネル発生土による先行盛土

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

3月

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
□	現場稼働日		■ 休工日			

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中部総合車両基地JV工事事務所
(鹿島・ジェイアール東海建設・飛島JV)
住所 中津川市千旦林鍛冶屋平 643-7
電話 0573-68-3670
担当者 あずま まえだ はなむら あたち やぎ
東、前田、花村、安達、八木

中部総合車両基地ほか新設 工事だより

2023年
2月
vol. 11

お知らせ

2月は準備工事、仮設工事、先行盛土工事を進めます。
これまで同様に安全第一で工事を進めてまいります。
皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご協力をよろしくお願いいたします。


工事状況等（2023.1.10時点）

【進捗状況】

- ・準備工事、先行盛土工事：測量、伐採、表土すきとりや先行盛土を進めています。
- ・仮設工事：仮囲いや工事用道路の設置を行います。



【進出入路仮設ゲート・発生土受入】

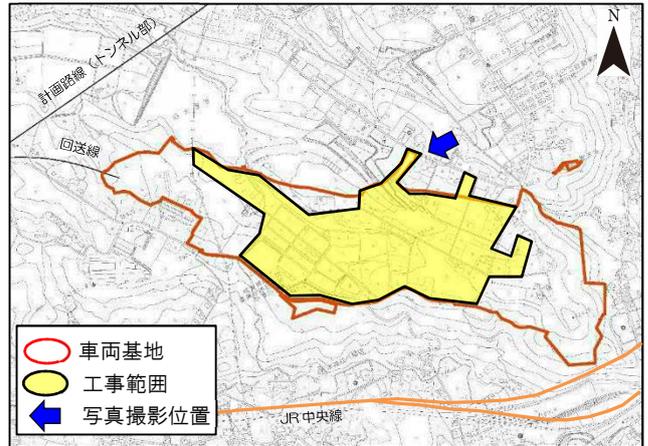

【当月の主な工事範囲】

【工事工程】

工種	2月	3月	4月	備考
準備工				測量工、伐採、表土すきとり
仮設工事				仮囲い、工事用道路設置
先行盛土工				トンネル発生土による先行盛土

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

2月

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				
□	現場稼働日		■ 休工日			

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中部総合車両基地JV工事事務所
（鹿島・ジェイアール東海建設・飛島JV）
住所 中津川市千旦林鍛冶屋平 643-7
電話 0573-68-3670
担当者 あすま まえだ はなむら あたち やぎ
東、前田、花村、安達、八木

中部総合車両基地ほか新設 工事だより

2023年
1月
vol. 10

お知らせ

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
1月も先行盛土工事、農業用水関連の工事を進めます。
これまで同様に安全第一で工事を進めてまいります。
皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご協力をよろしくお願いいたします。


工事状況等（2022.12.13時点）

【進捗状況】

- ・準備工事、先行盛土工事：測量や先行盛土を進めています。
- ・水路付替工事：舗装復旧を行います。



【進出入路仮設ゲート・発生土運搬】

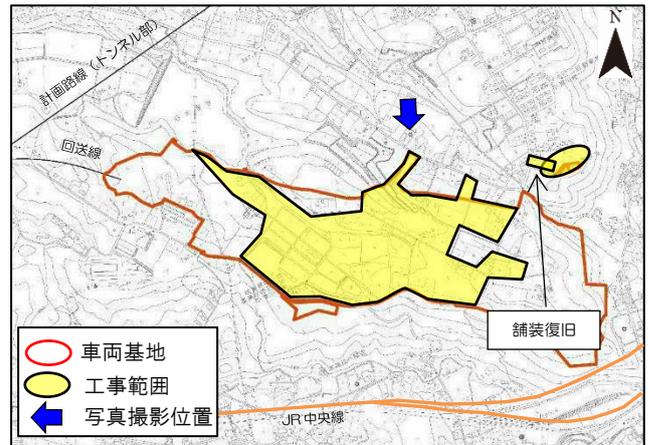

【当月の主な工事範囲】

【工事工程】

工種	1月	2月	3月	備考
準備工				測量工、伐採、仮囲い設置、他
水路付替工				舗装復旧
先行盛土工				トンネル発生土による先行盛土

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

1月

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

□ 現場稼働日 □ 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中部総合車両基地JV工事事務所
（鹿島・ジェイアール東海建設・飛島JV）
住所 中津川市千旦林鍛冶屋平 643-7
電話 0573-68-3670
担当者 あずま まえだ はなむら あたち やぎ
東、前田、花村、安達、八木

中部総合車両基地ほか新設 工事だより

2022年
12月
vol. 9


お知らせ

12月も先行盛土工事、農業用水関連の工事を進めます。信号ケーブル架線工事のため片側交互通行規制を行う予定です。これまで同様に安全第一で工事を進めてまいります。皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご協力をよろしくお願いいたします。

工事状況等（2022.11.11時点）

【進捗状況】

- ・準備工事、先行盛土工事：測量や先行盛土を進めています。
- ・水路付替工事：用水管布設を進めています。

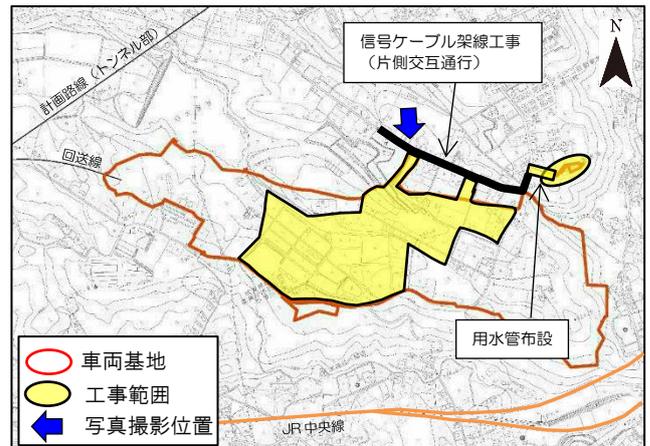

【進出入路仮設ゲート・発生土運搬】

【当月の主な工事範囲】

【工事工程】	工種	12月	1月	2月	備考
準備工		■	■	■	測量工、他
水路付替工		■	■		農業用水管布設 信号ケーブル架線工事
先行盛土工		■	■	■	トンネル発生土による先行盛土

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

12月						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
□	現場稼働日		■ 休工日			

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中部総合車両基地JV工事事務所
 （鹿島・ジェイアール東海建設・飛島JV）
 住所 中津川市千旦林鍛冶屋平 643-7
 電話 0573-68-3670
 担当者 あずま まえだ はなむら あたち やぎ
 東、前田、花村、安達、八木

中部総合車両基地ほか新設 工事だより

2022年
11月
vol. 8

お知らせ

11月も先行盛土工事、農業用水関連の工事を進めます。農業用水移設のため片側交互通行規制も継続予定です。これまで同様に安全第一で工事を進めてまいります。皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご協力をよろしくお願いいたします。


工事状況等（2022.10.13時点）

【進捗状況】

- ・準備工事、先行盛土工事：測量や先行盛土を進めています。
- ・水路付替工事：ファームポンドや揚水機場の構築、用水管布設を進めています。



【揚水機場構築・設備設置】

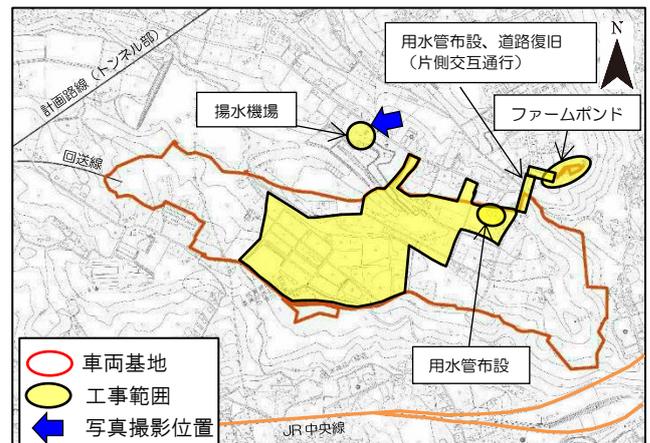

【当月の主な工事範囲】

【工事工程】	工種	11月	12月	1月	備考
	準備工				測量工、他
	水路付替工				ファームポンド、揚水機場 農業用水管布設
	先行盛土工				トンネル発生土による先行盛土

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

11月

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			
		現場稼働日	休工日			

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中部総合車両基地JV工事事務所
 (鹿島・ジェイアール東海建設・飛島JV)
 住所 中津川市千旦林鍛冶屋平 643-7
 電話 0573-68-3670
 担当者 あすま まえだ はなむら あたち やぎ
 東、前田、花村、安達、八木

中部総合車両基地ほか新設 工事だより

2022年
10月
vol. 7

お知らせ

10月も先行盛土工、農業用水関連の工事を進めます。農業用水移設のため片側交互通行規制も継続予定です。これまで同様に安全第一で工事を進めてまいります。皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご協力をよろしくお願いいたします。


工事状況等（2022. 9 .9時点）

【進捗状況】

- ・準備工、先行盛土工：測量や先行盛土を進めています。
- ・水路付替工：ファームポンドや揚水機場の構築、用水管布設を進めています。



【坂本75号線・片側交互通行】

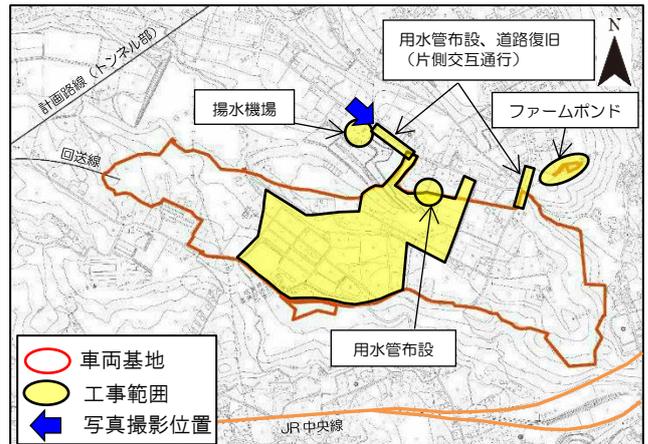

【当月の主な工事範囲】

【工事工程】	工種	10月	11月	12月	備考
	準備工				測量工
	水路付替工				ファームポンド、揚水機場 農業用水管布設
	先行盛土工				トンネル発生土による先行盛土

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

10月						
日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

□ 現場稼働日 □ 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中部総合車両基地JV工事事務所
 （鹿島・ジェイアール東海建設・飛島JV）
 住所 中津川市千旦林鍛冶屋平 643-7
 電話 0573-68-3670
 担当者 あすま まえだ はなむら あたち やぎ
 東、前田、花村、安達、八木

中部総合車両基地ほか新設 工事だより

2022年
9月
vol. 6

お知らせ

残暑の厳しい日々が続きますが、秋の気配も感じられるようになってきました。さて、9月も仮設工や先行盛土工、農業用水関連の工事を進めます。農業用水移設のため片側交互通行規制も継続予定です。これまで同様に安全第一で工事を進めてまいります。皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご協力をよろしくお願いいたします。


工事状況等（2022. 8. 3 時点）

【進捗状況】

- ・仮設工、先行盛土工：仮囲い設置や先行盛土を進めています。
- ・水路付替工：ファームポンドや揚水機場の構築、用水管布設を進めています。



【松源寺大平線・片側交互通行】

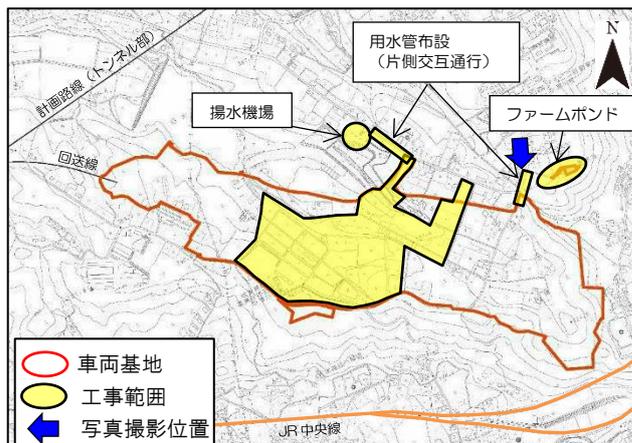

【当月の主な工事範囲】

【工事工程】

工種	9月	10月	11月	備考
準備・仮設工				仮囲い設置
水路付替工				ファームポンド、揚水機場 農業用水管布設
先行盛土工				トンネル発生土による先行盛土

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

9月

日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
□	現場稼働日		□	休工日		

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中部総合車両基地JV工事事務所
 （鹿島・ジェイアール東海建設・飛島JV）
 住所 中津川市千旦林鍛冶屋平 643-7
 電話 0573-68-3670
 担当者 あすま まえだ はなむら あたち やぎ
 東、前田、花村、安達、八木

中部総合車両基地ほか新設 工事だより

2022年
8月
vol.5

お知らせ

暦の上では夏も終盤を迎えますが、引き続き熱中症対策に努めてまいります。
8月も、仮設工や先行盛土工、農業用水関連の工事を進めます。農業用水の移設のため片側交互通行規制を継続予定です。これまで同様に安全第一で工事を進めてまいります。
皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご協力をよろしくお願い致します。


工事状況等（2022.7.7時点）

【進捗状況】

- ・仮設工、先行盛土工：仮囲い設置や先行盛土を進めています。
- ・水路付替工：ファームポンドや揚水機場の構築、用水管布設を進めています。



【松源寺大平線・片側交互通行】

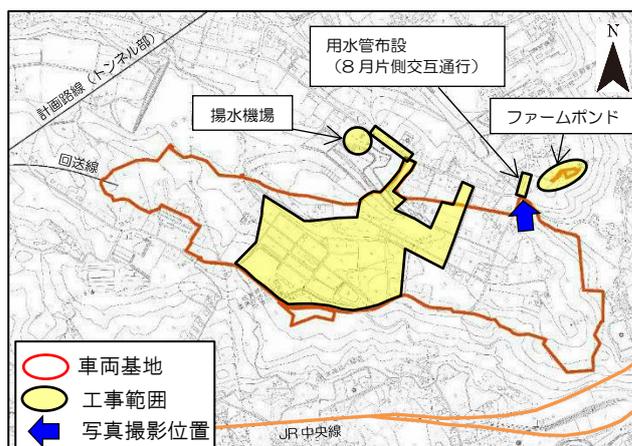

【当月の主な工事範囲】

【工事工程】

工種	8月	9月	10月	備考
準備・仮設工	■	■	■	仮囲い設置
水路付替工	■	■	■	ファームポンド、揚水機場 農業用水管布設
先行盛土工	■	■	■	トンネル発生土による先行盛土

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

8月

日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
□	現場稼働日		■ 休工日			

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中部総合車両基地JV工事事務所
(鹿島・ジェイアール東海建設・飛島JV)
住所 中津川市千旦林鍛冶屋平 643-7
電話 0573-68-3670
担当者 あすま まえだ はなむら あだち やぎ
東、前田、花村、安達、八木

中部総合車両基地ほか新設 工事だより

2022年
7月
vol. 4

お知らせ

暑さが強まる時期になりますので、熱中症対策に努めてまいります。
今月も、仮設工や先行盛土工、農業用水関連の工事を進めます。農業用水の移設のため片側交互通行規制を継続予定です。これまで同様に安全第一で工事を進めてまいります。
皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご協力をよろしくお願い致します。


工事状況等（2022. 6 .9時点）

【進捗状況】

- ・仮設工、先行盛土工：仮囲い設置や先行盛土を進めています。
- ・水路付替工：ファームポンドや揚水機場の構築、用水管布設を進めています。



【進出入路仮設ゲート・発生土運搬】

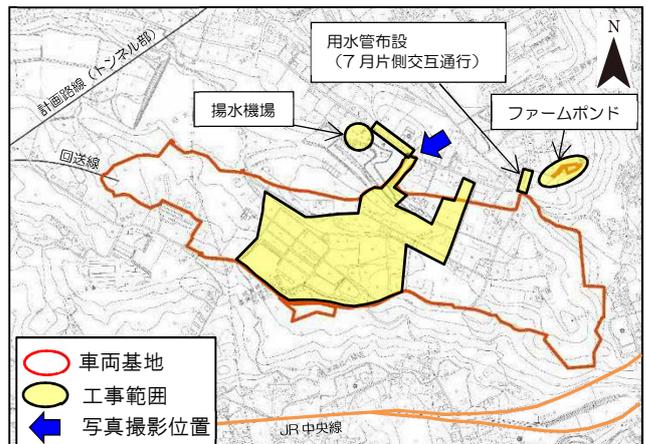

【当月の主な工事範囲】

【工事工程】

工種	7月	8月	9月	備考
準備・仮設工				仮囲い設置
水路付替工				ファームポンド、揚水機場 農業用水管布設
先行盛土工				トンネル発生土による先行盛土

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

7月						
日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						
□	現場稼働日		□ 休工日			

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中部総合車両基地JV工事事務所
（鹿島・ジェイアール東海建設・飛島JV）
住所 中津川市千旦林鍛冶屋平 643-7
電話 0573-68-3670
担当者 あすま まえだ はなむら あだち
東、前田、花村、安達

中部総合車両基地ほか新設 工事だより

2022年
6月
vol. 3

お知らせ

トンネル発生土の受入れを5月11日から再開しました。
今月も、先行盛土工や仮設工、農業用水関連の工事を進めます。農業用水の移設のため片側交互通行規制を実施予定です。これまで同様に安全第一で工事を進めてまいります。皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご協力をよろしくお願い致します。


工事状況等（2022.5.12時点）

【進捗状況】

- ・仮設工、先行盛土工：先行盛土準備や仮設沈砂池の施工を進めています。
- ・水路付替工：ファームポンドや揚水機場の構築、用水管布設を進めています。



【進出入路仮設ゲート・発生土運搬】

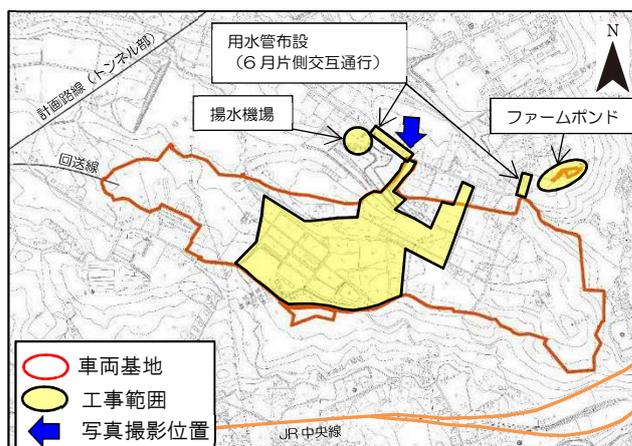

【当月の主な工事範囲】

【工事工程】

工種	6月	7月	8月	備考
準備・仮設工				仮囲い設置、進出入路造成
水路付替工				ファームポンド、揚水機場 農業用水管布設
先行盛土工				トンネル発生土による先行盛土準備

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

		6月						
日	月	火	水	木	金	土		
			1	2	3	4		
5	6	7	8	9	10	11		
12	13	14	15	16	17	18		
19	20	21	22	23	24	25		
26	27	28	29	30				
	現場稼働日	休工日						

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中部総合車両基地JV工事事務所
（鹿島・ジェイアール東海建設・飛島JV）
住所 中津川市千旦林鍛冶屋平 643-7
電話 0573-68-3670
担当者 あすま まえだ はなむら あだち
東、前田、花村、安達

中部総合車両基地ほか新設 工事だより

2022年
5月
vol. 2

お知らせ

青葉の美しい季節となり、着工から11カ月が経過しました。
今月も、先行盛土工や仮設備工、農業用水関連の工事を進めます。
これまで同様に安全第一で工事を進めてまいります。
皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご協力をよろしくお願い致します。


工事状況等（2022.4.1時点）

【進捗状況】

- ・仮設備工、先行盛土工：先行盛土準備や仮設沈砂池の施工を進めています。
- ・付替え水路工：農業用PCタンクや揚水機場の構築を進めています。



【工事用進入路仮設ゲート・仮囲い完了】

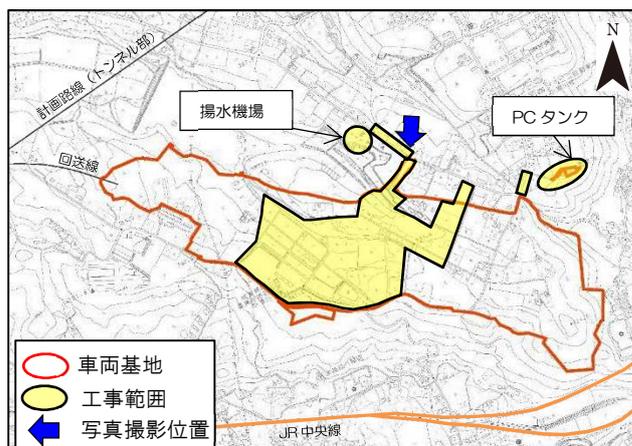

【当月の主な工事範囲】

【工事工程】

工種	5月	6月	7月	備考
準備・仮設備工	■			仮囲い設置、受入れトンネル発生土による進入路造成
付替え水路工	■			農業用PCタンク、揚水機場 農業用水管布設
先行盛土工	■			受入れトンネル発生土による 先行盛土準備

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

5月

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

□ 現場稼働日 ■ 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中部総合車両基地JV工事事務所
(鹿島・ジェイアール東海建設・飛島JV)
住所 中津川市千旦林鍛冶屋平 643-7
電話 0573-68-3670
担当者 あすま まえだ はなむら あだち
東、前田、花村、安達
