

濃飛横断自動車道事業 茄子川地内工事だより

2023年
3月
vol.7

お知らせ

濃飛横断自動車道（中津川工区）事業は、令和2年度より茄子川地内で橋梁下部工工事に着手いたしました。令和5年2月末時点では橋梁下部工が16基完成し、現在は11基の下部工、市道及び第二野田川の付替え工事、（仮）茄子川ⅠC交差点等の工事を進めております。

工事状況等

【工事箇所】



【工事概要】

業 者 名	主な工種	完成用途	3月の主な作業	2月末進捗状況	備 考
（株）加地工務店	橋梁下部工	R5.3末	橋脚工	98%	
（株）加藤工務店	橋梁下部工	R5.2末	水路工	100%	
（株）古川建材工業	道路改良	R5.3末	交差点部改良	90%	
（株）古川建材工業	第二野田川	R5.2末	水路工	100%	
昭和ソクリート工業（株）	橋梁上部工	R5.2末	桁架設工	100%	
（株）鳴海組	橋梁下部工	R5.3末	橋脚工	95%	
（株）吉川工務店	橋梁下部工	R5.3末	橋脚工	95%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課
担 当：瀬瀬、中村、北川、古宮山
電 話：0573-26-1111（内線：234・235）

濃飛横断自動車道安全協議会
代表者：柘植（加藤工務店）、林（加地工務店）
電 話：090-3158-2108、090-2139-8181

濃飛横断自動車道事業 茄子川地内工事だより


2023年
2月
vol.6

お知らせ

濃飛横断自動車道（中津川工区）事業は、令和2年度より茄子川地内で橋梁下部工工事に着手いたしました。令和5年2月末時点では橋梁下部工が15基完成し、現在は12基の下部工、市道及び第二野田川の付替え工事、（仮）茄子川ⅠC交差点等の工事を進めております。

工事状況等

【工事箇所】

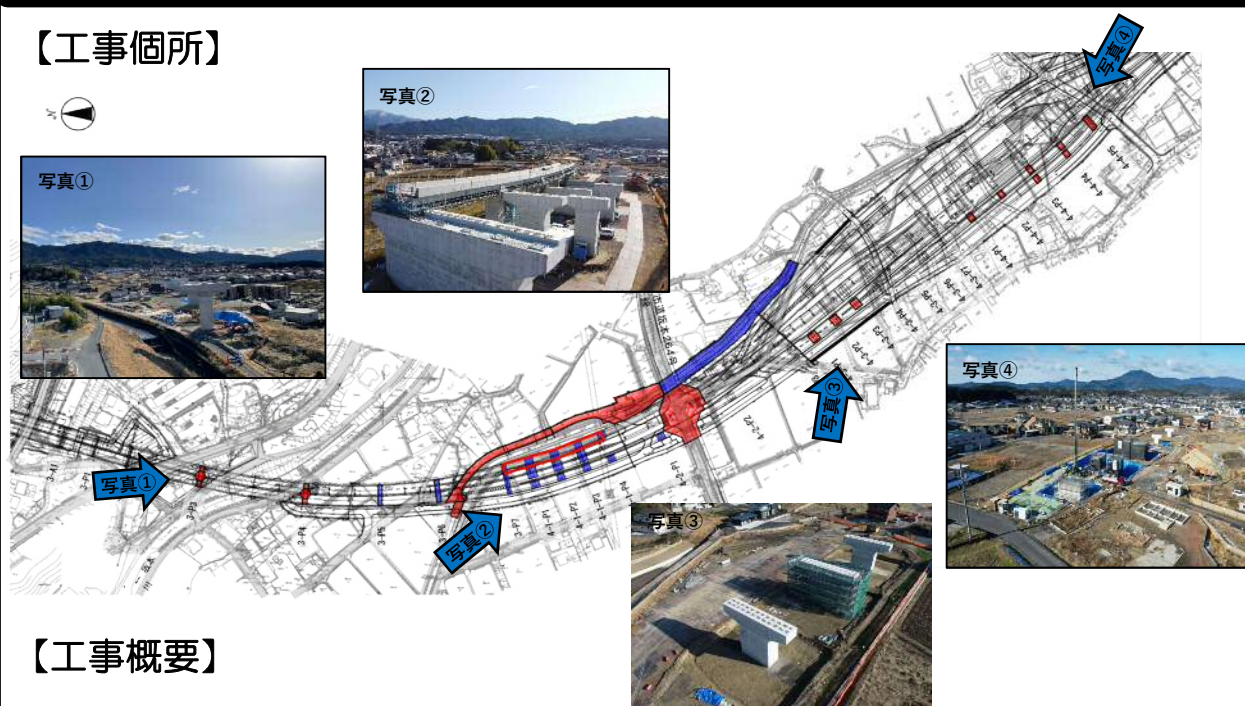

【工事概要】

業 者 名	主な工種	完成用途	1月の主な作業	12月末進捗状況	備 考
(株) 加地工務店	橋梁下部工	R5.1末	橋脚工	95%	
(株) 加藤工務店	橋梁下部工	R5.1末	橋脚工	92%	
(株) 古川建材工業	道路改良	R5.3末	交差点部改良	80%	
(株) 古川建材工業	第二野田川	R5.3末	付替水路	99%	
昭和ソノリト工業(株)	橋梁上部工	R5.3末	桁架設工	96%	
(株) 鳴海組	橋梁下部工	R5.3末	橋脚工	85%	
(株) 吉川工務店	橋梁下部工	R5.3末	橋脚工	93%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課
担 当：瀬瀬、中村、北川、古宮山
電 話：0573-26-1111(内線：234・235)

濃飛横断自動車道安全協議会
代表者：柘植（加藤工務店）、林（加地工務店）
電 話：090-3158-2108、090-2139-8181

濃飛横断自動車道事業

茄子川地内工事だより

2023年

1月


vol.5

お知らせ

濃飛横断自動車道（中津川工区）事業は、令和2年度より茄子川地内で橋梁下部工工事に着手いたしました。令和4年12月末時点では橋梁下部工が15基完成し、現在は12基の下部工、市道及び第二野田川の付替え工事、（仮）茄子川ⅠC交差点等の工事を進めております。

工事状況等

【工事箇所】

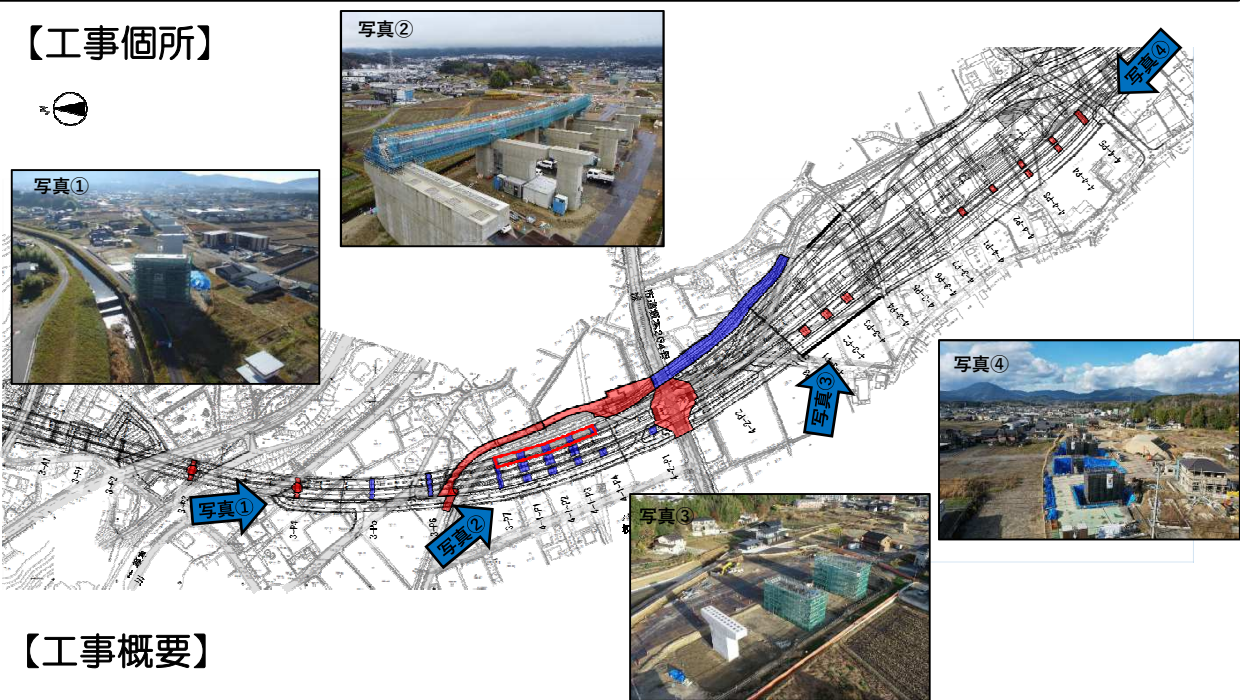

【工事概要】

業 者 名	主な工種	完成目途	1月の主な作業	12月末進捗状況	備 考
（株）加地工務店	橋梁下部工	R5.1末	橋脚工	95%	
（株）加藤工務店	橋梁下部工	R5.1末	橋脚工	90%	
（株）古川建材工業	道路改良	R5.3末	交差点部改良	70%	
（株）古川建材工業	第二野田川	R5.3末	付替水路	98%	
（株）岡山工務店	第二野田川	-	ボックスカルバート	100%	完成
昭和コンクリート工業（株）	橋梁上部工	R5.3末	桁架設工	90%	
（株）鳴海組	橋梁下部工	R5.3末	橋脚工	70%	
（株）吉川工務店	橋梁下部工	R5.3末	橋脚工	80%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課
 担 当：瀬瀬、中村、北川、古宮山
 電 話：0573-26-1111(内線：234・235)

濃飛横断自動車道安全協議会
 代表者：柘植（加藤工務店）、林（加地工務店）
 電 話：090-3158-2108、090-2139-8181

濃飛横断自動車道事業 茄子川地内工事だより

2022年
12月
vol.4

お知らせ

濃飛横断自動車道（中津川工区）事業は、令和2年度より茄子川地内で橋梁下部工工事に着手いたしました。令和4年7月末時点では橋梁下部工が13基完成し、現在は14基の下部工、市道及び第二野田川の付替え工事、（仮）茄子川ⅠC交差点等の工事を進めております。

工事状況等

【工事箇所】



【工事概要】

業 者 名	主な工種	完成目途	12月の主な作業	11月末進捗状況	備 考
(株) 加地工務店	橋梁下部工	R5.1末	橋脚工	85%	
(株) 加藤工務店	橋梁下部工	R5.1末	橋脚工	85%	
(株) 中島工務店	橋梁下部工	R4.11末	橋脚工	100%	
(株) 古川建材工業	道路改良	R5.3末	交差点部改良	60%	
(株) 古川建材工業	第二野田川	R5.3末	付替水路	98%	
(株) 岡山工務店	第二野田川	R4.11末	ボックスカルバート	100%	
昭和コンクリート工業(株)	橋梁上部工	R5.3末	桁架設工	85%	
(株) 鳴海組	橋梁下部工	R5.3末	橋脚工	50%	
(株) 吉川工務店	橋梁下部工	R5.3末	橋脚工	60%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課
担 当：瀬瀬、中村、北川、古宮山
電 話：0573-26-1111(内線：234・235)

濃飛横断自動車道安全協議会
代表者：柘植（加藤工務店）、林（加地工務店）
電 話：090-3158-2108、090-2139-8181

濃飛横断自動車道事業 茄子川地内工事だより


2022年
11月
vol.3

お知らせ

濃飛横断自動車道（中津川工区）事業は、令和2年度より茄子川地内で橋梁下部工工事に着手いたしました。令和4年7月末時点では橋梁下部工が13基完成し、現在は14基の下部工、市道及び第二野田川の付替え工事、（仮）茄子川IC交差点等の工事を進めております。

工事状況等

【工事箇所】

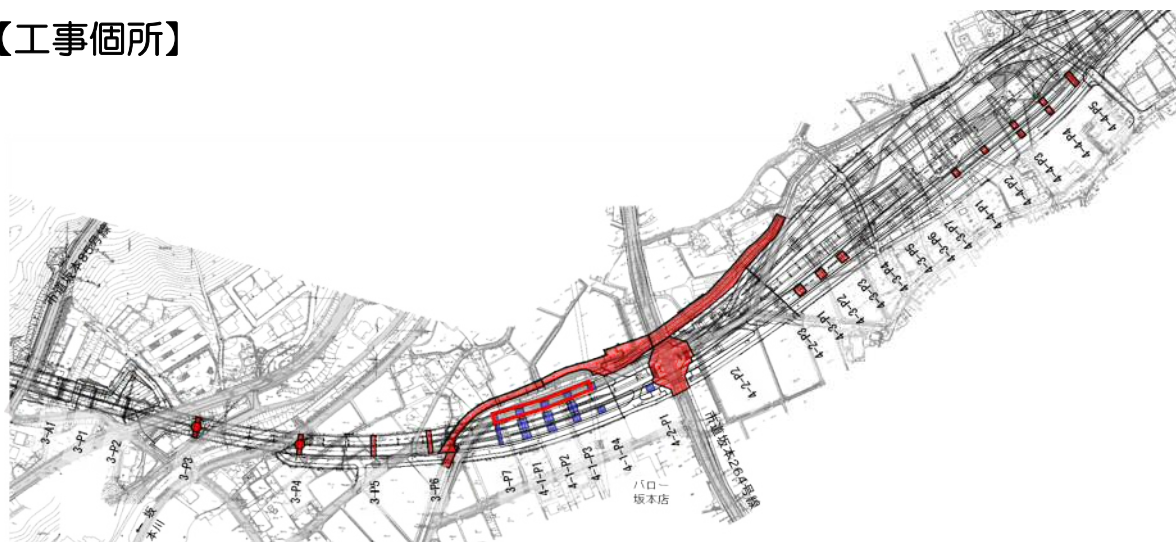

【工事概要】

業 者 名	主な工種	完成用途	11月の主な作業	10月末進捗状況	備 考
（株）加地工務店	橋梁下部工	R5.1末	橋脚工	85%	
（株）加藤工務店	橋梁下部工	R5.1末	橋脚工	85%	
（株）中島工務店	橋梁下部工	R4.11末	橋脚工	98%	
（株）古川建材工業	道路改良	R4.11末	交差点部改良	60%	
（株）古川建材工業	第二野田川	R4.11末	付替道路	98%	
（株）岡山工務店	第二野田川	R4.11末	ボックスカルバート	96%	
昭和コンクリート工業（株）	橋梁上部工	R5.3末	桁架設工	83%	
（株）鳴海組	橋梁下部工	R5.3末	掘削・橋脚工	35%	
（株）吉川工務店	橋梁下部工	R5.3末	掘削・橋脚工	50%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課
担 当：瀬瀬、中村、北川、古宮山
電 話：0573-26-1111（内線：234・235）

濃飛横断自動車道安全協議会
代表者：柘植（加藤工務店）、林（加地工務店）
電 話：090-3158-2108、090-2139-8181

濃飛横断自動車道事業
茄子川地内工事だより


2022年
10月
vol.2

お知らせ

濃飛横断自動車道（中津川工区）事業は、令和2年度より茄子川地内で橋梁下部工工事に着手いたしました。令和4年7月末時点では橋梁下部工が13基完成し、現在は14基の下部工、市道及び第二野田川の付替え工事、（仮）茄子川ⅠC交差点等の工事を進めております。

工事状況等

【工事箇所】

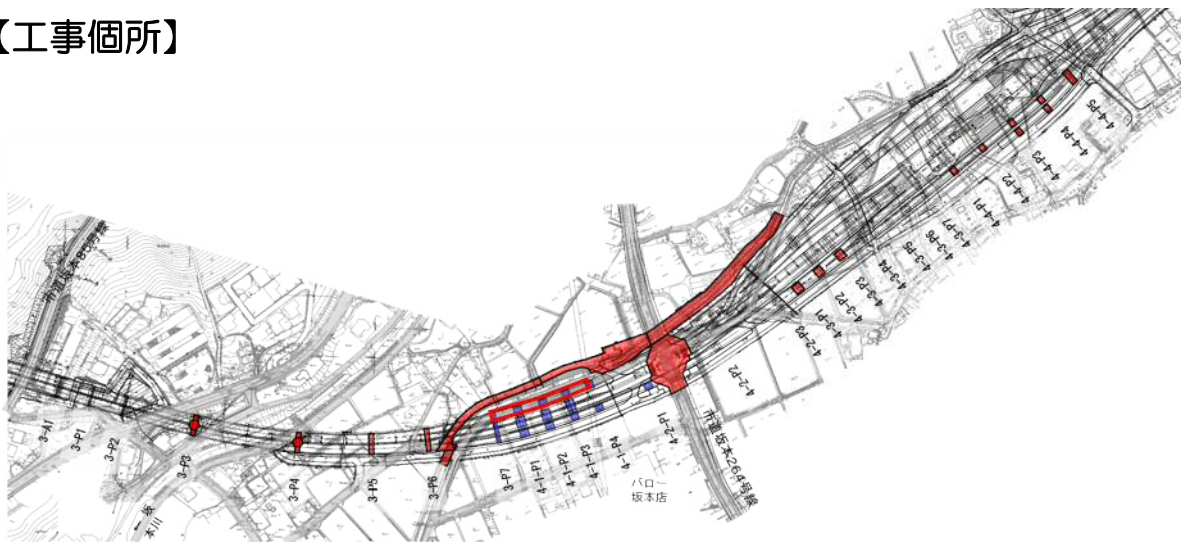

【工事概要】

業 者 名	主な工種	完成用途	10月の主な作業	9月末進捗状況	備 考
(株) 加地工務店	橋梁下部工	R5.1末	橋脚工	70%	
(株) 加藤工務店	橋梁下部工	R5.1末	橋脚工	70%	
(株) 中島工務店	橋梁下部工	R4.11末	橋脚工	94%	
(株) 古川建材工業	道路改良	R4.11末	交差点部改良	58%	
(株) 古川建材工業	第二野田川	R4.11末	付替道路	98%	
(株) 岡山工務店	第二野田川	R4.11末	ホックカバート	92%	
昭和ソクリート工業（株）	橋梁上部工	R5.3末	桁架設工	75%	
(株) 鳴海組	橋梁下部工	R5.3末	掘削・橋脚工	23%	
(株) 吉川工務店	橋梁下部工	R5.3末	掘削・橋脚工	45%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課
担 当：瀬瀬、中村、北川、古宮山
電 話：0573-26-1111(内線：234・235)

濃飛横断自動車道安全協議会
代表者：柘植（加藤工務店）、林（加地工務店）
電 話：090-3158-2108、090-2139-8181

濃飛横断自動車道事業 茄子川地内工事だより

2022年
9月
vol.1

お知らせ

濃飛横断自動車道（中津川工区）事業は、令和2年度より茄子川地内で橋梁下部工工事に着手いたしました。令和4年7月末時点では、橋梁下部工が13基完成し、14基の下部工、市道及び第二野田川の付替え工事、（仮）茄子川IC交差点等の工事を進めております。

また8月より橋梁上部工の架設工事も始まりました。

工事状況等

【工事箇所】



【工事概要】

業 者 名	主な工種	完成目途	9月の主な作業	8月末進捗状況
（株）加地工務店	橋梁下部工	R5.1末	橋脚工	60%
（株）加藤工務店	橋梁下部工	R5.1末	橋脚工	58%
（株）中島工務店	橋梁下部工	R4.9末	橋脚工	89%
（株）古川建材工業	道路改良	R4.11末	交差点部改良	46%
（株）古川建材工業	第二野田川	R4.11末	付替道路	93%
（株）岡山工務店	第二野田川	R4.11末	ボックスカルバート	90%
昭和コンクリート工業（株）	橋梁上部工	R5.3末	桁架設工	70%
（株）鳴海組	橋梁下部工	R5.3末	掘削・橋脚工	13%
（株）吉川工務店	橋梁下部工	R5.3末	掘削・橋脚工	35%

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課
担 当：瀬瀬、中村、北川、古宮山
電 話：0573-26-1111（内線：234・235）

濃飛横断自動車道安全協議会
代表者：柘植（加藤工務店）、林（加地工務店）
電 話：090-3158-2108、090-2139-8181
