

お知らせ

清水建設株式会社（単独）でリニア中央新幹線第一木曽川橋りょうほか新設工事を進めています。3月は、山口側ヤードの工事用道路の造成、A1橋台の土留め工事、P4橋脚基礎の岩盤掘削を行います。

【お知らせ】

・法定外道路（下図の赤色明示）を工事のため通行止めを予定しています。大変ご不便をお掛けしますがご協力のほど宜しくお願い致します。**通行止め期間 令和5年3月～令和9年12月（予定）**

工事進捗状況等（2024.2.15時点）

【進捗状況】

・工事用道路
→工事用道路の造成を行い、発生土は中津川市内へ運搬します。


・A1橋台
→3月からA1橋台の構築に伴う掘削及び土留め工事を行います。

・P4橋脚
→P4橋脚基礎の岩盤を掘削して砂で置き換える工事を行います。

【工程】

工 種	3月	4月	5月
工事用道路（山口側）	造成	造成	造成
工事用道路（瀬戸側）			伐採
A1橋台	竹割土留め	竹割土留め	竹割土留め
P4橋脚	岩盤掘削	岩盤掘削	ヤード撤去

【翌月の工事予定】

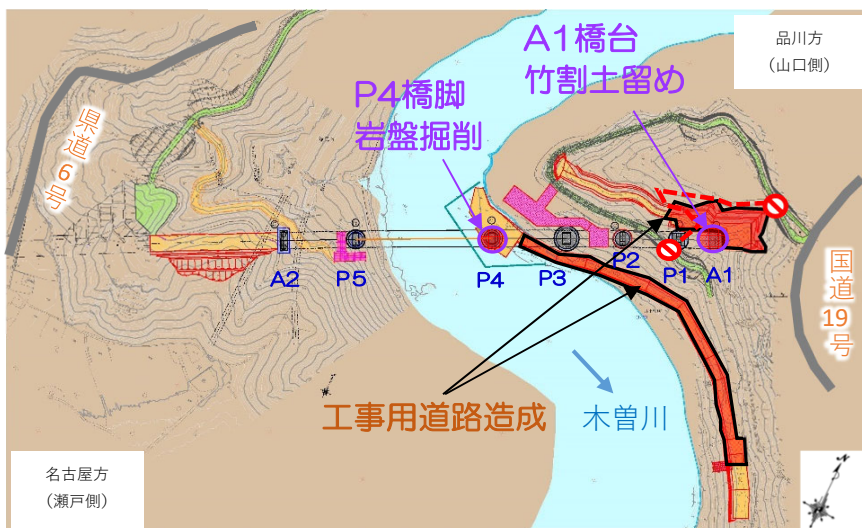

3月						
日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

清水建設株式会社

第一木曽川橋りょう作業所

住所 中津川市落合2750-1（株エナ重機様敷地）

TEL：0573-64-9077

担当 せき 関 , おさき 尾寄 , まさおか 政岡

子どもたちに誇れるしごとを。

SHIMIZU CORPORATION
清水建設

お知らせ

清水建設株式会社（単独）でリニア中央新幹線第一木曽川橋りょうほか新設工事を進めています。2月は、山口側ヤードの工事用道路の造成に加えてP4橋脚基礎の岩盤掘削を行います。

【お知らせ】

・工事ヤードの法定外道路（下図の黄色明示）を工事のため通行止めを予定しています。大変ご不便をお掛けしますがご協力のほど宜しくお願い致します。

通行止め期間 令和5年3月～令和9年12月（予定）

工事進捗状況等（2024.1.15時点）

【進捗状況】

・工事用道路

→工事用道路の造成を行い、発生土は中津川市内へ運搬します。


・P4橋脚

→P4橋脚基礎の岩盤を掘削して砂で置き換える工事を行います。

【工程】

工 種	2月	3月	4月
進入路（掘削、盛土、土砂搬出、排水工）			
P4橋脚	岩盤掘削	岩盤掘削	岩盤掘削

【位置図】（山口側） 法定外道路（通行止め）

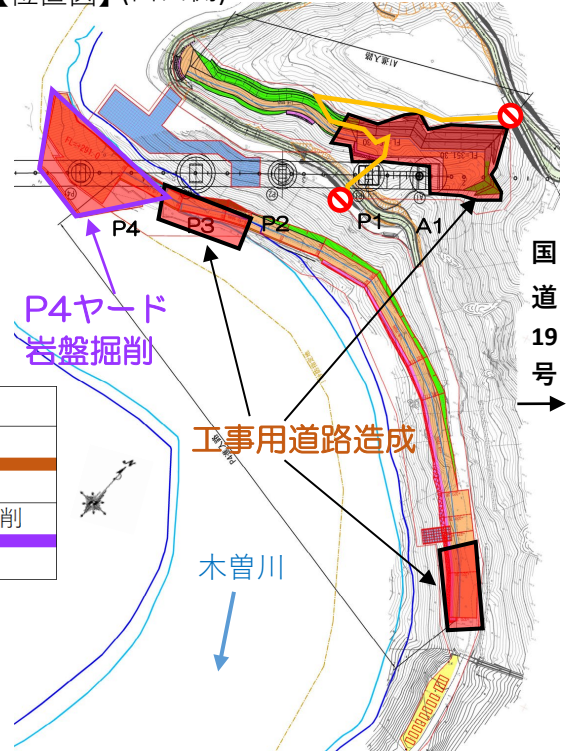

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

清水建設株式会社

第一木曽川橋りょう作業所

住所 中津川市落合2750-1（株エナ重機様敷地）

TEL：0573-64-9077

担当 せき 尾崎 関

子どもたちに誇れるしごとを。

SHIMIZU CORPORATION
清水建設

2月						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29		

第一木曽川橋りょうほか新設工事

Vol.14

お知らせ

清水建設株式会社（単独）でリニア中央新幹線第一木曽川橋りょうほか新設工事を行っています。
1月は、山口側ヤードの工事用道路の造成に加えてP4橋脚の岩盤掘削を行います。

【お知らせ】

・工事ヤードの法定外道路（下図の黄色明示）を工事のため通行止めを予定しています。大変ご不便をお掛けしますがご協力のほど宜しくお願い致します。

通行止め期間 令和5年3月～令和9年12月（予定）

工事進捗状況等（2023.12.15時点）


【進捗状況】

- ・工事用道路
→工事用道路の造成を行い、発生土は中津川市内へ運搬します。
- ・P4橋脚
→P4橋脚基礎の岩盤を掘削して砂で置き換える工事を行います。

【工程】

工 種	1月	2月	3月
進入路（掘削、盛土、排水工、舗装）			
P4橋脚	岩盤掘削	岩盤掘削	岩盤掘削

【位置図】（山口側） 法定外道路（通行止め）

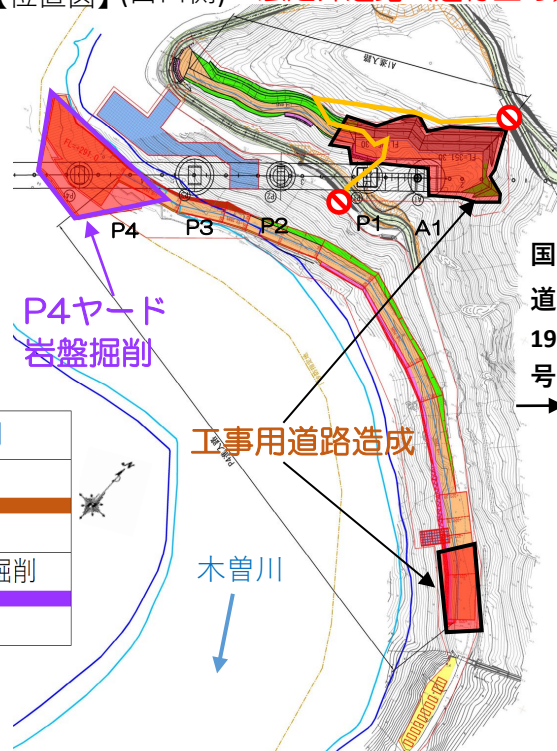

1月						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

清水建設株式会社

第一木曽川橋りょう作業所

住所 中津川市落合2750-1（株エナ重機様敷地）

TEL：0573-64-9077

担当 せき 関 , おさき 尾崎

子どもたちに誇れるしごとを。

SHIMIZU CORPORATION
清水建設

2023年

回覧

しみずまんすりー

12月

第一木曽川橋りょうほか新設工事

Vol.13

お知らせ

清水建設株式会社（単独）でリニア中央新幹線第一木曽川橋りょうほか新設工事を行っています。
12月は、山口側ヤードの伐採・工事用道路の造成に加えてP4橋脚の準備工を行います。

【お知らせ】

・工事ヤードの法定外道路（下図の黄色明示）を工事のため通行止めを予定しています。大変ご不便をお掛けしますがご協力のほど宜しくお願い致します。

通行止め期間 令和5年3月～令和9年12月（予定）

工事進捗状況等（2023.11.15時点）

【進捗状況】

・伐採

→12月も伐採・除根を継続する予定です。

・工事用道路

→工事用道路の造成を行い、発生土は中津川市内へ運搬します。


・P4橋脚

→橋脚基礎を施工するためのヤード整備と鋼矢板を地盤に打込む仮締切りの設置を行います。

【工程】

工 種	12月	1月	2月
伐採			
進入路 （掘削、盛土）			
P4橋脚	整備・仮締切り	岩盤掘削	岩盤掘削

【位置図】（山口側） 法定外道路（通行止め）

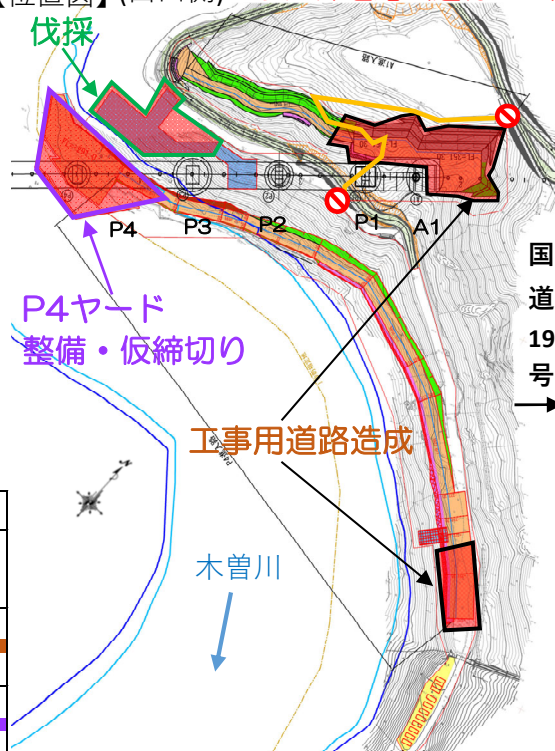

12月						
日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

清水建設株式会社

第一木曽川橋りょう作業所

住所 中津川市落合2750-1（㈱エナ重機様敷地）
TEL：0573-64-9077

担当 なかしま 中島 090-7616-1024
おさき 尾寄 090-6851-3494

子どもたちに誇れるしごとを。

SHIMIZU CORPORATION 清水建設

2023年

回覧

しみずまんすりー

11月

第一木曽川橋りょうほか新設工事

Vol.12

お知らせ

清水建設株式会社（単独）でリニア中央新幹線第一木曽川橋りょうほか新設工事を行っています。
11月は、山口側ヤードの伐採・工事用道路の造成に加えてP4橋脚の準備工を行います。

【お知らせ】

・工事ヤードの法定外道路（下図の黄色明示）を工事のため通行止めを予定しています。大変ご不便をお掛けしますがご協力のほど宜しくお願い致します。

通行止め期間 令和5年3月～令和9年12月(予定)

・資材置場兼南側転回場に保管した発生土から土壌溶出量基準を超える「ヒ素」が検出されました。当該土壌は、県の指導に基づき最終処分場（可児市のダイセキ環境ソリューション）に運搬して適正に処分をしました。

（調査結果0.015mg/L(土壌溶出量基準0.01mg/L以下)）

工事進捗状況等（2023.10.15時点）

【進捗状況】

・伐採

→11月も伐採・除根を継続する予定です。

・工事用道路

→工事用道路の造成を行い、発生土は場外へ運搬します。

・P4橋脚


→基礎の岩盤を砕いて砂で置き換える工事を行う予定です。

【工程】

工 種	11月	12月	1月
伐採			
進入路 (掘削、盛土)			
P4橋脚	ヤード造成	岩盤掘削	岩盤掘削

【位置図】

法定外道路（通行止め）（山口側）

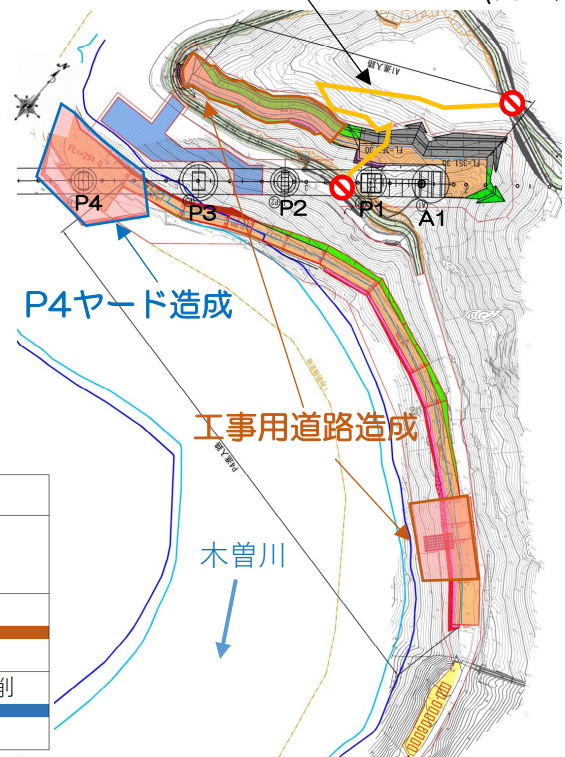

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

清水建設株式会社

第一木曽川橋りょう作業所

住所 中津川市落合2750-1（櫛エナ重機様敷地）

TEL：0573-64-9077

なかしま

担当 中島 090 - 7616 - 1024

おさき

尾崎 090 - 6851 - 3494

子どもたちに誇れるしごとを。

SHIMIZU CORPORATION 清水建設

11 月						
日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

2023年

回覧

しみずまんすりー

10月

第一木曽川橋りょうほか新設工事

Vol.11

お知らせ

清水建設株式会社（単独）でリニア中央新幹線第一木曽川橋りょうほか新設工事を行っています。
10月は、引き続き山口側ヤードの伐採と工事用道路の造成を行います。

【お知らせ】

工事ヤードの法定外道路（下図の黄色明示）を工事のため通行止めを予定しています。大変ご不便をお掛けしますがご協力のほど宜しくお願い致します。

通行止め期間 令和5年3月～令和9年12月（予定）

工事進捗状況等（2023.9.15時点）


【進捗状況】

- ・伐採
→10月も伐採・除根を継続する予定です。
- ・重機土工
→工事用道路の造成を行い、
発生土は場外へ運搬します。

【工程】

工 種	10月	11月	12月
伐採			
重機土工 (掘削、盛土)			

【位置図】

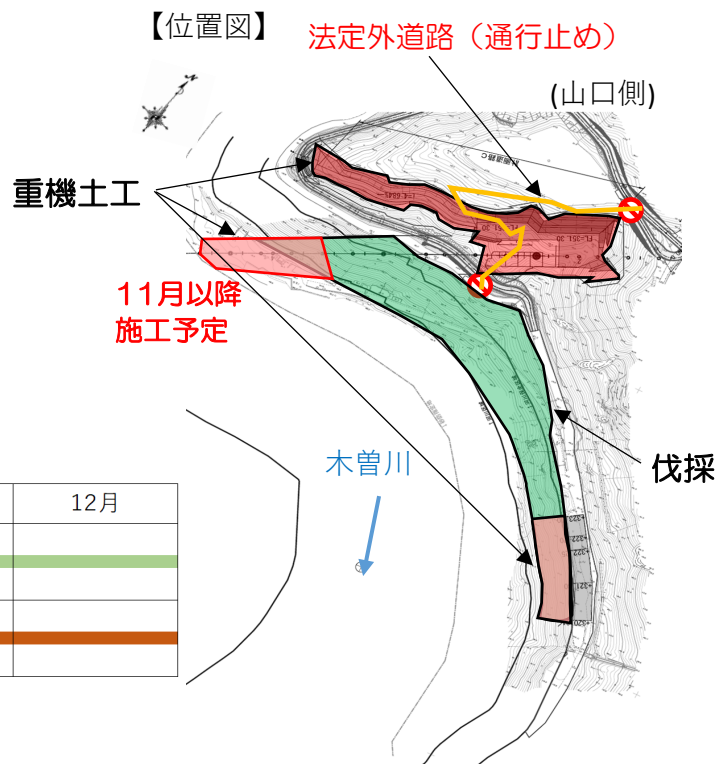

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

清水建設株式会社

第一木曽川橋りょう作業所

住所 中津川市落合2750-1（機工ナ重機様敷地）

TEL：0573-64-9077

担当 なかしま 中島 090 - 7616 - 1024

おさき 尾崎 090 - 6851 - 3494

子どもたちに誇れるしごとを。

SHIMIZU CORPORATION
清水建設

10月

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

第一木曽川橋りょうほか新設工事

Vol.10

お知らせ

清水建設株式会社（単独）でリニア中央新幹線第一木曽川橋りょうほか新設工事を行っています。
9月は、引き続き山口側ヤードの伐採と工事用道路の造成を行います。

【お知らせ】

工事ヤードの法定外道路（下図の黄色明示）を工事のため通行止めを予定しています。大変ご不便をお掛けしますがご協力のほど宜しくお願い致します。

通行止め期間 令和5年3月～令和9年12月（予定）

工事進捗状況等（2023.8.15時点）


【進捗状況】

- ・伐採
→9月も伐採・除根を継続する予定です。
- ・重機土工
→工事用道路の造成を行い、
発生土は中津川市内へ運搬します。

【工程】

工 種	9月	10月	11月
伐採			
重機土工 （掘削、盛土）			

【位置図】

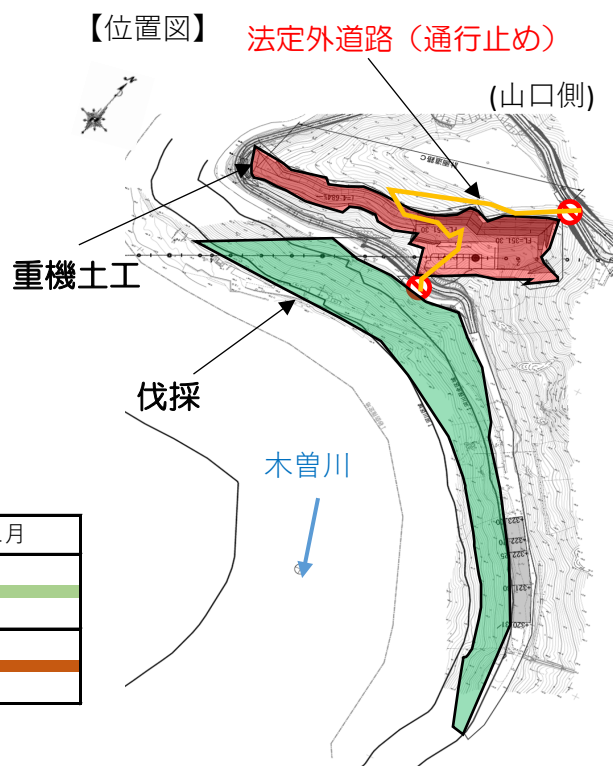

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

清水建設株式会社

第一木曽川橋りょう作業所

住所 中津川市落合2750-1（櫛工ナ重機様敷地）

TEL：0573-64-9077

担当 なかしま 中島 090 - 7616 - 1024

おさき 尾崎 090 - 6851 - 3494

子どもたちに誇れるしごとを。

SHIMIZU CORPORATION
清水建設

第一木曽川橋りょうほか新設工事

Vol.9

お知らせ

清水建設株式会社（単独）でリニア中央新幹線第一木曽川橋りょうほか新設工事を行っています。
8月は、引き続き山口側ヤードの伐採と工事用道路の造成を行います。

【お知らせ】

工事ヤードの法定外道路（下図の黄色明示）を工事のため通行止めを予定しています。大変ご不便をお掛けしますがご協力のほど宜しくお願い致します。

通行止め期間 令和5年3月～令和9年12月(予定)

工事進捗状況等（2023.7.15時点）


【進捗状況】

- ・伐採
→8月も伐採・除根を継続する予定です。
- ・重機土工
→工事用道路の造成を行い、
発生土は中津川市内へ運搬します。

【工程】

工 種	8月	9月	10月
伐採			
重機土工 (掘削、盛土)			

【位置図】

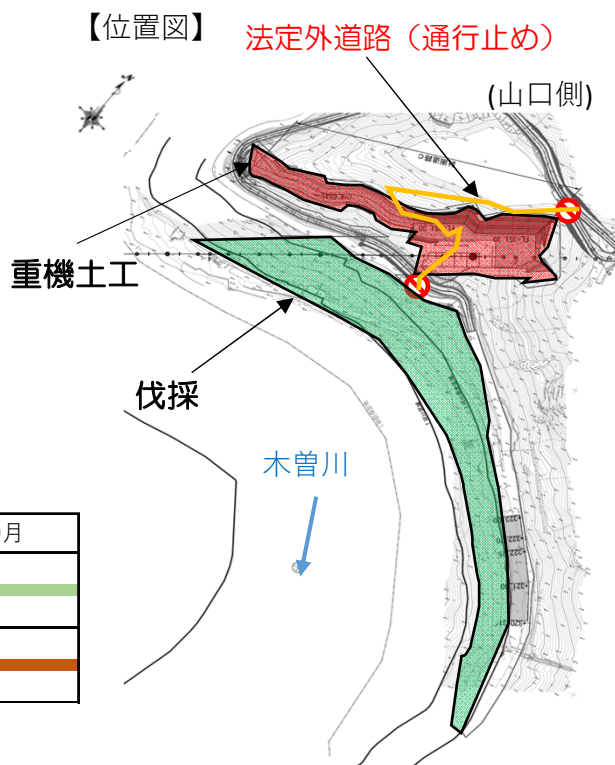

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

清水建設株式会社

第一木曽川橋りょう作業所

住所 中津川市落合2750-1（㈱工ナ重機様敷地）
TEL：0573-64-9077

担当 なかしま 中島 090 - 7616 - 1024
おさき 尾崎 090 - 6851 - 3494

第一木曽川橋りょうほか新設工事

Vol.8

お知らせ

清水建設株式会社（単独）でリニア中央新幹線第一木曽川橋りょうほか新設工事を行っています。
7月は、引き続き山口側ヤードの伐採と工事用道路の造成を行います。

【お知らせ】

工事ヤードの法定外道路（下図の黄色明示）を工事のため通行止めを予定しています。大変ご不便をお掛けしますがご協力のほど宜しくお願い致します。

通行止め期間 令和5年3月～令和9年12月(予定)

工事進捗状況等（2023.6.15時点）


【進捗状況】

- ・伐採
→7月も伐採・除根を継続する予定です。
- ・重機土工
→伐採の進捗に応じて工事用道路の造成を行い、発生土は中津川市内へ運搬します。

【工程】

工 種	7月	8月	9月
伐採			
重機土工 (掘削、盛土)			

【位置図】

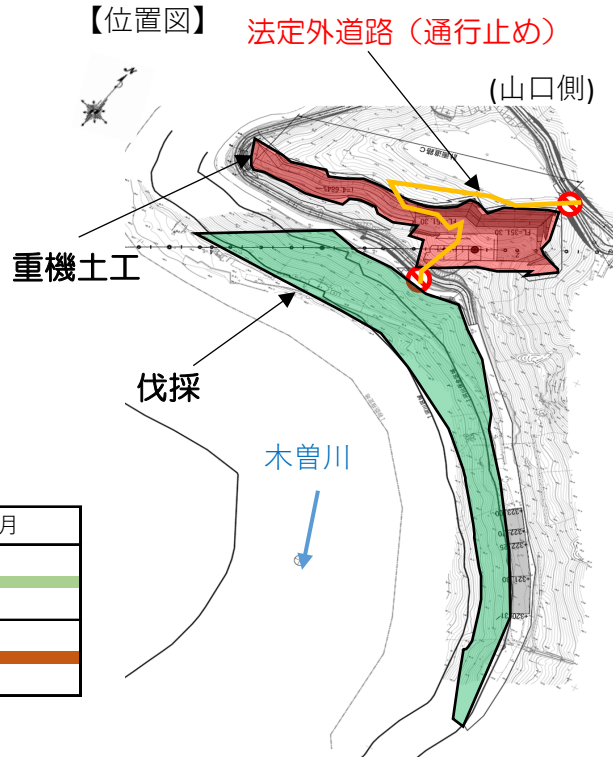

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

清水建設株式会社

第一木曽川橋りょう作業所

住所 中津川市落合2750-1（櫛工ナ重機様敷地）
TEL：0573-64-9077

担当 なかしま 中島 090 - 7616 - 1024
おさき 尾寄 090 - 6851 - 3494

7月

日	月	火	水	木	金	土
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

第一木曽川橋りょうほか新設工事

Vol.7

お知らせ

清水建設株式会社（単独）でリニア中央新幹線第一木曽川橋りょうほか新設工事を行っています。
6月は、引き続き山口側ヤードの伐採と工事用道路の造成を行います。

【お知らせ】

工事ヤードの法定外道路（下図の黄色明示）を工事のため通行止めを予定しています。大変ご迷惑をお掛けしますがご協力のほど宜しくお願い致します。

通行止め期間 令和5年3月～令和9年12月（予定）

工事進捗状況等（2023.5.15時点）


【進捗状況】

- ・伐採
→6月も伐採・除根を継続する予定です。
- ・重機土工
→伐採の進捗に応じて工事用道路の造成
を行い、発生土は中津川市内へ運搬します。

【工程】

工 種	6月	7月	8月
伐採			
重機土工 （掘削、盛土）			

【位置図】

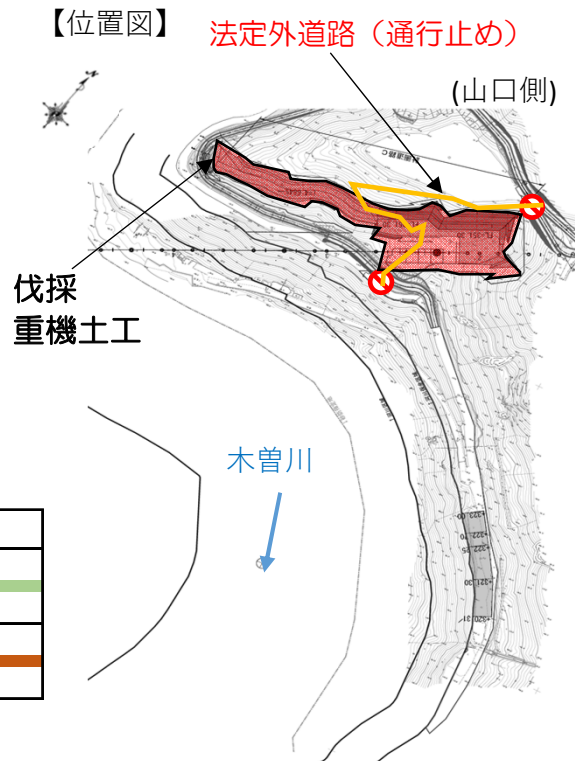

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

清水建設株式会社

第一木曽川橋りょう作業所

住所 中津川市落合2750-1（㈱工ナ重機様敷地）
TEL：0573-64-9077

担当 なかしま 中島 090 - 7616 - 1024
おさき 尾崎 090 - 6851 - 3494

お知らせ

清水建設株式会社（単独）でリニア中央新幹線第一木曽川橋りょうほか新設工事を行っています。
5月は、山口側ヤードの伐採のほか、重機土工を開始します。

【お知らせ】

工事ヤードの法定外道路（下図の黄色明示）を工事のため通行止めを予定しています。大変ご迷惑をお掛けしますがご協力のほど宜しくお願い致します。

通行止め期間 令和5年3月～令和9年12月(予定)

工事進捗状況等（2023.4.15時点）


【進捗状況】

- ・伐採
→5月も伐採・除根を継続する予定です。
- ・重機土工
→最初に伐採工の乗入口を整備し、その後は伐採の進捗に応じて工事を進めます。

【工程】

工 種	5月	6月	7月
伐採			
重機土工 (掘削、盛土)	乗入部		

【位置図】

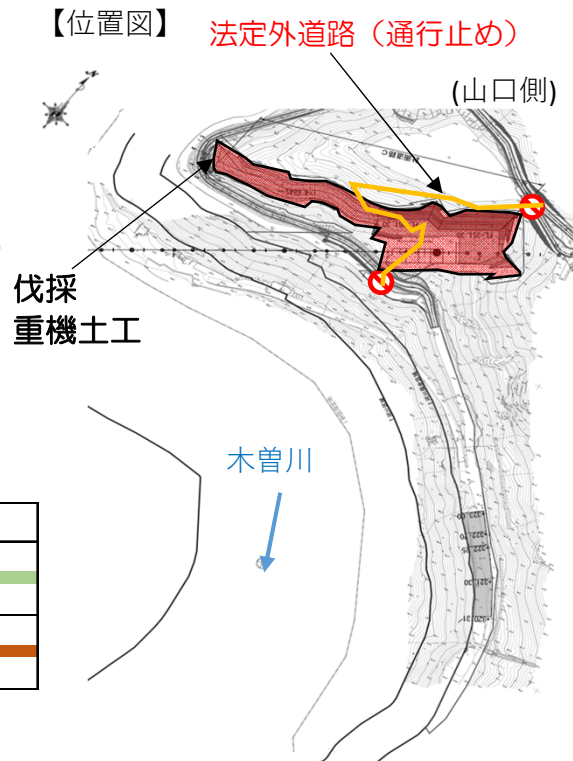

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

清水建設株式会社

第一木曽川橋りょう作業所

住所 中津川市落合2750-1（㈱工ナ重機様敷地）
TEL：0573-64-9077

担当 なかしま 中島 090 - 7616 - 1024
おさき 尾崎 090 - 6851 - 3494

しみずまんすりー

第一木曽川橋りょうほか新設工事

2023年

4月

Vol.5

お知らせ

清水建設株式会社（単独）でリニア中央新幹線第一木曽川橋りょうほか新設工事を行っています。
1月から実施していた用地測量・立木調査、ボーリング調査が完了しました。4月は、山口側ヤードの伐採を開始する予定です。

【お知らせ】

工事ヤードの法定外道路（下図の黄色明示）を工事のため通行止めを予定しています。大変ご迷惑をお掛けしますがご協力のほど宜しくお願い致します。

通行止め期間 令和5年3月～令和9年12月(予定)

工事進捗状況等（2023.3.10時点）


【進捗状況】

- ・用地測量・立木調査
→完了
- ・ボーリング調査
→完了
- ・伐採
→4月は伐採・除根を開始する予定です。

【工程】

工 種	4 月	5 月	6 月
伐採			

【位置図】

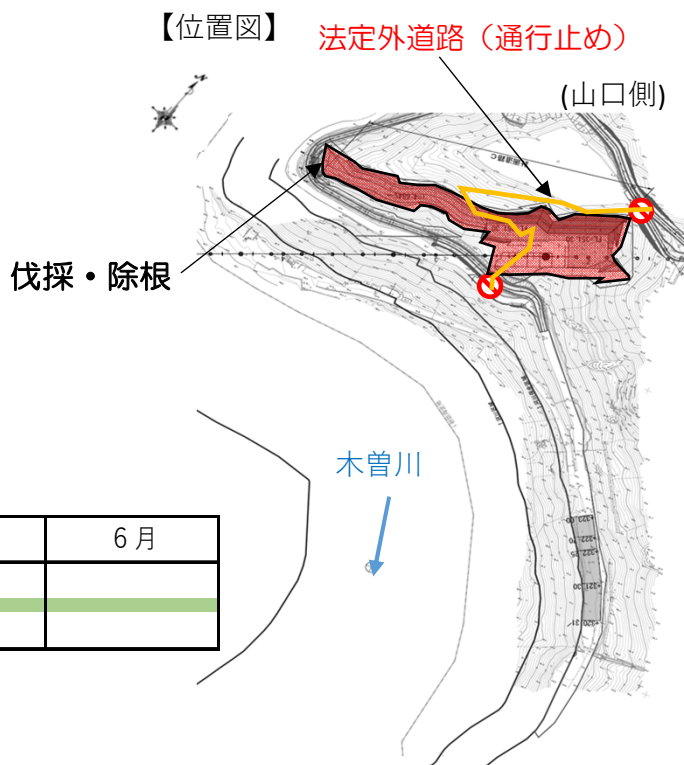

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

清水建設株式会社

第一木曽川橋りょう作業所

住所 中津川市落合2750-1（機工ナ重機様敷地）
TEL：0573-64-9077

担当 なかしま 中島 090 - 7616 - 1024
おさき 尾崎 090 - 6851 - 3494

子どもたちに誇れるしごとを。
SHIMIZU CORPORATION
清水建設

4 月						
日	月	火	水	木	金	土
26						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
