

リニア岐阜県駅周辺 土地区画整理事業工事だより

2024 年
3 月
vol.24

お知らせ


現在、リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業の区域内では、造成・道路築造・排水路工事を進めています。

中央工区では、水線で示す範囲の造成工事を進めており、黄線で示す北側の河川沿いの道路は通行止めになっています。

西工区では、橙線で示す範囲の造成工事を進めており、2月中旬で必要土砂の受け入れを完了しました。今後は場内での作業を中心に工事を行います。

中央工区、西工区ともに、道路側溝が設置されたことで、将来の道路線形がみえてきました。地域の皆様にはご不便おかけしますが、ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

工事状況等

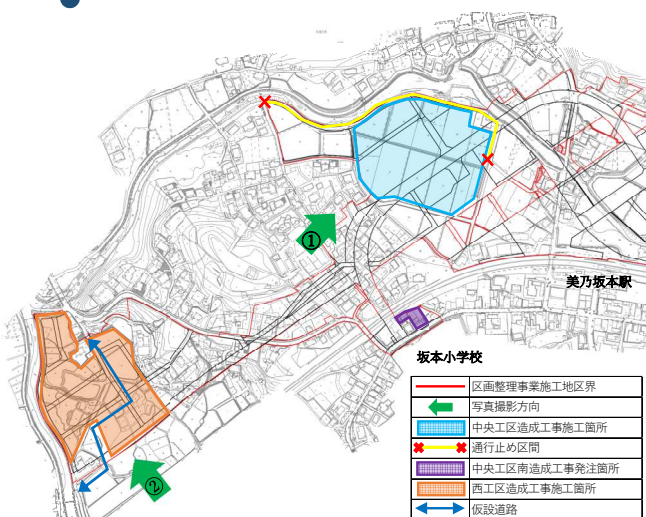

【工事状況概要図】

【状況写真 R6.2 月時点】



工事に関するご意見・お問い合わせ

リニア推進坂本事務所 区画整理課

住 所 中津川市千旦林 1197-10
(坂本事務所横)

電 話 0573-68-2130

担 当 松井、佐々木、曽我、今井

リニア岐阜県駅周辺 土地区画整理事業工事だより

2024 年
2 月
vol.23

お知らせ


現在、リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業の区域内では、造成・道路築造・排水路工事を進めています。

中央工区では、排水路工事のため、黄線で示す道路を通行止にしています。今後は、工事の進捗に伴い規制箇所を変更し、その都度、看板等で周知いたします。さらに工区の南側、坂本小学校前では、紫線で示す範囲の造成工事を発注し、順次工事を進めていきます。

また、西工区では、橙線で示す範囲の造成工事を進めており、道路新設工事のため、下図の青線で示す仮設道路を供用しています。

地域の皆様にはご不便おかけしますが、ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

工事状況等

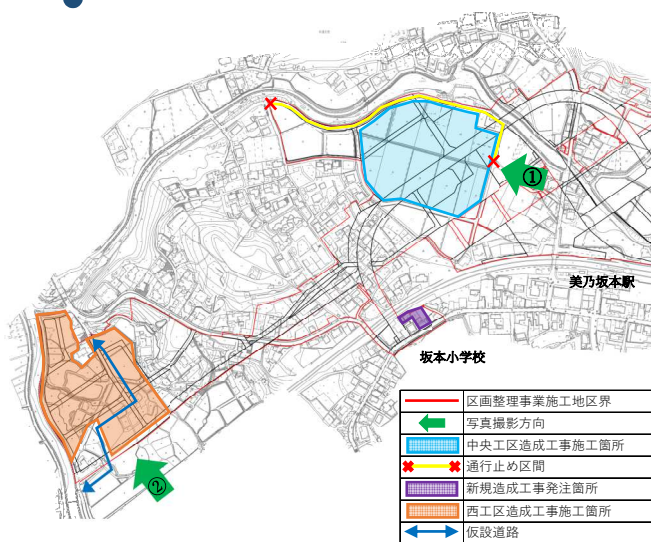

【工事状況概要図】

工事に関するご意見・お問い合わせ

リニア推進坂本事務所 区画整理課

住 所 中津川市千旦林 1197-10
(坂本事務所横)

電 話 0573-68-2130

担 当 松井、佐々木、曽我、今井

【状況写真 R6.1 月時点】



リニア岐阜県駅周辺 土地区画整理事業工事だより

2024 年
1 月
vol.22

お知らせ

現在、リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業の区域内では、中央工区にて造成・道路築造・排水路工事を進めており、東工区にて道路築造工事を進めています。中央工区では、下図の水色で示す範囲の造成工事と、紫線で示す道路築造工事（排水路工事含む）をおこなっています。

また、西工区では、橙線で示す範囲の造成工事を進めるとともに、下図の黄破線の現仮設道路を、青線で示す新設の仮設道路へと延長する工事を行っています。今後ともご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

工事状況等



【工事状況概要図】

工事に関するご意見・お問い合わせ

リニア推進坂本事務所 区画整理課

住 所 中津川市千旦林 1197-10
(坂本事務所横)

電 話 0573-68-2130

担 当 松井、佐々木、曽我、今井

【状況写真R5.12月時点】



リニア岐阜県駅周辺 土地区画整理事業工事だより

2023 年
12 月
vol.21


お知らせ

現在、リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業の区域内では、中央工区にて造成・道路築造・排水路工事を進めており、東工区にて道路築造工事を進めています。

また、西工区では、下図の現道から黄破線で示した仮設道路への切替工事が完了しました。現在は、黄破線から青線へとつながる仮設道路の切替工事を行っています。

今後ともご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

工事状況等

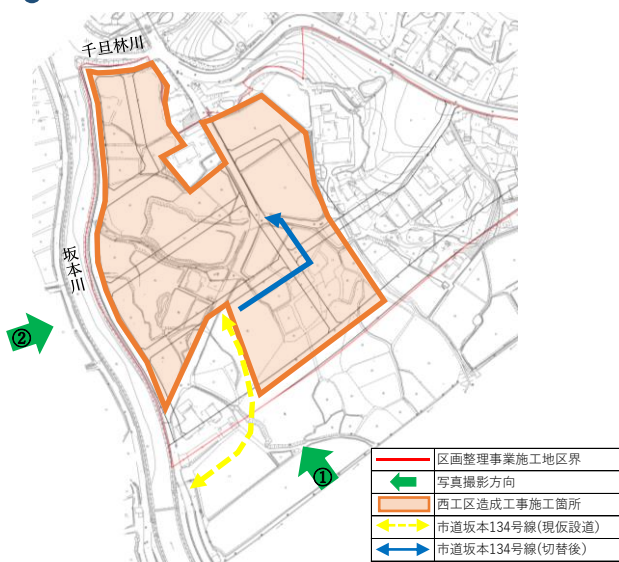

【西工区造成工事】

工事に関するご意見・お問い合わせ

リニア推進坂本事務所 区画整理課

住 所 中津川市千旦林 1197-10
(坂本事務所横)

電 話 0573-68-2130

担 当 松井、佐々木、曾我、今井

【状況写真R5.11月時点】



リニア岐阜県駅周辺 土地区画整理事業工事だより


2023 年
11 月
vol.20

お知らせ

現在、リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業の区域内では、中央工区にて造成・道路築造・排水路工事を進めており、東工区にて進めておりましたリニア岐阜県駅停車場線の橋台工事は、10月末をもって完了しました。

また、西工区では、9月上旬から、下図のオレンジ線で示した箇所にて建設発生土を受入れ造成工事を進め、現在は、新しい道路をつくるため、下図の黄線で示した仮設道路の建設工事を行っており、11月上旬には切替を計画しています。今後ともご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

工事状況等

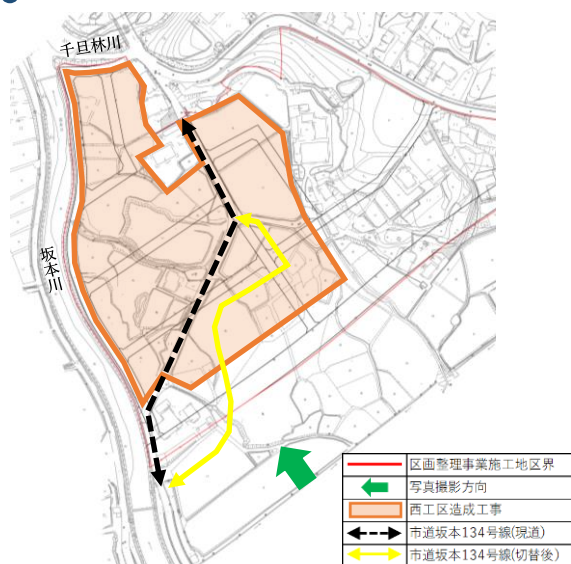

【西工区造成工事】

工事に関するご意見・お問い合わせ

リニア推進坂本事務所 区画整理課

住 所 中津川市千旦林 1197-10
(坂本事務所横)

電 話 0573-68-2130

担 当 松井、佐々木、曾我、今井

【状況写真 R5.9 月時点】



【状況写真 R5.10 月時点】



リニア岐阜県駅周辺 土地区画整理事業工事だより

2023 年
10 月
vol.19


お知らせ

現在、リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業の区域内では、中央工区にて造成・道路築造・排水路工事を進め、東工区にてリニア岐阜県駅停車場線の橋台工事を進めています。

西工区では、9月上旬から、下図のオレンジ線で示した箇所に建設発生土を受入れ造成工事を進めています。今後は、新しい道路をつくるために、仮設道路への切替工事を行うことを予定しています。

今後ともご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

工事状況等

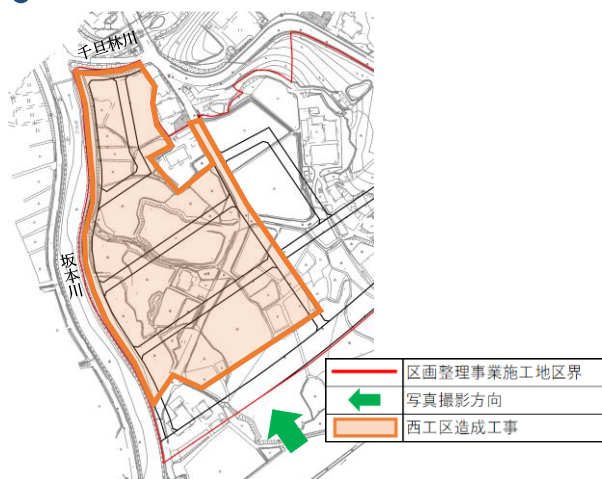

【西工区造成工事】

【状況写真 R5.8 月時点】



【状況写真 R5.9 月時点】



工事に関するご意見・お問い合わせ

リニア推進坂本事務所 区画整理課

住 所 中津川市千旦林 1197-10
(坂本事務所横)

電 話 0573-68-2130

担 当 松井、佐々木、曾我、今井

リニア岐阜県駅周辺 土地区画整理事業工事だより

2023 年
9 月
vol.18


お知らせ

現在、リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業の区域内では、中央工区にて造成・道路築造・排水路工事を進め、東工区にてリニア岐阜県駅停車場線の橋台工事を進めています。

西工区では、草刈り及び表土はぎを行い9月上旬から下図のオレンジ線で示した箇所にて建設発生土を受入れ造成工事を進めていく予定です。

今後ともご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

工事状況等

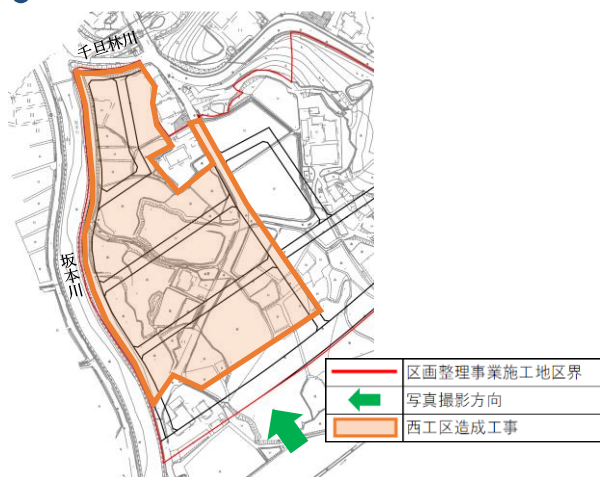

【西工区造成工事】

工事に関するご意見・お問い合わせ

リニア推進坂本事務所 区画整理課

住 所 中津川市千旦林 1197-10
(坂本事務所横)

電 話 0573-68-2130

担 当 松井、佐々木、曾我、今井

【状況写真 R5.7月時点】



↓ 草刈り及び表土はぎ後

【状況写真 R5.8月時点】



リニア岐阜県駅周辺 土地区画整理事業工事だより

2023 年
8 月
vol.17

お知らせ

リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業の区域内では、令和4年4月から、盛土工事を始め約48,000m³の建設発生土を受け入れました。

現在、中央地区、東地区全体の造成・道路築造・排水路工事を進めています。

7月下旬からは、下図のオレンジ線で示した西地区の造成工事に着手し、草刈り等の準備工を進めていく予定です。


また、橋台工事に関しては、右岸側の橋台工事が完了し、左岸側の橋台工事を進めています。今後ともご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

工事状況等


【西地区造成工事】



【橋台工事】

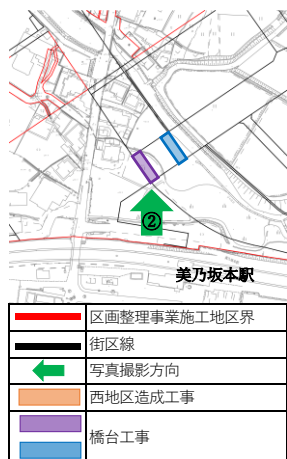

【状況写真 R5.7月時点】

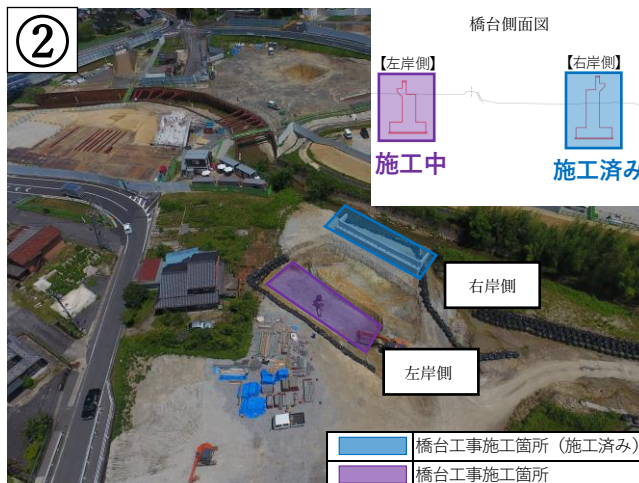

工事に関するご意見・お問い合わせ

リニア推進坂本事務所 区画整理課

住 所 中津川市千旦林 1197-10
(坂本事務所横)

電 話 0573-68-2130

担 当 松井、佐々木、菅我、今井

リニア岐阜県駅周辺 土地区画整理事業工事だより

2023 年
7 月
vol.16

お知らせ


リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業の区域内では、令和4年4月から、盛土工事を始め約47,000m³の建設発生土を受け入れました。

現在、下図の青線で囲まれた中央地区全体の造成・道路築造・排水路工事及び、紫線で示したリニア岐阜県駅停車場線の橋台工事を並行して進めています。

東地区に関しては、7月中旬ごろに市道の切替工事が完了し、ピンク線で示した区域周辺の造成・道路築造工事を進めていく予定です。

今後ともご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

工事状況等

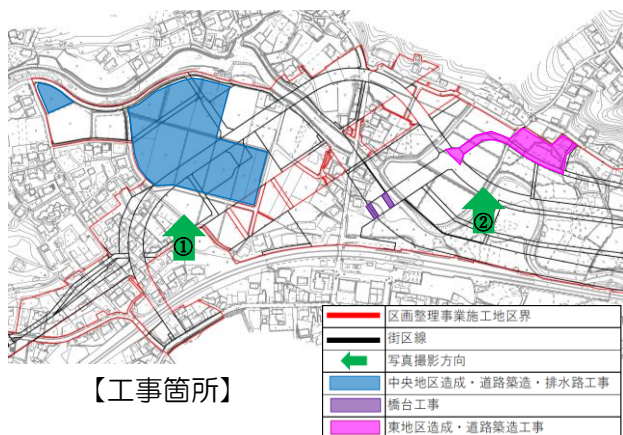

【状況写真 R5.6 月時点】



工事に関するご意見・お問い合わせ

リニア推進坂本事務所 区画整理課

住 所 中津川市千旦林 1197-10
(坂本事務所横)

電 話 0573-68-2130

担 当 松井、佐々木、曾我、今井

リニア岐阜県駅周辺 土地区画整理事業工事だより

2023 年
6 月
vol.15

お知らせ

リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業の区域内では、令和4年4月から、盛土工事を始め約44,000m³の建設発生土を受け入れました。

現在、下図の青線で囲まれた中央地区全体の造成工事及び、紫線で示したリニア岐阜県駅停車場線の橋台工事を並行して進めています。

6月以降は中央地区の造成・道路築造・排水路工事及び橋台工事を進めていく予定です。今後ともご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

工事状況等



【工事箇所】

工事に関するご意見・お問い合わせ

リニア推進坂本事務所 区画整理課

住 所 中津川市千旦林 1197-10
(坂本事務所横)

電 話 0573-68-2130

担 当 松井、佐々木、菅我、今井

【状況写真 R5.5 月時点】



リニア岐阜県駅周辺 土地区画整理事業工事だより

2023 年
5 月
vol.14


お知らせ

リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業の区域内では、令和4年4月から、盛土工事を始め約41,000m³の建設発生土を受け入れました。

現在、下図の赤線で囲まれた区域中央地区全体の盛土工事及び、黄線で示したリニア岐阜県駅停車場線の橋台工事を並行して進めています。

5月以降も引き続き、中央地区の盛土工事及び橋台工事を進めていく予定です。今後ともご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

工事状況等

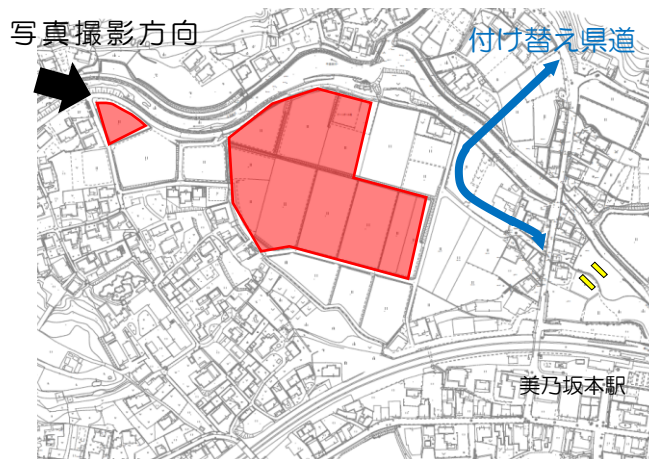

【工事箇所】

工事に関するご意見・お問い合わせ

リニア推進坂本事務所 区画整理課

住 所 中津川市千旦林 1197-10
(坂本事務所横)

電 話 0573-68-2130

担 当 松井、佐々木、曾我、今井

【状況写真 R5.3 月時点】



【状況写真 R5.4 月時点】



リニア岐阜県駅周辺 土地区画整理事業工事だより

2023 年
4 月
vol.13


お知らせ

リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業の区域内では、令和4年4月から、盛土工事を始め約 37,000m³ の建設発生土を受け入れました。

現在、下図の赤線で囲まれた区域中央地区全体の盛土工事及び、東地区の造成工事、黄線で示したリニア岐阜県駅停車場線の橋台工事を並行して進めています。

また、3 月末をもちまして、緑線で示した旧中津川グランドホテルの本体解体工事が完了いたします。今後ともご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

工事状況等

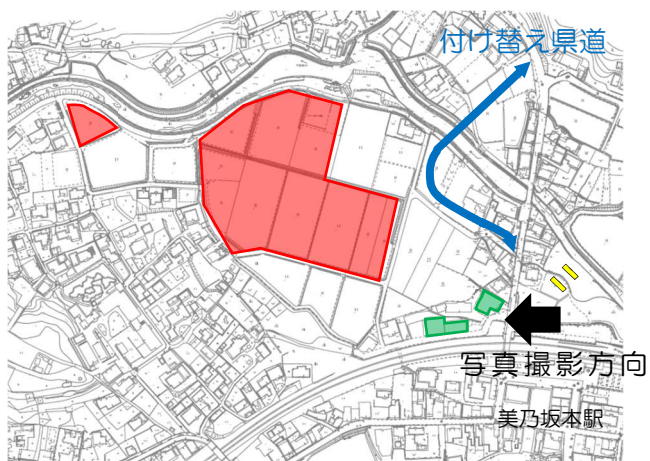

【工事箇所】

【状況写真 R5.2 月時点】



【状況写真 R5.3 月時点】



工事に関するご意見・お問い合わせ

リニア推進坂本事務所 区画整理課

住 所 中津川市千旦林 1197-10
(坂本事務所横)

電 話 0573-68-2130

担 当 仲神、松井、曾我、今井
