

濃飛横断自動車道事業

茄子川地内工事だより

2024年

3月

vol.19

お知らせ


濃飛横断自動車道（中津川工区）事業は、令和2年度より茄子川地内で橋梁下部工工事に着手いたしました。

茄子川地内では、今年度までに橋梁下部工・上部工工事、第二野田川の付替え工事を進めてまいりました。

この度、新たに3本の工事（橋梁下部工等）に着手いたしました。工事に伴い資材の運搬を予定しておりますので、交通マナーや交通ルールを守り運搬して参ります。ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

工事状況等

【工事箇所】

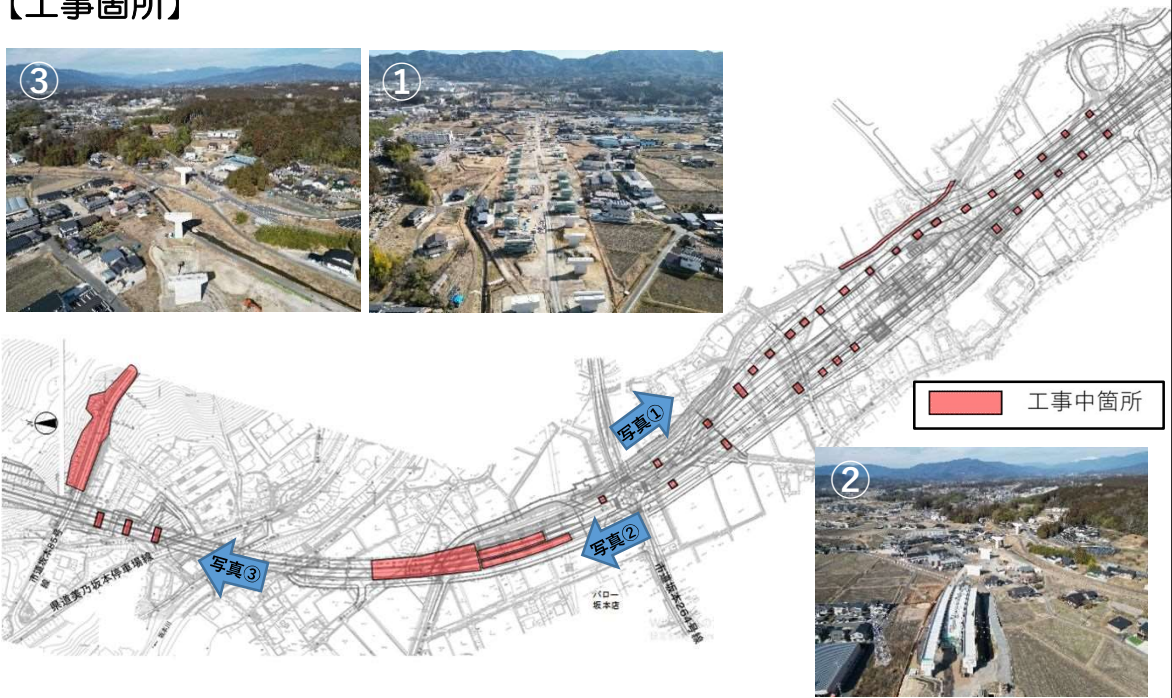

【工事概要】

受注者	主な工種	完成目途	3月主な作業	2月末進捗率	備考
(株)中島工務店	橋梁下部工	R6.3末	工事完了	100%	
(株)安部日鋼工業	橋梁上部工	R6.7末	橋面工	98%	
昭和コンクリート工業(株)	橋梁上部工	R6.5末	橋面工	80%	
(株)吉川工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	91%	
(株)加地工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	90%	
(株)岡山工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	99%	
宮島建設(株)	橋梁下部工 野田川付替工	R6.3末	橋脚工、野田川付替工	98%	
(株)鳴海組	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工・雑工	97%	
(株)中島工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	90%	
角藤・篠田JV	橋梁上部工	R7.3末	仮設工	5%	新規
(株)中島工務店	橋梁下部工	R7.3末	橋脚工・橋台工	3%	新規
(株)加地工務店	道路改良	R7.3末	道路改良工	5%	新規

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課
 担 当：中村、土田、渡邊、柳田
 電 話：0573-26-1111(内線：233・234・236)

濃飛横断自動車道安全協議会
 代表者：早川（岡山工務店）、林（宮島建設）
 電 話：090-9195-0308（早川）
 090-2261-9675（林）

濃飛横断自動車道事業 茄子川地内工事だより

2024年
2
vol.18

お知らせ


濃飛横断自動車道（中津川工区）事業は、令和2年度より茄子川地内で橋梁下部工工事に着手いたしました。令和4年度末には橋梁下部工が27基完成し、令和5年度からは新たに32基の橋梁下部工工事、上部工工事、第二野田川の付け替え工事に着手しています。

2月は主に橋脚工事・上部工工事、第二野田川の付け替え工事を行います。また、資材の運搬の実施を予定しておりますので、運搬の際には交通マナー、交通ルールに留意して参ります。

ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

工事状況等

【工事箇所】

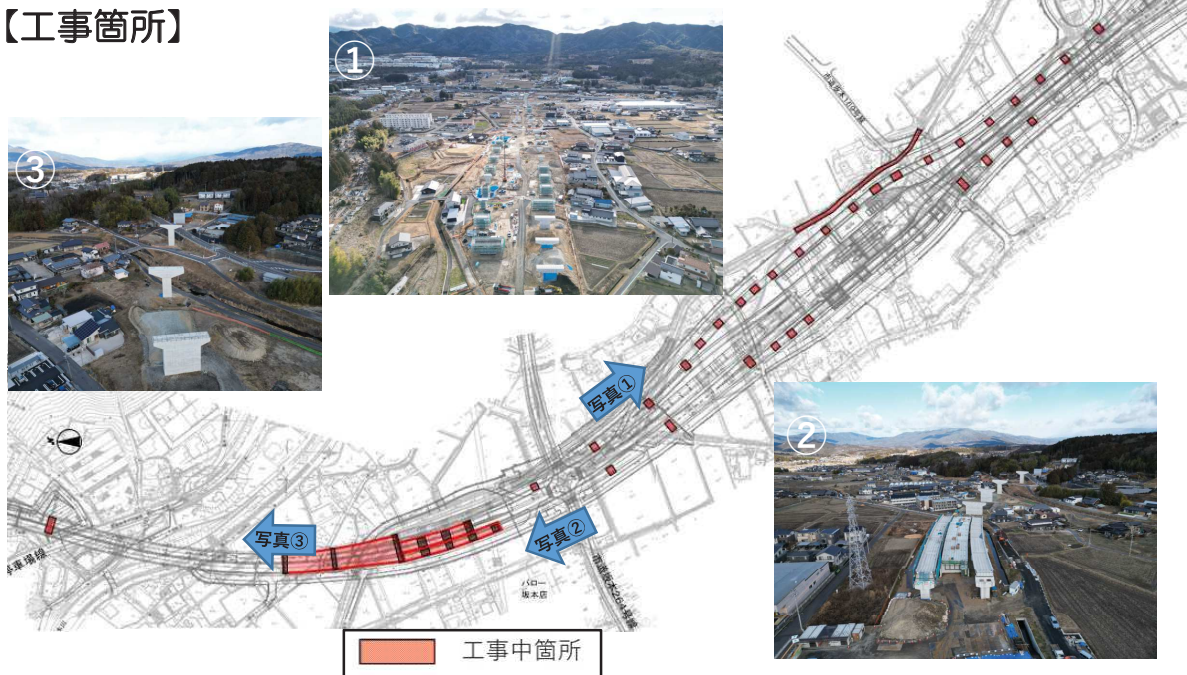

【工事概要】

受注者	主な工種	完成目途	2月主な作業	1月末進捗率	備考
(株)中島工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工、仮設工	93%	
(株)安部日鋼工業	橋梁上部工	R6.7末	橋面工	98%	
昭和ソノト工業(株)	橋梁上部工	R6.5末	橋面工	77%	
(株)吉川工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	89%	
(株)加地工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	80%	
(株)岡山工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	96%	
宮島建設(株)	橋梁下部工 野田川付替工	R6.3末	橋脚工、野田川付替工	87%	
(株)鳴海組	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工・雑工	92%	
(株)中島工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	87%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課

担 当：中村、土田、渡邊、柳田

電 話：0573-26-1111(内線：233・234・236)

濃飛横断自動車道安全協議会

代表者：早川（岡山工務店）、林（宮島建設）

電 話：090-9195-0308(早川)

濃飛横断自動車道事業 茄子川地内工事だより

2024年
1
vol.17

お知らせ


濃飛横断自動車道（中津川工区）事業は、令和2年度より茄子川地内で橋梁下部工工事に着手いたしました。令和4年度末には橋梁下部工が27基完成し、令和5年度からは新たに32基の橋梁下部工工事、上部工工事、第二野田川の付け替え工事に着手しています。

1月は主に橋脚工事・上部工工事、第二野田川の付け替え工事を行います。
また、資材の運搬の実施を予定しておりますので、運搬の際には交通マナー、交通ルールに留意して参ります。

ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

工事状況等

【工事箇所】

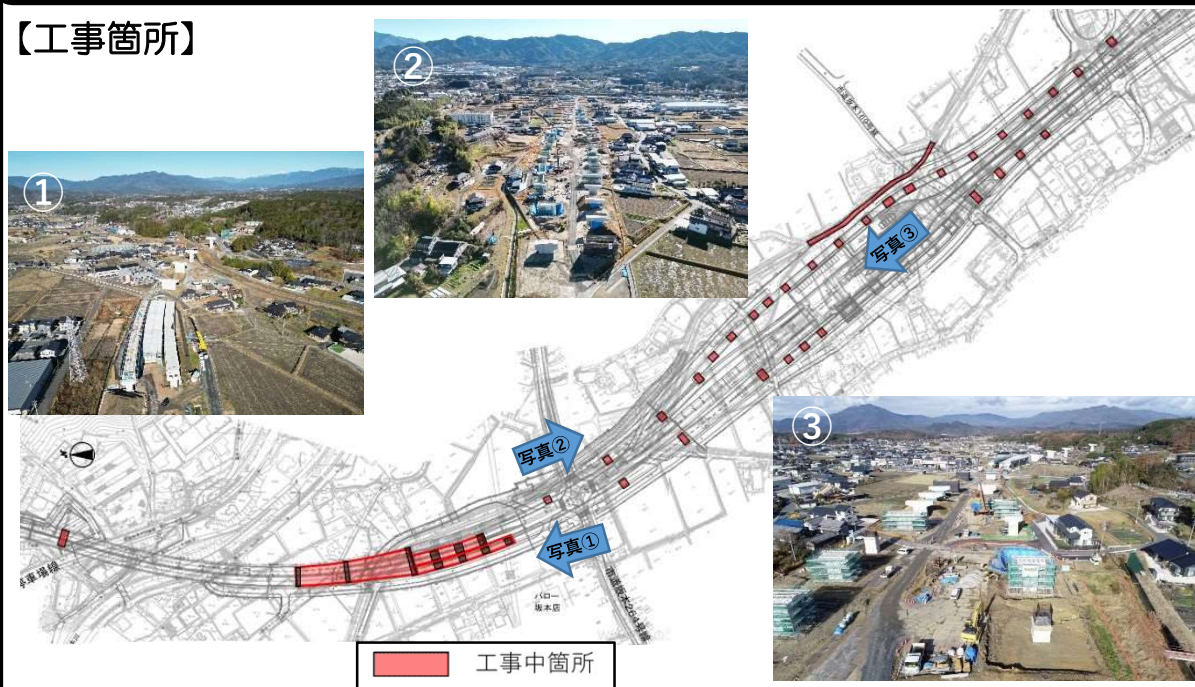

【工事概要】

受注者	主な工種	完成目途	1月主な作業	12月末進捗率	備考
(株)中島工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工、土工	87%	
(株)安部日鋼工業	橋梁上部工	R6.7末	橋面工	97%	
昭和ソクリト工業(株)	橋梁上部工	R6.5末	橋面工	74%	
(株)吉川工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	85%	
(株)加地工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	70%	
(株)岡山工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	89%	
宮島建設(株)	橋梁下部工 野田川付替工	R6.3末	橋脚工、野田川付替工	74%	
(株)鳴海組	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	83%	
(株)中島工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	83%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課

担 当：中村、土田、渡邊、柳田

電 話：0573-26-1111(内線：233・234・236)

濃飛横断自動車道安全協議会

代表者：早川（岡山工務店）、林（宮島建設）

電 話：090-9195-0308(早川)

濃飛横断自動車道事業 茄子川地内工事だより

2023年
12
vol.16

お知らせ


濃飛横断自動車道（中津川工区）事業は、令和2年度より茄子川地内で橋梁下部工工事に着手いたしました。令和4年度末には橋梁下部工が27基完成し、令和5年度からは新たに32基の橋梁下部工工事、上部工工事、第二野田川の付け替え工事に着手しています。

12月は主に橋脚工事・上部工工事、第二野田川の付け替え工事を行います。また、資材の運搬の実施を予定しておりますので、運搬の際には交通マナー、交通ルールに留意して参ります。

ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

工事状況等

【工事箇所】

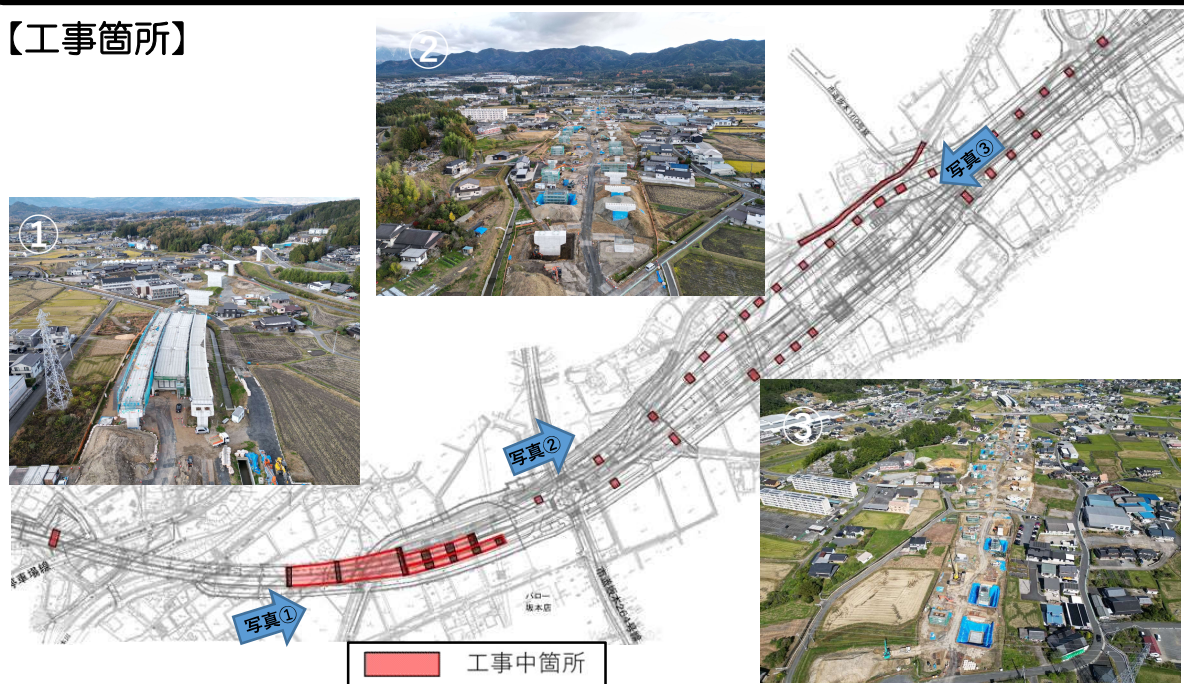

【工事概要】

受注者	主な工種	完成目途	12月主な作業	11月末進捗率	備考
(株)中島工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	70%	
(株)安部日鋼工業	橋梁上部工	R6.7末	主桁連結工	96%	
昭和ソクリト工業(株)	橋梁上部工	R6.5末	主桁連結工	69%	
(株)吉川工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	78%	
(株)加地工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	60%	
(株)岡山工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	80%	
宮島建設(株)	橋梁下部工 野田川付替工	R6.3末	橋脚工、野田川付替工	63%	
(株)鳴海組	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	72%	
(株)中島工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	74%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課

担 当：中村、土田、渡邊、柳田

電 話：0573-26-1111(内線：233・234・236)

濃飛横断自動車道安全協議会

代表者：早川（岡山工務店）、林（宮島建設）

電 話：090-9195-0308(早川)

濃飛横断自動車道事業 茄子川地内工事だより

2023年
11
vol.15

お知らせ


濃飛横断自動車道（中津川工区）事業は、令和2年度より茄子川地内で橋梁下部工工事に着手いたしました。令和4年度末には橋梁下部工が27基完成し、令和5年度からは新たに32基の橋梁下部工工事、上部工工事、第二野田川の付け替え工事に着手しています。

11月は主に橋脚工事・上部工工事、第二野田川の付け替え工事を行います。また、資材の運搬の実施を予定しておりますので、運搬の際には交通マナー、交通ルールに留意して参ります。

ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

工事状況等

【工事箇所】

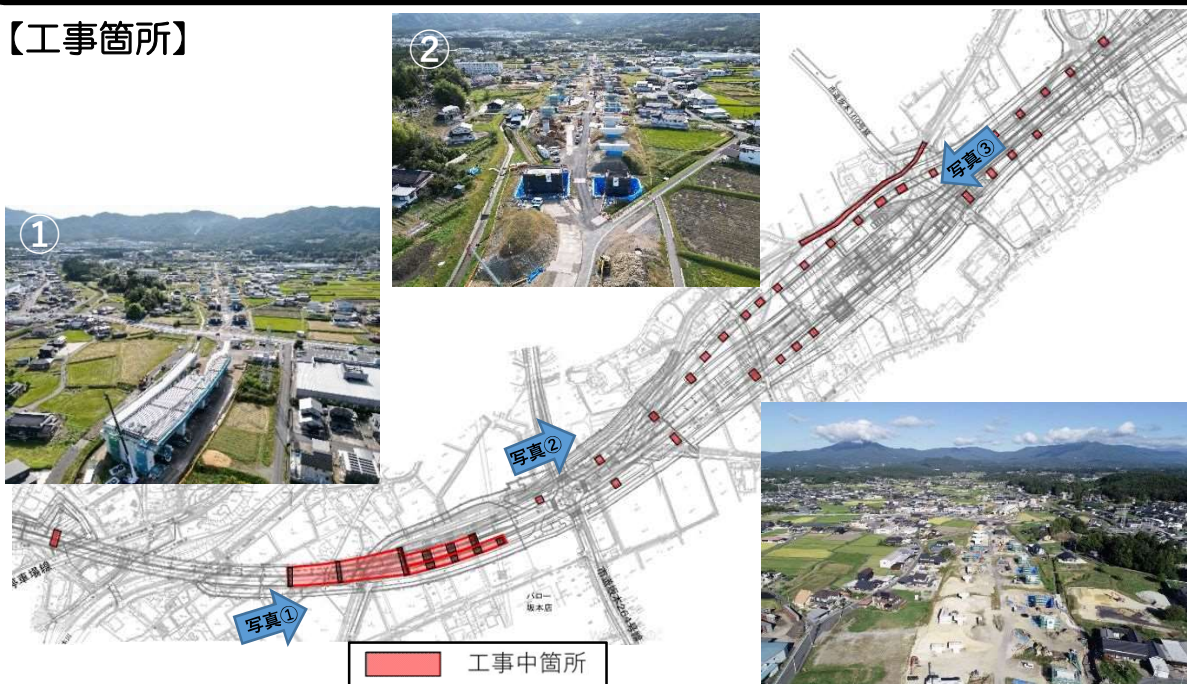

【工事概要】

受注者	主な工種	完成目途	11月主な作業	10月末進捗率	備考
(株)中島工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	37%	
(株)安部日鋼工業	橋梁上部工	R6.7末	主桁連結工	90%	
昭和ソクリト工業(株)	橋梁上部工	R6.5末	主桁連結工	65%	
(株)吉川工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	68%	
(株)加地工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	50%	
(株)岡山工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	67%	
宮島建設(株)	橋梁下部工 野田川付替工	R6.3末	橋脚工、野田川付替工	58%	
(株)鳴海組	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	65%	
(株)中島工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	52%	

※近日発生している大雨については、各現場内で適時処理しています。

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課

担 当：中村、土田、渡邊、柳田

電 話：0573-26-1111(内線：233・234・236)

濃飛横断自動車道安全協議会

代表者：早川（岡山工務店）、林（宮島建設）

電 話：090-9195-0308(早川)

濃飛横断自動車道事業 茄子川地内工事だより

2023年
10
vol.12

お知らせ 【お礼】9月の上部工架設見学会に多数ご来場頂き誠に有難うございました。


濃飛横断自動車道（中津川工区）事業は、令和2年度より茄子川地内で橋梁下部工工事に着手いたしました。令和4年度末には橋梁下部工が27基完成し、令和5年度からは新たに32基の橋梁下部工工事、上部工工事、第二野田川の付け替え工事に着手しています。

10月は主に橋脚工事・上部工工事、第二野田川の付け替え工事を行います。
また、資材の運搬の実施を予定しておりますので、運搬の際には交通マナー、交通ルールに留意して参ります。

ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

工事状況等

【工事箇所】

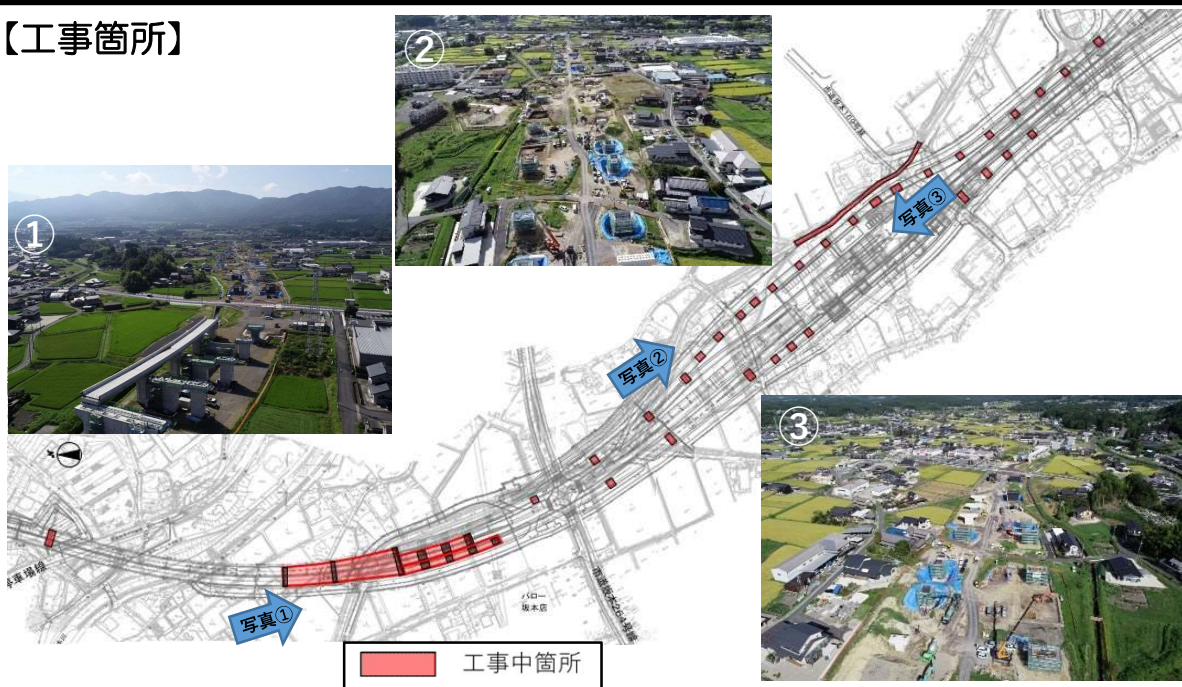

【工事概要】

受注者	主な工種	完成目途	10月主な作業	9月末進捗率	備考
(株)中島工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚土留工	23%	
(株)安部日鋼工業	橋梁上部工	R6.7末	主桁連結工	88%	
昭和ソクリト工業(株)	橋梁上部工	R6.5末	主桁連結工	60%	
(株)吉川工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	57%	
(株)加地工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	40%	
(株)岡山工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	56%	
宮島建設(株)	橋梁下部工 野田川付替工	R6.3末	橋脚工、野田川付替工	51%	
(株)鳴海組	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工、仮設工	50%	
(株)中島工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	40%	

※近日発生している大雨については、各現場内で適時処理しています。

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課
担 当：中村、土田、渡邊、柳田
電 話：0573-26-1111(内線：233・234・236)

濃飛横断自動車道安全協議会
代表者：早川（岡山工務店）、林（宮島建設）
電 話：090-9195-0308(早川)

濃飛横断自動車道事業 茄子川地内工事だより

2023年
9
vol.12

お知らせ


濃飛横断自動車道（中津川工区）事業は、令和2年度より茄子川地内で橋梁下部工工事に着手いたしました。令和4年度末には橋梁下部工が27基完成し、令和5年度からは新たに32基の橋梁下部工工事、上部工工事、第二野田川の付け替え工事に着手しています。

9月は主に橋脚工事・主桁架設工事、第二野田川の付け替え工事を行います。また、資材の運搬の実施を予定しておりますので、運搬の際には交通マナー、交通ルールに留意して参ります。

ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

工事状況等

【工事箇所】

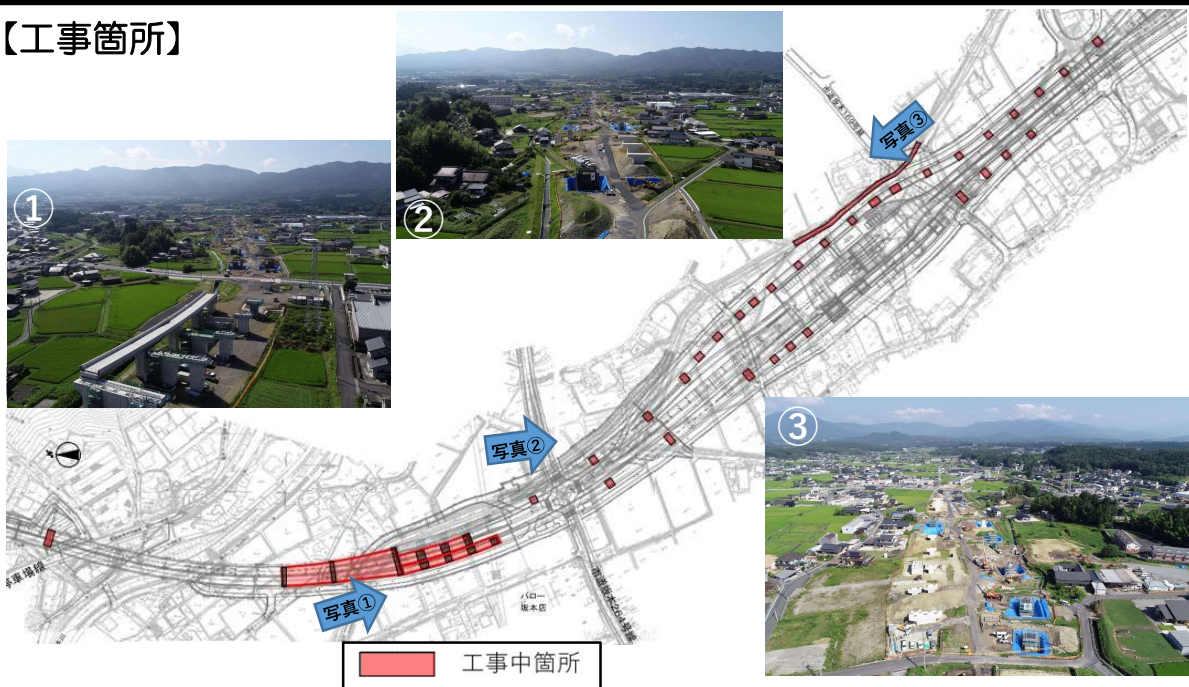

【工事概要】

受注者	主な工種	完成目途	9月主な作業	8月末進捗率	備考
(株)中島工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚掘削	15%	
(株)安部日鋼工業	橋梁上部工	R6.7末	主桁架設工	80%	
昭和ソクリト工業(株)	橋梁上部工	R6.5末	主桁架設工	40%	
(株)吉川工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	35%	
(株)加地工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	28%	
(株)岡山工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	40%	
宮島建設(株)	橋梁下部工 野田川付替工	R6.3末	橋脚工、野田川付替工	42%	
(株)鳴海組	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	35%	
(株)中島工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	23%	

※近日発生している大雨については、各現場内で適時処理しています。

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課

担 当：中村、土田、渡邊、柳田

電 話：0573-26-1111(内線：233・234・236)

濃飛横断自動車道安全協議会

代表者：早川（岡山工務店）、林（宮島建設）

電 話：090-9195-0308(早川)

濃飛横断自動車道事業 茄子川地内工事だより

2023年
8
v o l . 1 2


お知らせ

濃飛横断自動車道（中津川工区）事業は、令和2年度より茄子川地内で橋梁下部工工事に着手いたしました。令和4年度末には橋梁下部工が27基完成し、令和5年度からは新たに32基の橋梁下部工工事、上部工工事、第二野田川の付け替え工事に着手しています。

8月の主な作業は、橋脚の掘削・コンクリート打設工事、第二野田川の付け替え工事を行います。

工事状況等

【工事箇所】

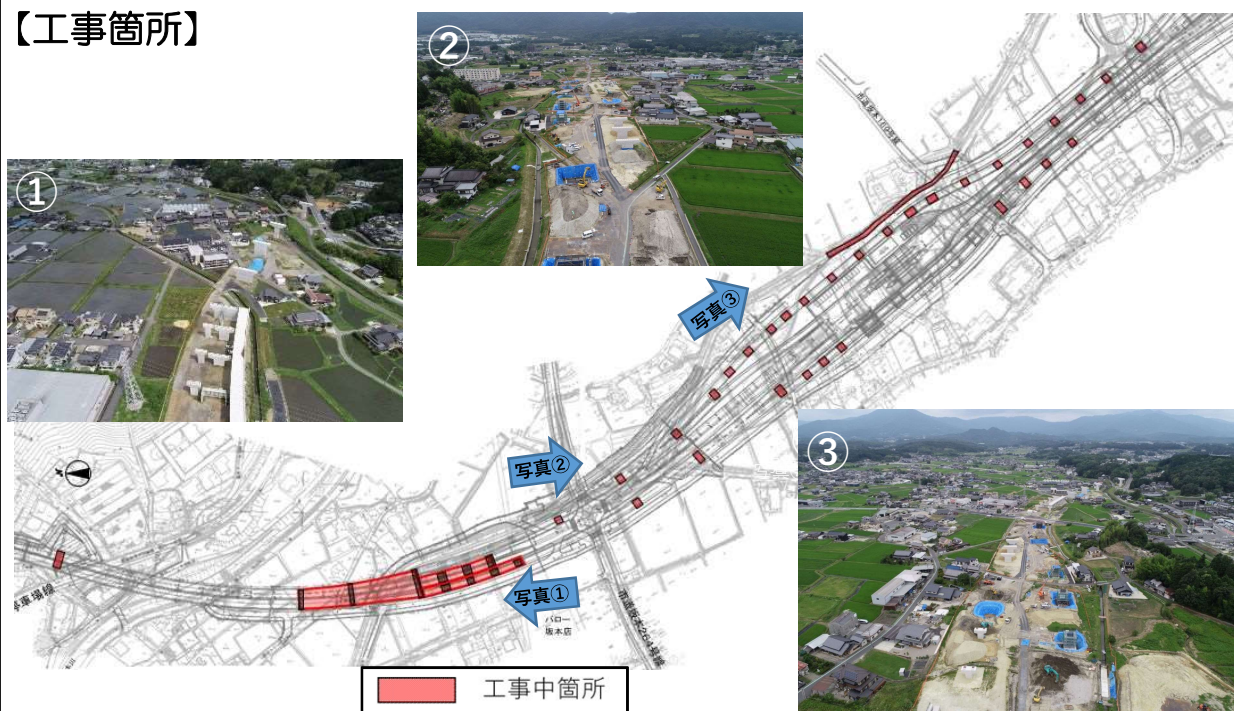

【工事概要】

受注者	工種	完成目途	8月主な作業	7月末進捗率	備考
(株)中島工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚掘削	10%	
(株)安部日鋼工業	橋梁上部工	R6.7末	工場製作工	33%	
昭和コンクリート工業(株)	橋梁上部工	R6.5末	工場製作工	31%	
(株)吉川工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	32%	
(株)加地工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	15%	
(株)岡山工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	25%	
宮島建設(株)	橋梁下部工 野田川付替工	R6.3末	橋脚工、野田川付替工	25%	
(株)鳴海組	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	24%	
(株)中島工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	20%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課

担 当：中村、土田、渡邊、柳田

電 話：0573-26-1111(内線：233・234・236)

濃飛横断自動車道安全協議会

代表者：早川（岡山工務店）、林（宮島建設）

電 話：090-9195-0308(早川)

090-2261-9675(林)

濃飛横断自動車道事業 茄子川地内工事だより

2023年
7
vol.11


お知らせ

濃飛横断自動車道（中津川工区）事業は、令和2年度より茄子川地内で橋梁下部工工事に着手いたしました。令和4年度末には橋梁下部工が27基完成し、令和5年度からは新たに32基の橋梁下部工工事、上部工事、第二野田川の付け替え工事に着手しています。

7月の主な作業は、橋脚の掘削工事、橋脚本体の工事、第二野田川付け替えの掘削工事を行います。

工事状況等

【工事箇所】

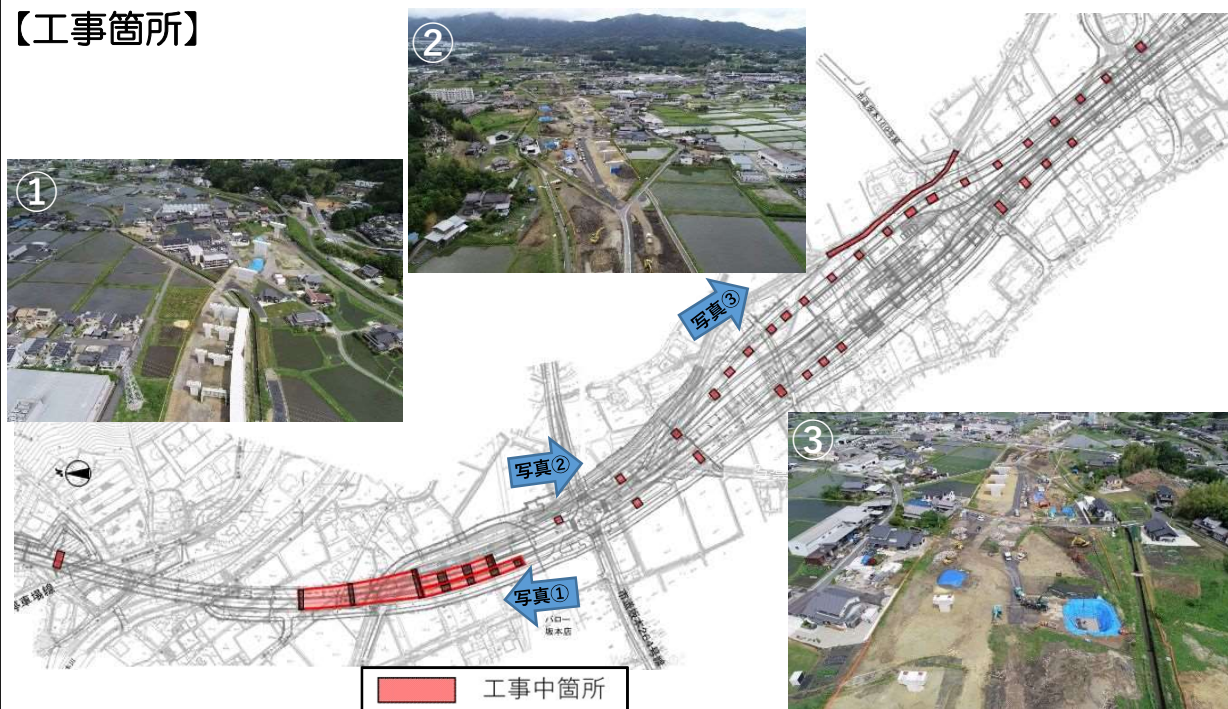

【工事概要】

受注者	工種	完成目途	7月主な作業	6月末進捗率	備考
(株)中島工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚掘削	10%	
(株)安部日鋼工業	橋梁上部工	R6.7末	工場製作工	23%	
昭和コンクリート工業(株)	橋梁上部工	R6.5末	工場製作工	13%	
(株)吉川工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	21%	
(株)加地工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工、仮設工事	10%	
(株)岡山工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工、仮設工事、野田川掘削	22%	
宮島建設(株)	橋梁下部工 野田川付替工	R6.3末	橋脚工、仮設工事	22%	
(株)鳴海組	橋梁下部工	R6.3末	橋脚掘削、橋脚工、仮設工事	17%	
(株)中島工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	15%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課

担 当：中村、土田、渡邊、柳田

電 話：0573-26-1111(内線：233・234・236)

濃飛横断自動車道安全協議会

代表者：早川（岡山工務店）、林（宮島建設）

電 話：090-9195-0308(早川)

090-2261-9675(林)

濃飛横断自動車道事業 茄子川地内工事だより

2023年
6
v o 1.10


お知らせ

濃飛横断自動車道（中津川工区）事業は、令和2年度より茄子川地内で橋梁下部工工事に着手いたしました。令和4年度末には橋梁下部工が27基完成し、令和5年度からは新たに32基の橋梁下部工工事、上部工工事、第二野田川の付け替え工事に着手しています。

6月の主な作業は、橋脚をつくるための掘削工事、仮設道路の工事を行います。

工事状況等

【工事箇所】

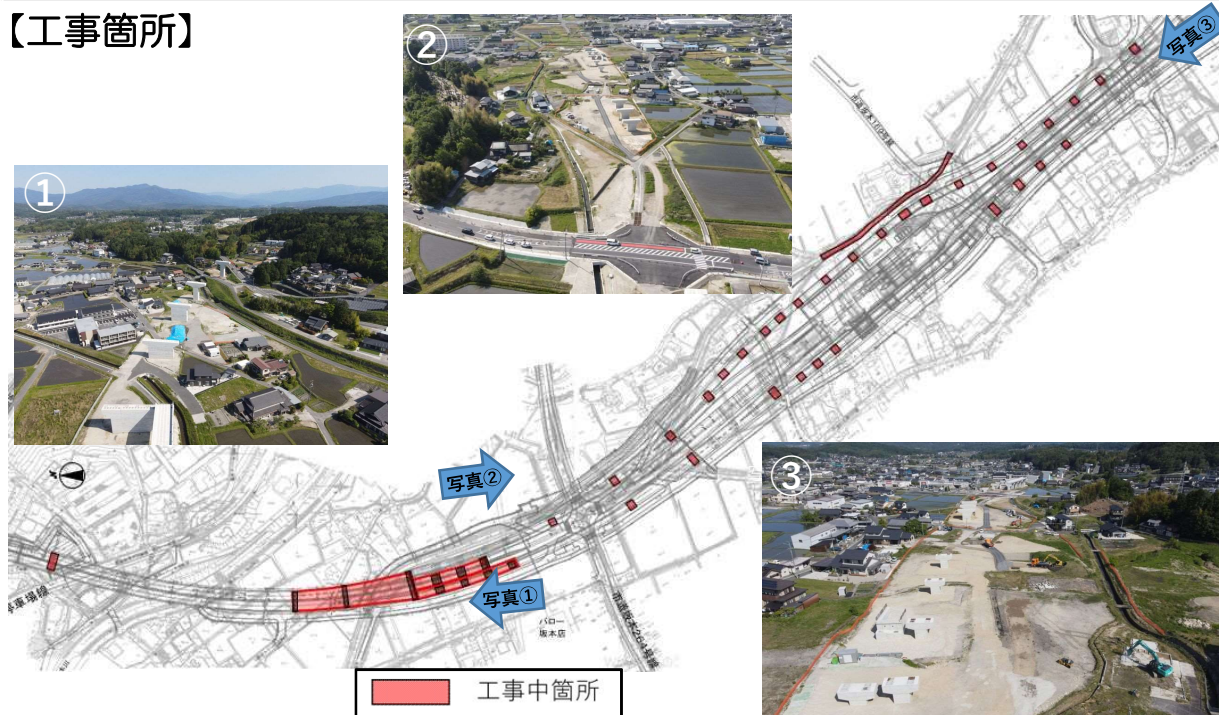

【工事概要】

受注者	工種	完成目途	6月主な作業	5月末進捗率	備考
(株)中島工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚掘削	13%	
(株)安部日鋼工業	橋梁上部工	R6.7末	工場製作工	18%	
昭和コンクリート工業(株)	橋梁上部工	R6.5末	工場製作工	10%	
(株)吉川工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚掘削	17%	
(株)加地工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚掘削、橋脚工、仮設工事	8%	
(株)岡山工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚掘削、橋脚工、仮設工事	15%	
宮島建設(株)	橋梁下部工 野田川付替工	R6.3末	橋脚掘削、橋脚工、仮設工事	14%	
(株)鳴海組	橋梁下部工	R6.3末	機械掘削、雑工、仮設工事	11%	
(株)中島工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚掘削、仮設工事	10%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課

担 当：中村、土田、渡邊、柳田

電 話：0573-26-1111(内線：233・234・236)

濃飛横断自動車道安全協議会

代表者：早川（岡山工務店）、林（宮島建設）

電 話：090-9195-0308(早川)、

090-2261-9675(林)

濃飛横断自動車道事業 茄子川地内工事だより

2023年
5月
vol.9


お知らせ

濃飛横断自動車道（中津川工区）事業は、令和2年度より茄子川地内で橋梁下部工工事に着手いたしました。令和5年3月末時点では橋梁下部工が27基完成しました。

令和5年度より新たに32基の橋梁下部工工事に着手します。受注者等の概要は下記のとおりとなります。本年度もご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

工事状況等

【工事箇所】

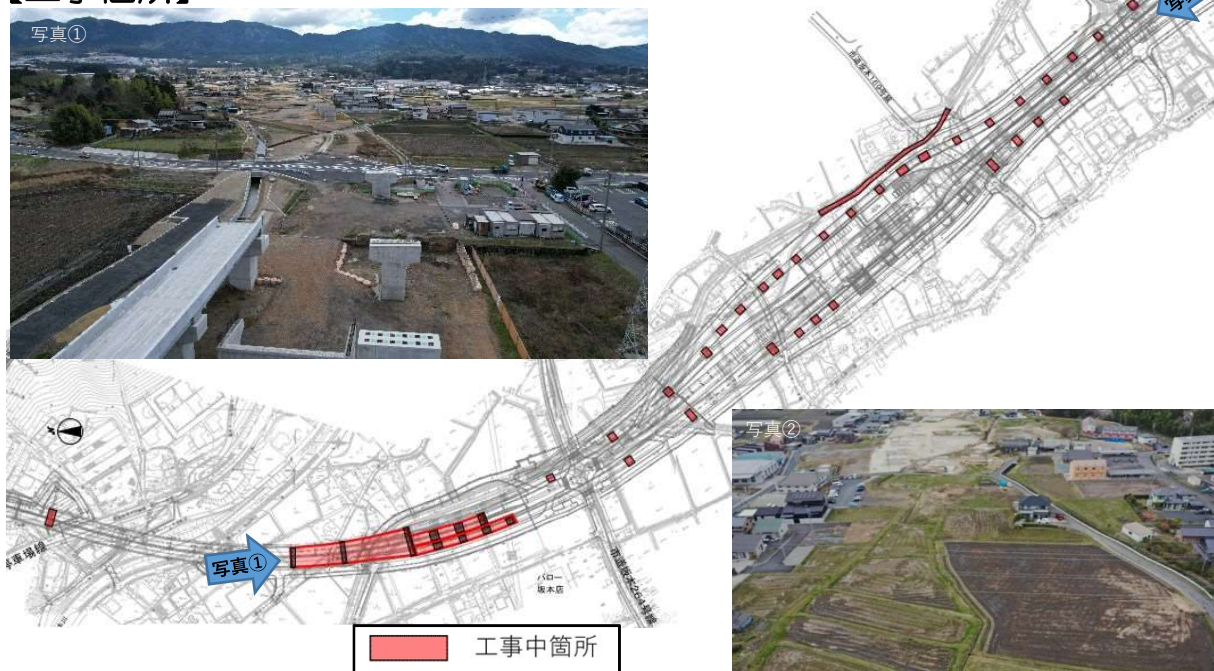

【工事概要】

受注者	工種	完成目途	5月主な作業	5月末進捗率	備考
(株)中島工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚掘削、仮設工事	11%	
(株)安部日鋼工業	橋梁上部工	R6.7末	測量、仮設工事	5%	
昭和3ツクリ工業(株)	橋梁上部工	R6.5末	測量、仮設工事	5%	
吉川工務店(株)	橋梁下部工	R6.3末	橋脚掘削、仮設工事	5%	
(株)加地工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚掘削、仮設工事	5%	
(株)岡山工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚掘削、仮設工事	7%	
宮島建設(株)	橋梁下部工 水路付替工	R6.3末	橋脚掘削、仮設工事	5%	
(株)鳴海組	橋梁下部工	R6.3末	構造物取壊、仮設工事	2%	
(株)中島工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚掘削、仮設工事	5%	
篠田角藤JV	橋梁上部工	R7.3末	測量、仮設工事	0%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課

担 当：中村、土田、渡邊、柳田

電 話：0573-26-1111(内線：233・234・236)

濃飛横断自動車道安全協議会

代表者：早川（岡山工務店）、林（宮島建設）

電 話：090-9195-0308、

090-2261-9675

濃飛横断自動車道事業 茄子川地内工事だより

2023年
4月
vol.8


お知らせ

濃飛横断自動車道（中津川工区）事業は、令和2年度より茄子川地内で橋梁下部工工事に着手いたしました。令和5年3月末時点では橋梁下部工が27基完成しました。

次期工事として新たに37基の橋梁下部工工事に着手します。業者名等の詳細工事概要は5月号でお知らせしますので、引き続きのご理解ご協力をお願いいたします。

工事状況等

【工事箇所】

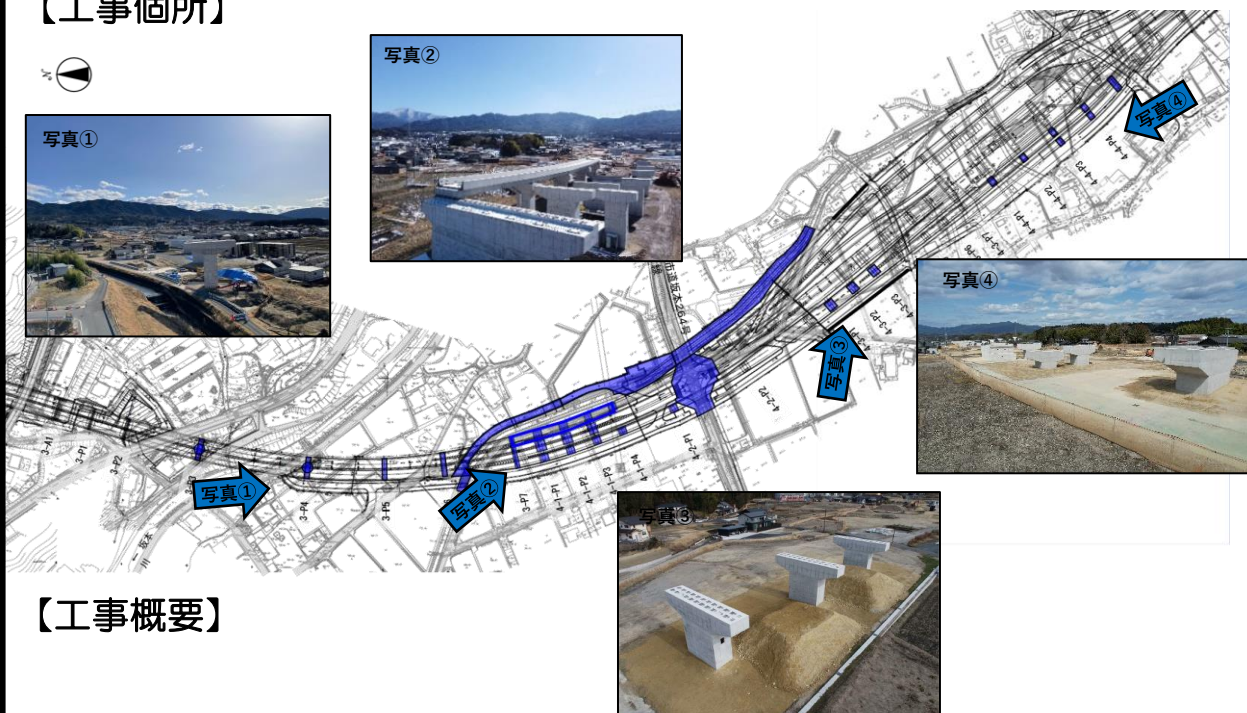

【工事概要】

業 者 名	主な工種	完成目途	3月末進捗状況	備 考
(株) 加地工務店	橋梁下部工	R5.3末	100%	
(株) 古川建材工業	道路改良	R5.3末	100%	
(株) 鳴海組	橋梁下部工	R5.3末	100%	
(株) 吉川工務店	橋梁下部工	R5.3末	100%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課

担 当：瀬瀬、中村、北川、古宮山

電 話：0573-26-1111(内線：234・235)
