

リニア岐阜県駅周辺 土地区画整理事業工事だより

2025 年
3 月
vol.36

お知らせ

現在、リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業の区域内では、造成・道路工事・排水路工事を進めています。



西工区では、黄線で示す将来形道路築造のため、伐採などの準備工を行っています。

東工区では、赤線で示す補強土壁工事を行うとともに周辺の造成を行っています。

地域の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

工事状況等

【状況写真 R7.2 月時点】

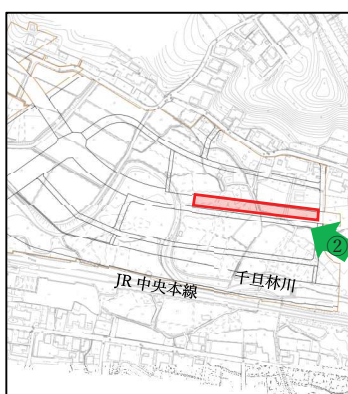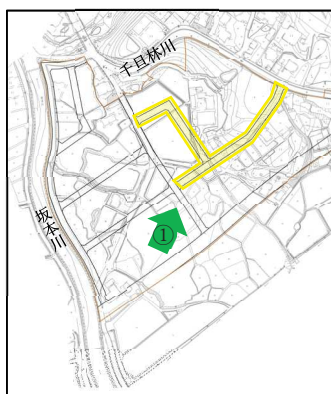

	区画整理事業施工地区界		西工区道路工事箇所
	写真撮影方向		補強土壁工事箇所



工事に関するご意見・お問い合わせ

リニア推進坂本事務所 区画整理課

住 所 中津川市千旦林 1197-10
(坂本事務所横)

電 話 0573-68-2130

担 当 松井、佐々木、曽我、今井

リニア岐阜県駅周辺 土地区画整理事業工事だより

2025 年
2 月
vol.35

お知らせ


現在、リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業の区域内では、造成・道路工事・排水路工事を進めています。

西工区では、青線で示す範囲のアスファルト舗装を行い、仮設道路から将来形道路への通行の切替を行いました。（写真①）


中央工区では、区画道路と都市計画道路（中洗井線）を立体交差させるための「ボックスカルバート」と呼ばれる箱型のトンネルを作る工事を 1 月末に発注しましたので、今後着手してまいります。地域の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

工事状況等

【西工区】

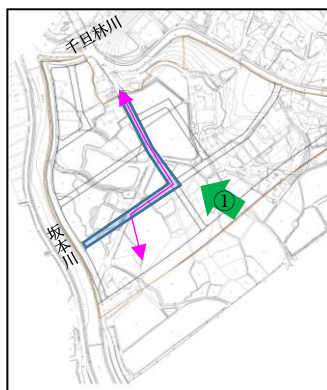


【中央工区】

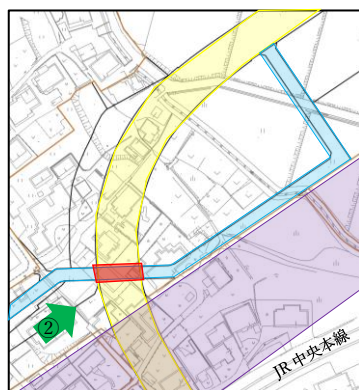

区画整理事業施工地区界	ボックスカルバート施工箇所
写真撮影方向	区画道路
西工区アスファルト舗装箇所	都市計画道路（中洗井線）
切替後通行ルート	リニア岐阜県駅

【状況写真 R7.1 月時点】

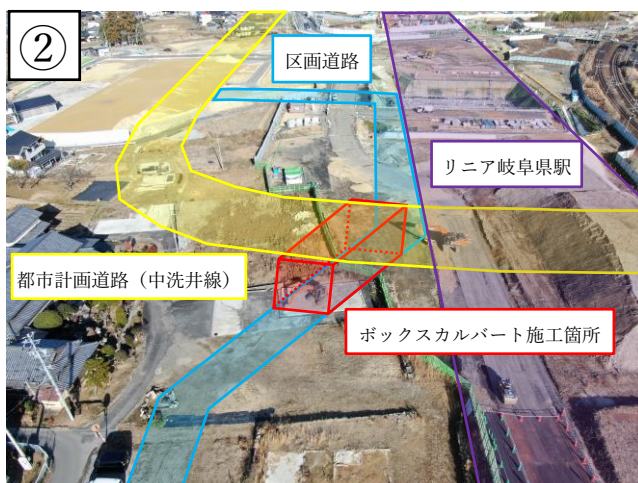

工事に関するご意見・お問い合わせ

リニア推進坂本事務所 区画整理課

住 所 中津川市千旦林 1197-10
(坂本事務所横)

電 話 0573-68-2130

担 当 松井、佐々木、曽我、今井

リニア岐阜県駅周辺 土地区画整理事業工事だより

2025 年
1 月
vol.34

お知らせ

現在、リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業の区域内では、造成・道路工事・排水路工事を進めています。

西工区では、青線で示す範囲のアスファルト舗装を 12 月末に行います。

舗装工事完了後、仮設道路から将来形道路への通行の切替を予定しています。（写真①）

東工区では、赤線で示す補強土壁工事を進めています。（写真②）

地域の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

工事状況等

【西工区】



【東工区】



区画整理事業施工地区界	西工区アスファルト舗装箇所
写真撮影方向	切替後通行ルート
	補強土壁工事施工箇所

【状況写真 R6.12 月時点】



工事に関するご意見・お問い合わせ

リニア推進坂本事務所 区画整理課

住 所 中津川市千旦林 1197-10
(坂本事務所横)

電 話 0573-68-2130

担 当 松井、佐々木、曽我、今井

リニア岐阜県駅周辺 土地区画整理事業工事だより

2024 年
12 月
vol.33

お知らせ

現在、リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業の区域内では、造成・道路工事・排水路工事を進めています。


西工区では、黄線で示す範囲の道路工事を 11 月末に発注しましたので、今後、伐採などの準備工に着手してまいります。（写真①）

東工区では、赤線で示す補強土壁工事を進めており、青線で示す道路切替工事は 12 月ごろの完成を予定しています。（写真②）


地域の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

工事状況等

【西工区】

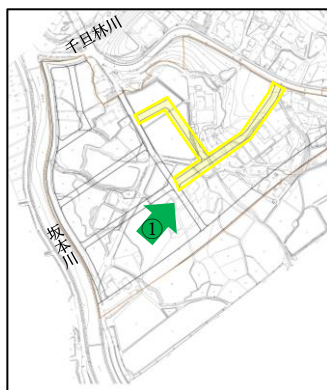

【東工区】

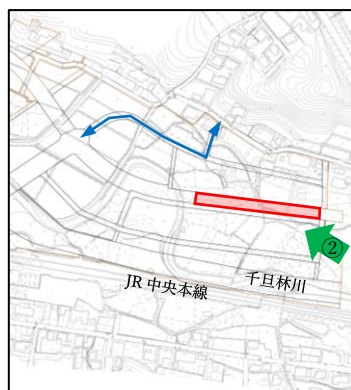

区画整理事業施工地区界	西工区道路工事発注箇所
写真撮影方向	補強土壁工事施工箇所
	道路切替工事施工箇所

【状況写真 R6.11 月時点】



工事に関するご意見・お問い合わせ

リニア推進坂本事務所 区画整理課

住 所 中津川市千旦林 1197-10
(坂本事務所横)

電 話 0573-68-2130

担 当 松井、佐々木、曽我、今井

リニア岐阜県駅周辺 土地区画整理事業工事だより

2024 年
11 月
vol.32

お知らせ

現在、リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業の区域内では、造成・道路工事・排水路工事を進めています。


東工区では、赤線で示す補強土壁工事（写真①）の他、道路切替工事を進めています。切替工事に伴い、下記道路において車両通行止めを行っています。（写真②）

車両通行止めの期間は、12月上旬までを予定しています。

切替工事の完了後は、青線で示すルートに道路が切り替わります。

地域の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

工事状況等

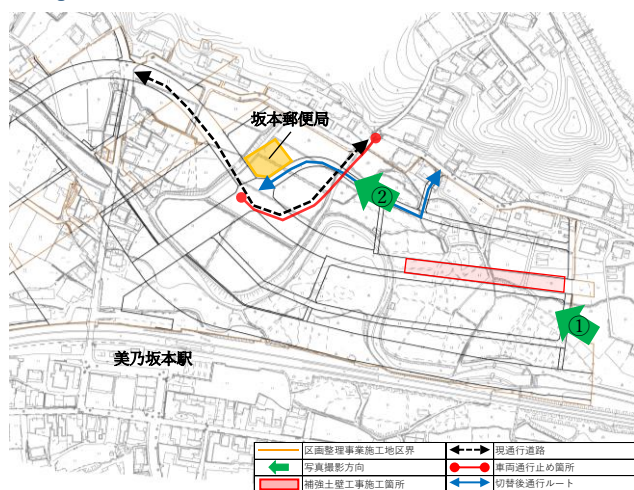

【工事状況概要図】

工事に関するご意見・お問い合わせ

リニア推進坂本事務所 区画整理課

住 所 中津川市千旦林 1197-10
(坂本事務所横)

電 話 0573-68-2130

担 当 松井、佐々木、曽我、今井

【状況写真 R6.10月時点】



リニア岐阜県駅周辺 土地区画整理事業工事だより

2024 年
10 月
vol.31

お知らせ

現在、リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業の区域内では、造成・道路工事・排水路工事を進めています。東工区では、赤線で示す補強土壁工事（写真①）の他、道路切替工事を進めています。切替工事に伴い、下記道路において車両通行止めを行います。（写真②）

車両通行止めの期間は、10月下旬から12月上旬までの約1か月半を予定しています。


（工事工程により期間が変更になる場合があります。その際は現地看板にて周知いたします。）

歩行者については、歩行者用通路を確保しますので通行可能となります。

切替工事の完了後は、青線で示すルートに道路が切り替わります。

地域の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

工事状況等

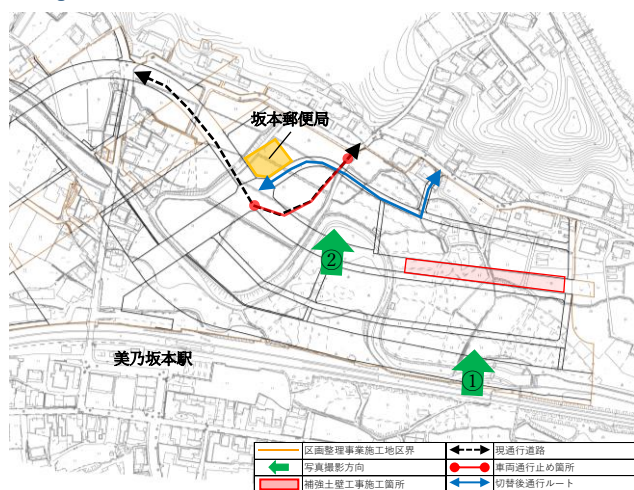

【工事状況概要図】

工事に関するご意見・お問い合わせ

リニア推進坂本事務所 区画整理課

住 所 中津川市千旦林 1197-10
(坂本事務所横)

電 話 0573-68-2130

担 当 松井、佐々木、曽我、今井

【状況写真 R6.9月時点】



リニア岐阜県駅周辺 土地区画整理事業工事だより

2024 年
9 月
vol.30


お知らせ

現在、リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業の区域内では、造成・道路工事・排水路工事を進めています

東工区では、赤線で示す範囲の補強土壁工事をを行っています。基礎コンクリート工事が完了し、現在、壁面材の設置（青色）、補強材の取付（ピンク色）、盛土を繰り返し、工事を進めています。（写真①）



また、中央工区では、上下水道工事等を行い、ライフラインの整備を進めています。（写真②）地域の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

工事状況等

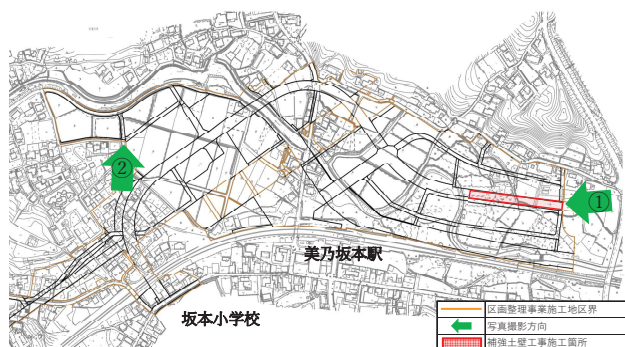

【工事状況概要図】

【状況写真 R6.8 月時点】

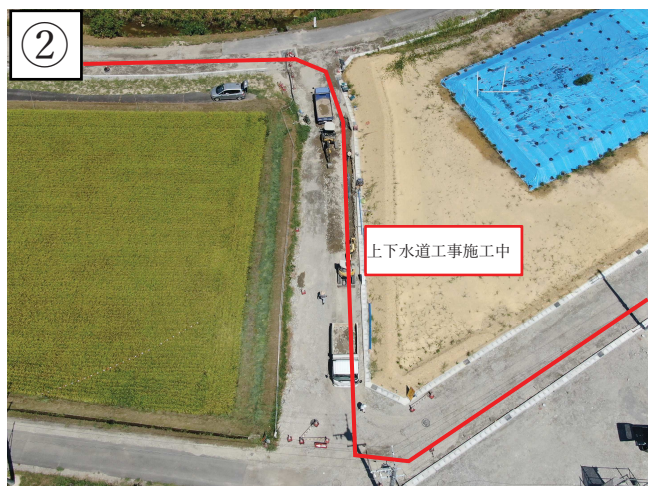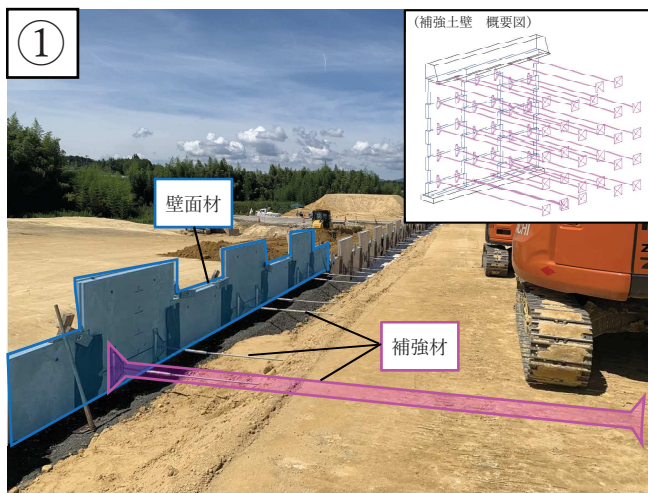

工事に関するご意見・お問い合わせ

リニア推進坂本事務所 区画整理課

住 所 中津川市千旦林 1197-10
(坂本事務所横)

電 話 0573-68-2130

担 当 松井、佐々木、曽我、今井

リニア岐阜県駅周辺 土地区画整理事業工事だより

2024 年
8 月
vol.29

お知らせ

現在、リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業の区域内では、造成・道路工事・排水路工事を進めています


東工区では、赤線で示す範囲の補強土壁工事をを行っています。現在、基礎地盤までの盛土が完了し、基礎コンクリートの工事を行っています。（写真②）

完了後は、コンクリート壁面材の設置を行い道路の形を作っていきます。

地域の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

工事状況等

【状況写真 R6.7 月時点】

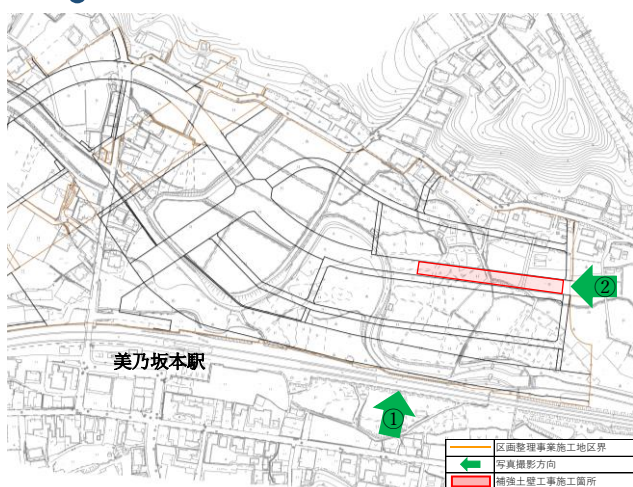

【工事状況概要図】



工事に関するご意見・お問い合わせ

リニア推進坂本事務所 区画整理課

住 所 中津川市千旦林 1197-10
(坂本事務所横)

電 話 0573-68-2130

担 当 松井、佐々木、曽我、今井

リニア岐阜県駅周辺 土地区画整理事業工事だより

2024 年
7 月
vol.28


お知らせ

現在、リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業の区域内では、造成・道路築造・排水路工事を進めています

東工区では、赤線で示す範囲の補強土壁工事に着手しました。現在、表土はぎが完了し、順次盛土工をおこなっています。補強土壁の基礎地盤まで盛土後、補強土壁の築造を行っていく予定です。

地域の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

工事状況等

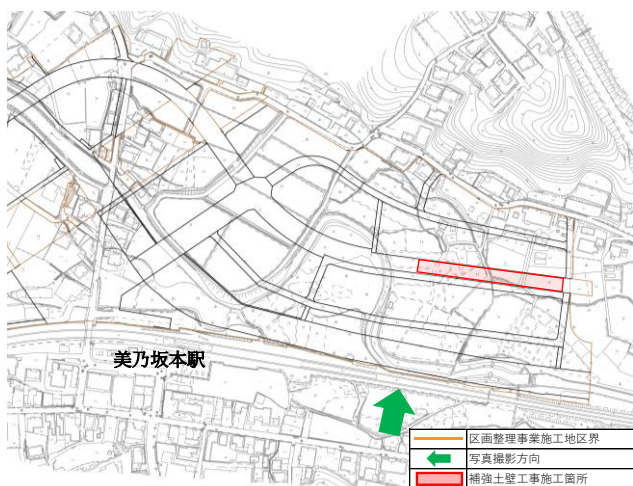

【工事状況概要図】

【状況写真 R6.5 月時点】



表土はぎ完了後
基礎地盤まで盛土工

【状況写真 R6.6 月時点】



工事に関するご意見・お問い合わせ

リニア推進坂本事務所 区画整理課

住 所 中津川市千旦林 1197-10
(坂本事務所横)

電 話 0573-68-2130

担 当 松井、佐々木、曽我、今井

リニア岐阜県駅周辺 土地区画整理事業工事だより

2024 年
6 月
vol.27

お知らせ


現在、リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業の区域内では、造成・道路築造・排水路工事を行っており、各工区では、仮設道路をご利用いただいています。

今後も、工事の進捗により道路の切替を予定しており、詳細な切り替え時期やルートにつきましては、回覧、看板等にてお知らせします。

地域の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

工事状況等

【状況写真 R6.5 月時点】

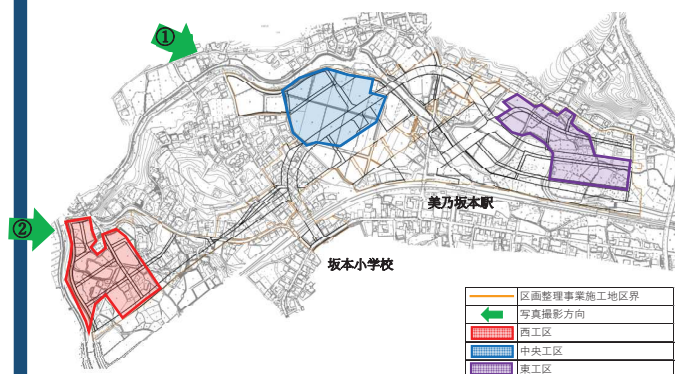

【工事状況概要図】



工事に関するご意見・お問い合わせ

リニア推進坂本事務所 区画整理課

住 所 中津川市千旦林 1197-10
(坂本事務所横)

電 話 0573-68-2130

担 当 松井、佐々木、曾我、今井

リニア岐阜県駅周辺 土地区画整理事業工事だより

2024 年
5 月
vol.26

お知らせ

現在、リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業の区域内では、造成・道路築造・排水路工事を進めています。

東工区では、青線で示す範囲の道路築造工事を進めており、築造完了後、黒点線で示す仮付替道路から青線で示す道路への切替を予定しています。（写真①）


道路築造工事に伴い、仮付替道路の通行止を予定していますので、看板等で周知いたします。

また、赤線で示す範囲の補強土壁工事を発注しましたので、今後、着手してまいります。

（写真② 参考のような周囲より一段高い道路構造となります。）

地域の皆様にはご不便おかけしますが、ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

工事状況等

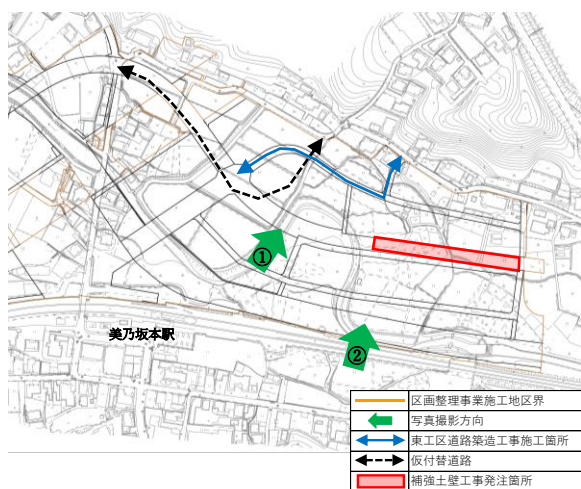

【工事状況概要図】

工事に関するご意見・お問い合わせ

リニア推進坂本事務所 区画整理課

住 所 中津川市千旦林 1197-10
(坂本事務所横)

電 話 0573-68-2130

担 当 松井、佐々木、曽我、今井

【状況写真 R6.4 月時点】



リニア岐阜県駅周辺 土地区画整理事業工事だより

2024 年
4 月
vol.25

お知らせ

現在、リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業の区域内では、造成・道路築造・排水路工事を進めています。


中央工区では、黄線で示す範囲の造成工事を進めており、南側の赤線で示す道路区間は通行止め（道路廃止）としています。

通行止めに伴い、3月下旬から青線で示す区間を迂回路として供用しています。

今後も工事の進捗により、道路の切替を予定していますので、その都度、看板等で周知いたします。

地域の皆様にはご不便おかけしますが、ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

工事状況等

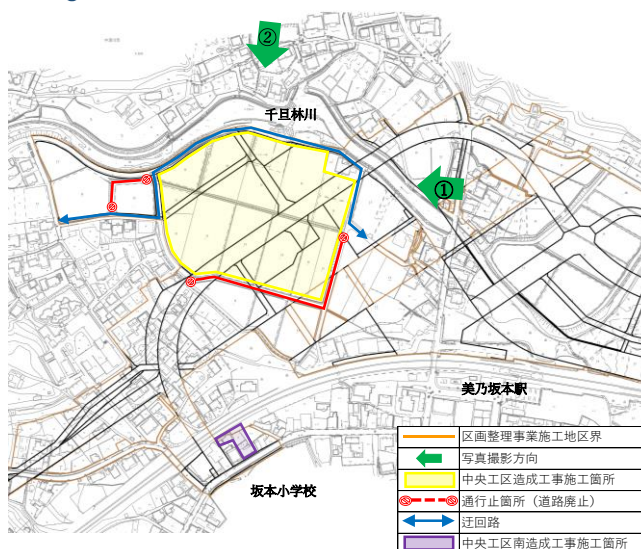

【工事状況概要図】

工事に関するご意見・お問い合わせ

リニア推進坂本事務所 区画整理課

住 所 中津川市千旦林 1197-10
(坂本事務所横)

電 話 0573-68-2130

担 当 松井、佐々木、曽我、今井

【状況写真 R6.3月時点】

