

濃飛横断自動車道事業 茄子川地内工事だより

2025年
3月
vol.31

お知らせ

茄子川地内では、橋梁下部工・上部工工事、道路改良工事を進めています。

工事に伴い資材の運搬を予定していますので、交通マナーや交通ルールを守り運搬します。

ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いします。

工事状況等

【工事箇所】



【工事概要】

■ 工事中箇所

受注者	主な工種	完成目途	3月主な作業	2月末進捗率	備考
角藤・篠田JV	橋梁上部工	R7.3末	—	100%	
株中島工務店	橋梁下部工	R7.3末	作業土工	95%	
株加地工務店	道路改良	R7.3末	舗装工、側溝工	89%	
株吉川工務店	橋梁下部工	R7.3末	橋台工	93%	
株古井工務店	除草工	R7.3末	除草工	73%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課
担 当：中村、土田、平野
電 話：0573-26-1111
(内線：233・234・236)

濃飛横断自動車道安全協議会
会長：近藤（鳴海組）
副会長：原（加地工務店）、田中（中島工務店）
電 話：080-2639-9981（近藤）
090-4085-7812（原）
090-7439-8538（田中）

濃飛横断自動車道事業
茄子川地内工事だより

2025年

2月

vol.30

お知らせ


茄子川地内では、橋梁下部工・上部工工事、道路改良工事を進めています。

工事に伴い資材の運搬を予定していますので、交通マナーや交通ルールを守り運搬します。

ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いします。

工事状況等

【工事箇所】

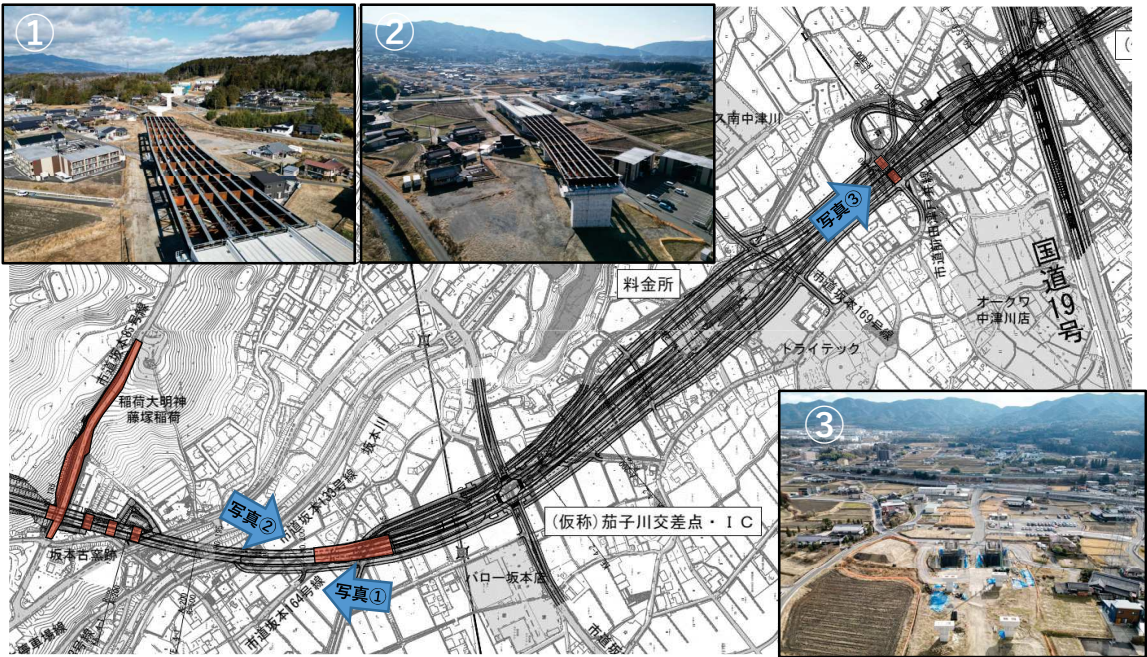

【工事概要】

工事中箇所

受注者	主な工種	完成目途	2月主な作業	1月末進捗率	備考
角藤・篠田JV	橋梁上部工	R7.3末	撤去工	99%	
㈱中島工務店	橋梁下部工	R7.3末	P1橋脚躯体工、作業土工	91%	
㈱加地工務店	道路改良	R7.3末	擁壁工、側溝工、舗装工	71%	
㈱吉川工務店	橋梁下部工	R7.3末	南進、北進A2橋台	82%	
㈱古井工務店	除草工	R7.3末	除草工	67%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課
 担当：中村、土田、平野
 電話：0573-26-1111
 (内線：233・234・236)

濃飛横断自動車道安全協議会
 会長：近藤（鳴海組）
 副会長：原（加地工務店）、田中（中島工務店）
 電話：080-2639-9981（近藤）
 090-4085-7812（原）
 090-7439-8538（田中）

濃飛横断自動車道事業
茄子川地内工事だより

2025年
1月
vol.29

お知らせ


茄子川地内では、橋梁下部工・上部工工事、道路改良工事を進めています。

工事に伴い資材の運搬を予定していますので、交通マナーや交通ルールを守り運搬します。

ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いします。

工事状況等

【工事箇所】

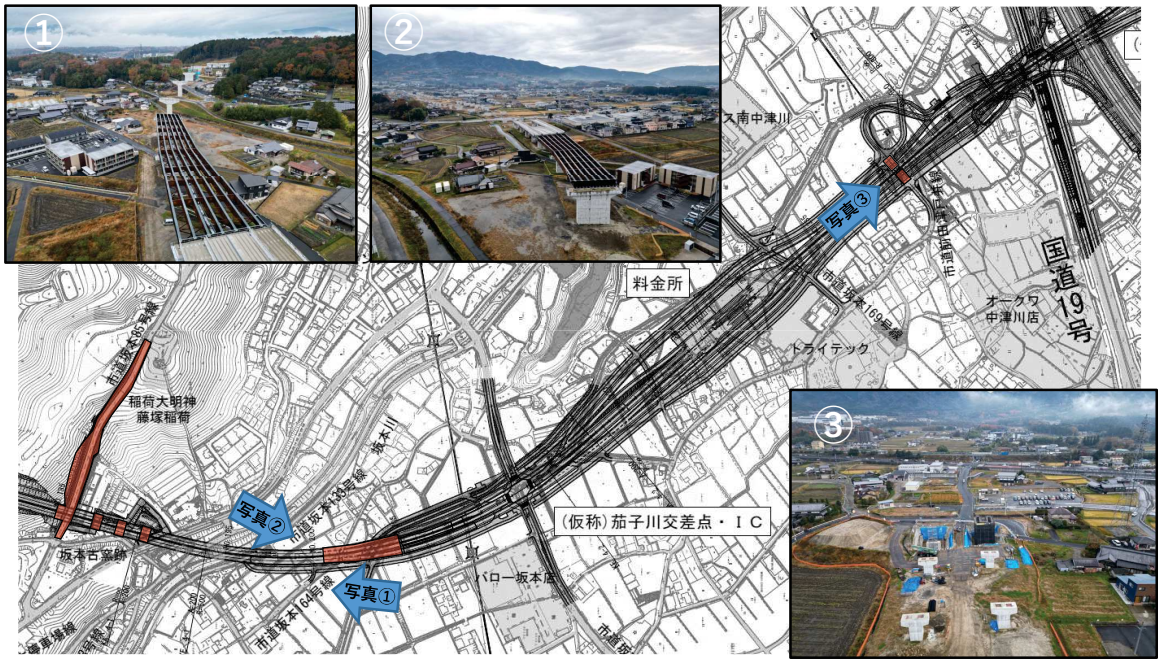

【工事概要】

工事中箇所

受注者	主な工種	完成目途	1月主な作業	12月末進捗率	備考
角藤・篠田JV	橋梁上部工	R7.3末	撤去工	99%	
㈱中島工務店	橋梁下部工	R7.3末	P1橋脚躯体工	85%	
㈱加地工務店	道路改良	R7.3末	道路土工、擁壁工	66%	
㈱吉川工務店	橋梁下部工	R7.3末	南進、北進A2橋台	78%	
㈱古井工務店	除草工	R7.1末	除草工	61%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課
 担当：中村、土田、平野
 電話：0573-26-1111
 （内線：233・234・236）

濃飛横断自動車道安全協議会
 会長：近藤（鳴海組）
 副会長：原（加地工務店）、田中（中島工務店）
 電話：080-2639-9981（近藤）
 090-4085-7812（原）
 090-7439-8538（田中）

濃飛横断自動車道事業
茄子川地内工事だより

2024年
12月
vol.28

お知らせ

茄子川地内では、橋梁下部工・上部工工事、道路改良工事を進めています。


工事に伴い資材の運搬を予定していますので、交通マナーや交通ルールを守り運搬します。

ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いします。

工事状況等

【工事箇所】



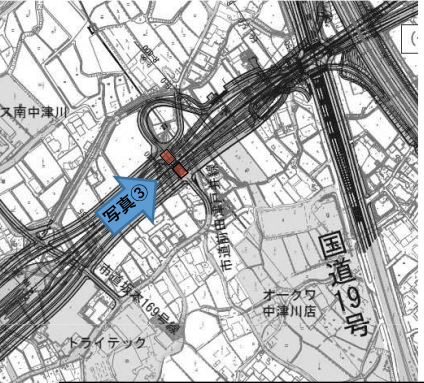


【工事概要】

工事中箇所

受注者	主な工種	完成目途	12月主な作業	11月末進捗率	備考
角藤・篠田JV	橋梁上部工	R7.3末	撤去工	99%	
㈱中島工務店	橋梁下部工	R7.3末	P1橋脚躯体工	75%	
㈱加地工務店	道路改良	R7.3末	道路土工、掘削、残土運搬	59%	
㈱吉川工務店	橋梁下部工	R7.3末	南進、北進A2橋台	55%	
㈱古井工務店	除草工	R7.1末	除草工	56%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課
 担当：中村、土田、平野
 電話：0573-26-1111
 (内線：233・234・236)

濃飛横断自動車道安全協議会
 会長：近藤（鳴海組）
 副会長：原（加地工務店）、田中（中島工務店）
 電話：080-2639-9981（近藤）
 090-4085-7812（原）
 090-7439-8538（田中）

濃飛横断自動車道事業
茄子川地内工事だより

2024年
11月
vol.27

お知らせ


茄子川地内では、橋梁下部工・上部工工事、道路改良工事を進めています。

工事に伴い資材の運搬を予定していますので、交通マナーや交通ルールを守り運搬します。

ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いします。

工事状況等

【工事箇所】

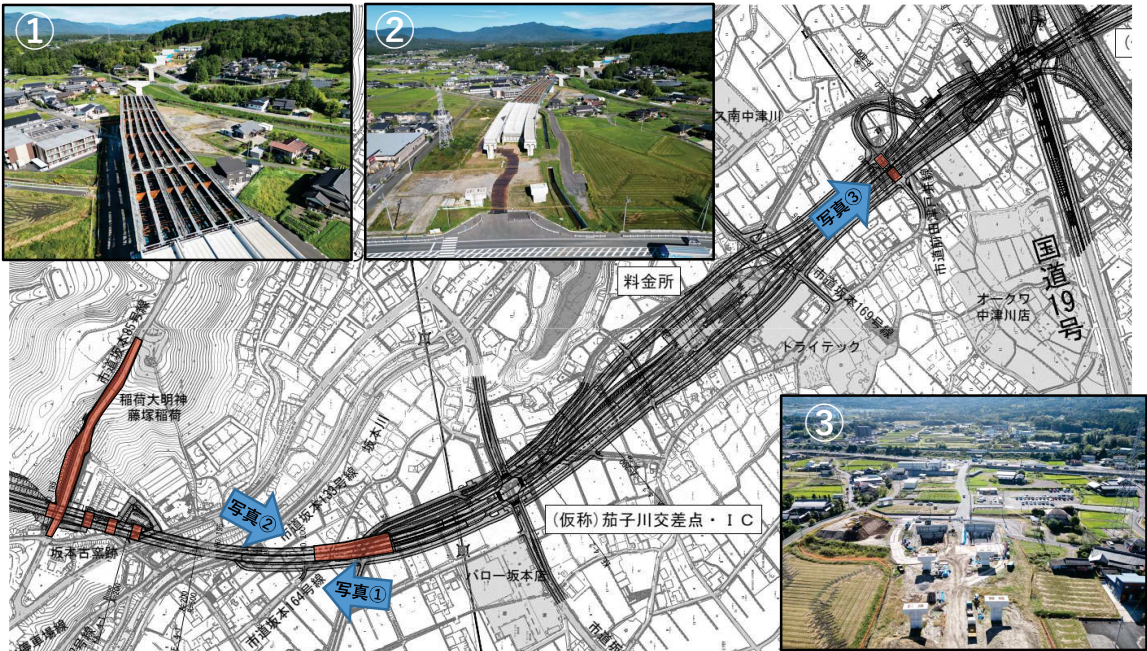

【工事概要】

工事中箇所

受注者	主な工種	完成目途	11月主な作業	10月末進捗率	備考
角藤・篠田JV	橋梁上部工	R7.3末	吊足場解体、迂回路撤去	98%	
㈱中島工務店	橋梁下部工	R7.3末	P1橋脚躯体工	63%	
㈱加地工務店	道路改良	R7.3末	道路土工、舗装工	50%	
㈱吉川工務店	橋梁下部工	R7.3末	南進、北進A2橋台	45%	
㈱古井工務店	除草工	R7.1末	除草工	39%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課

担 当：中村、土田、平野

電 話：0573-26-1111

(内線：233・234・236)

濃飛横断自動車道安全協議会

会長：近藤（鳴海組）

副会長：原（加地工務店）、田中（中島工務店）

電 話：080-2639-9981（近藤）

090-4085-7812（原）

090-7439-8538（田中）

濃飛横断自動車道事業 茄子川地内工事だより

2024年
10月
vol.26

お知らせ


茄子川地内では、橋梁下部工・上部工工事、道路改良工事を進めています。

工事に伴い資材の運搬を予定していますので、交通マナーや交通ルールを守り運搬します。

ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いします。

工事状況等

【工事箇所】

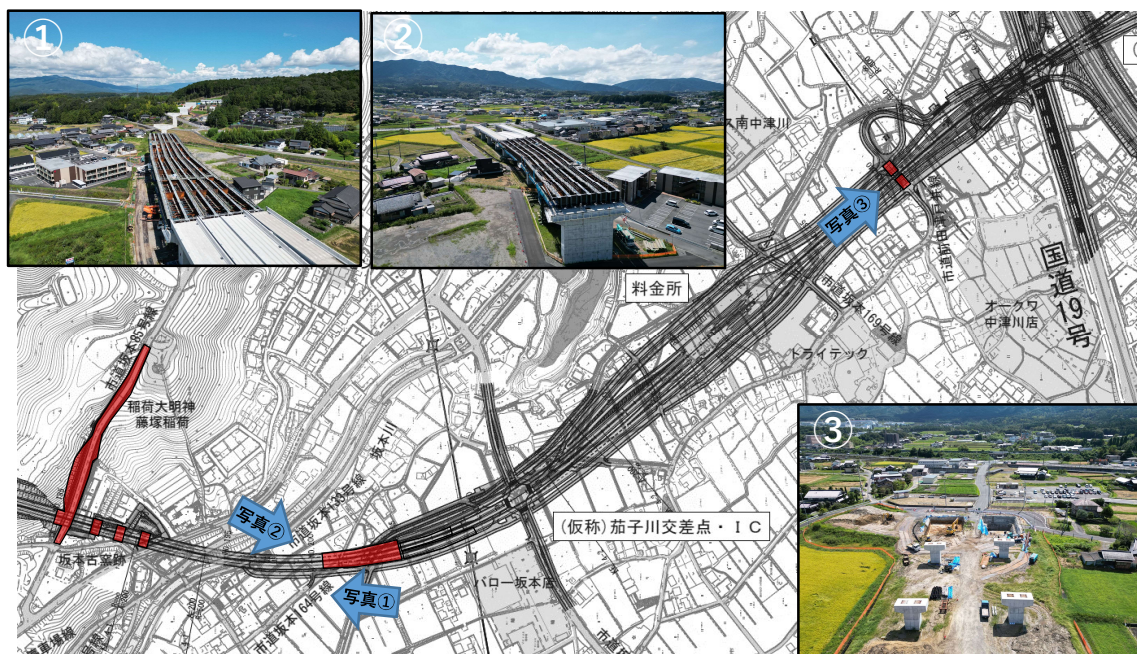

【工事概要】

■ 工事中箇所

受注者	主な工種	完成目途	10月主な作業	9月末進捗率	備考
角藤・篠田JV	橋梁上部工	R7.3末	現場塗装工、上部工	95%	
株中島工務店	橋梁下部工	R7.3末	作業土工、仮設工	59%	
株加地工務店	道路改良	R7.3末	土工掘削、東部広域水道工事	38%	
株吉川工務店	橋梁下部工	R7.3末	A2橋台掘削	38%	
株古井工務店	除草工	R7.1末	除草工	30%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課

担 当：中村、土田、平野

電 話：0573-26-1111

(内線：233・234・236)

濃飛横断自動車道安全協議会

会長：近藤（鳴海組）

副会長：原（加地工務店）、田中（中島工務店）

電 話：080-2639-9981（近藤）

090-4085-7812（原）

090-7439-8538（田中）

濃飛横断自動車道事業 茄子川地内工事だより

2024年
9月
vol.25

お知らせ

茄子川地内では、橋梁下部工・上部工工事、道路改良工事を進めています。


工事に伴い資材の運搬を予定していますので、交通マナーや交通ルールを守り運搬します。

ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いします。

また、7月26日に上部工架設の見学会を開催し、暑い中でしたが多くの方に出席していただきました。ありがとうございました。

工事状況等

【工事箇所】

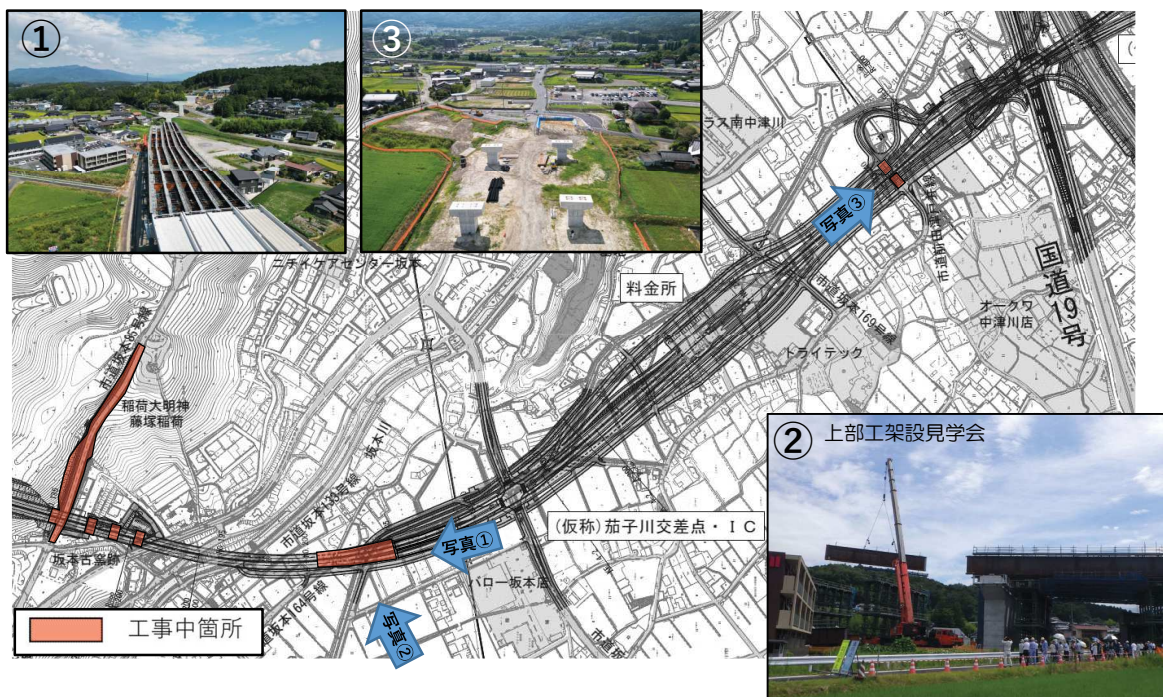

【工事概要】

受注者	主な工種	完成目途	9月主な作業	8月末進捗率	備考
角藤・篠田JV	橋梁上部工	R7.3末	上部工	87%	
(株)中島工務店	橋梁下部工	R7.3末	作業土工、仮設工	55%	
(株)加地工務店	道路改良	R7.3末	道路土工、掘削・残土運搬、電柱移設	37%	
(株)吉川工務店	橋梁下部工	R7.3末	A2橋台掘削	35%	
(株)古井工務店	除草工	R7.1末	除草工	16%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課

担 当：中村、土田、平野

電 話：0573-26-1111

(内線：233・234・236)

濃飛横断自動車道安全協議会

会長：近藤（鳴海組）

副会長：原（加地工務店）、田中（中島工務店）

電 話：080-2639-9981（近藤）

090-4085-7812（原）

090-7439-8538（田中）

濃飛横断自動車道事業

茄子川地内工事だより

2024年

8月

vol.24

お知らせ


茄子川地内では、橋梁下部工・上部工工事、道路改良工事を進めています。

工事に伴い資材の運搬を予定していますので、交通マナーや交通ルールを守り運搬します。

ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いします。

工事状況等

【工事箇所】

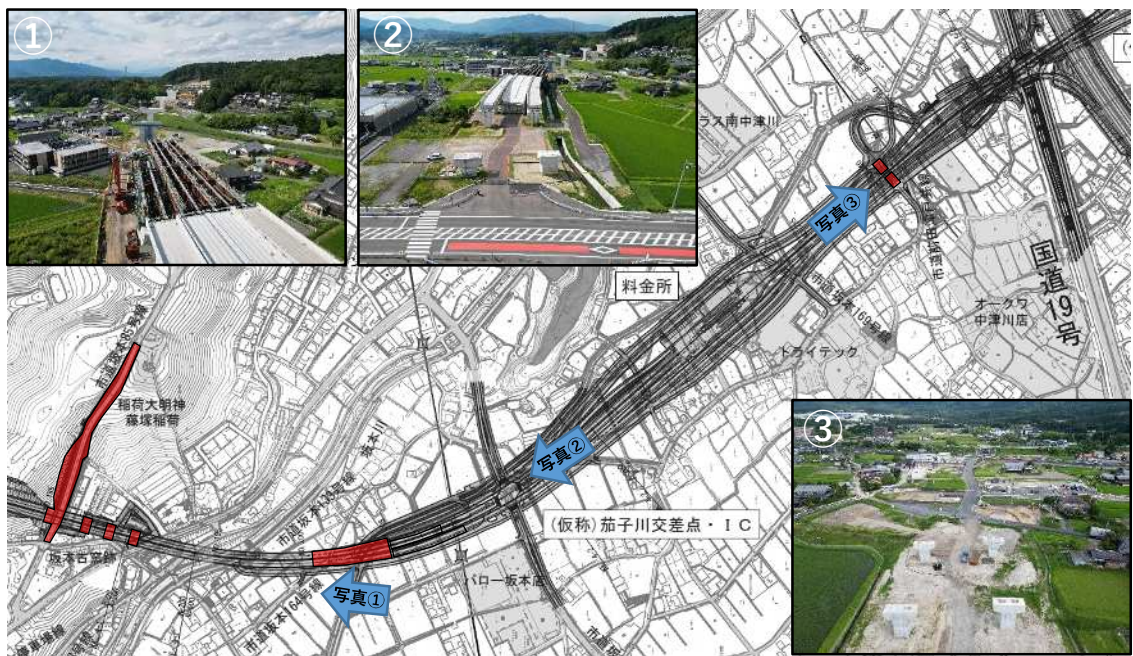

【工事概要】

工事中箇所

受注者	主な工種	完成目途	8月主な作業	7月末進捗率	備考
角藤・篠田JV	橋梁上部工	R7.3末	上部工	82%	
㈱中島工務店	橋梁下部工	R7.3末	A1橋台	48%	
㈱加地工務店	道路改良	R7.3末	道路土工、掘削・残土運搬	31%	
㈱吉川工務店	橋梁下部工	R7.3末	仮設工、A2橋台	20%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課

担 当：中村、土田、渡邊、平野

電 話：0573-26-1111

(内線：233・234・236)

濃飛横断自動車道安全協議会

会長：近藤（鳴海組）

副会長：原（加地工務店）、田中（中島工務店）

電 話：080-2639-9981（近藤）

090-4085-7812（原）

090-7439-8538（田中）

濃飛横断自動車道事業
茄子川地内工事だより

2024年
7月
vol.23

お知らせ


茄子川地内では、橋梁下部工・上部工工事、道路改良工事を進めています。

工事に伴い資材の運搬を予定していますので、交通マナーや交通ルールを守り運搬します。

ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いします。

工事状況等

【工事箇所】

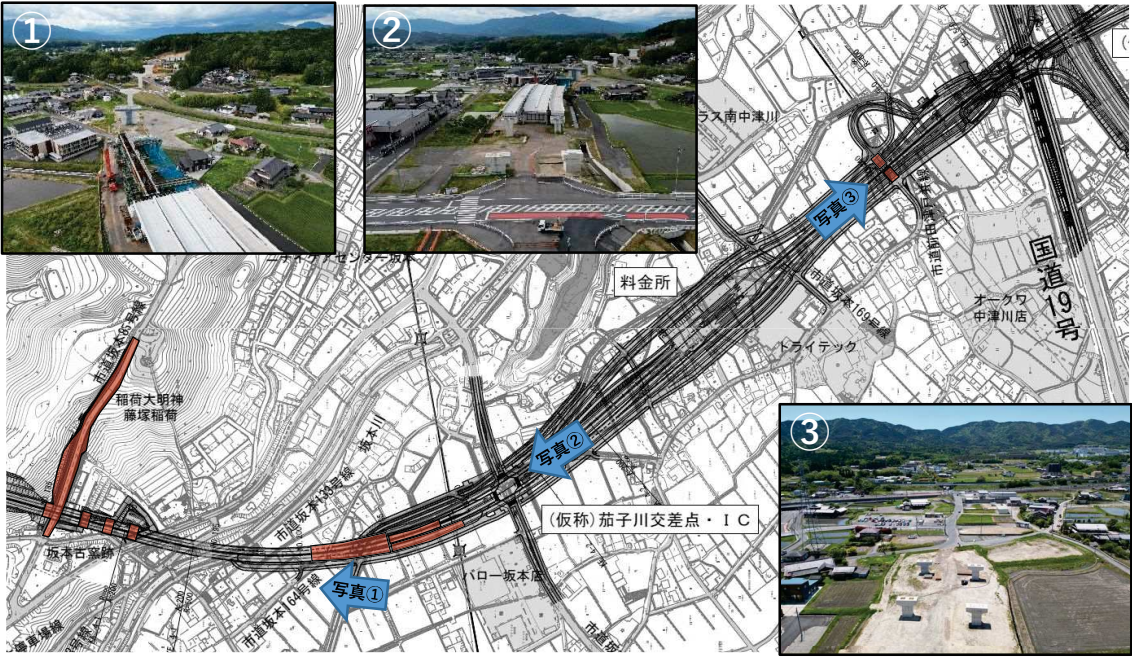

【工事概要】

工事中箇所

受注者	主な工種	完成目途	7月主な作業	6月末進捗率	備考
角藤・篠田JV	橋梁上部工	R7.3末	上部工	70%	
㈱中島工務店	橋梁下部工	R7.3末	A1橋台	37%	
㈱加地工務店	道路改良	R7.3末	道路改良工	20%	
㈱吉川工務店	橋梁下部工	R7.3末	仮設工	11%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課
 担当：中村、土田、渡邊、平野
 電話：0573-26-1111
 (内線：233・234・236)

濃飛横断自動車道安全協議会
 会長：近藤（鳴海組）
 副会長：原（加地工務店）、田中（中島工務店）
 電話：080-2639-9981（近藤）
 090-4085-7812（原）
 090-7439-8538（田中）

濃飛横断自動車道事業 茄子川地内工事だより

2024年

6月

vol.22

お知らせ


茄子川地内では、橋梁下部工・上部工工事、道路改良工事を進めています。

工事に伴い資材の運搬を予定していますので、交通マナーや交通ルールを守り運搬します。

ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いします。

工事状況等

【工事箇所】

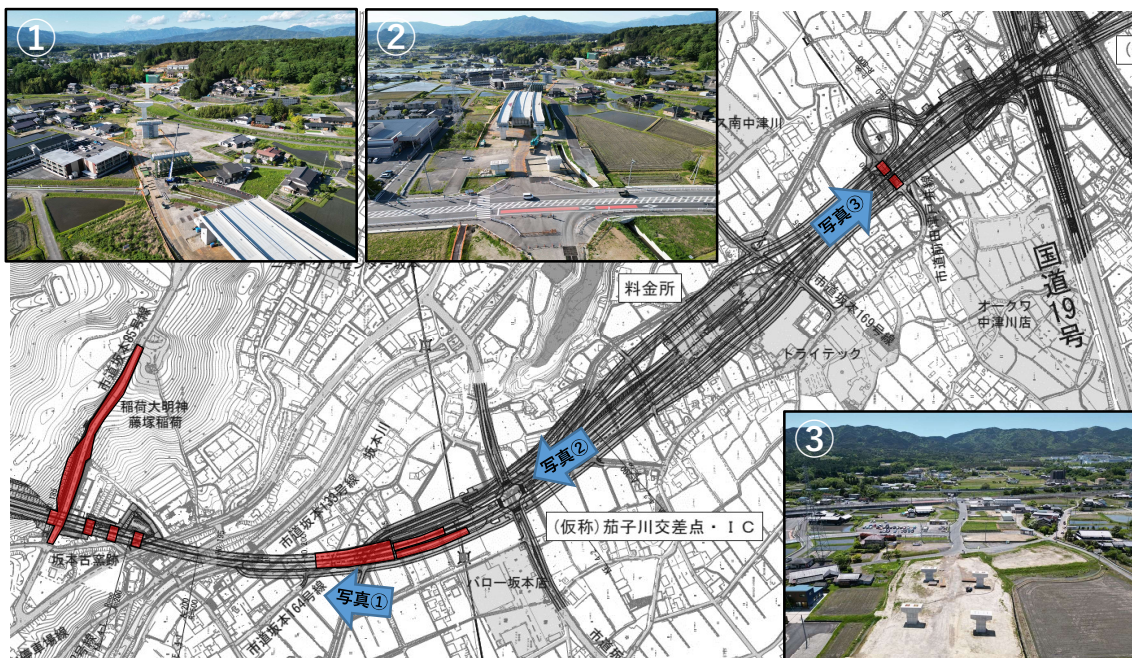

【工事概要】

■ 工事中箇所

受注者	主な工種	完成目途	6月主な作業	5月末進捗率	備考
(株)安部日鋼工業	橋梁上部工	R6.5末	工事完了	100%	
昭和ソケット工業(株)	橋梁上部工	R6.5末	工事完了	100%	
角藤・篠田JV	橋梁上部工	R7.3末	上部工	60%	
(株)中島工務店	橋梁下部工	R7.3末	A1橋台	32%	
(株)加地工務店	道路改良	R7.3末	道路改良工	10%	
(株)吉川工務店	橋梁下部工	R7.3末	仮設工	6%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課

担 当：中村、土田、渡邊、平野

電 話：0573-26-1111

(内線：233・234・236)

濃飛横断自動車道安全協議会

会長：近藤（鳴海組）

副会長：原（加地工務店）、田中（中島工務店）

電 話：080-2639-9981（近藤）

090-4085-7812（原）

090-7439-8538（田中）

濃飛横断自動車道事業
茄子川地内工事だより

2024年
5月
vol.21

お知らせ


茄子川地内では、橋梁下部工・上部工工事、道路改良工事を進めています。

工事に伴い資材の運搬を予定していますので、交通マナーや交通ルールを守り運搬します。


ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いします。

工事状況等

【工事箇所】

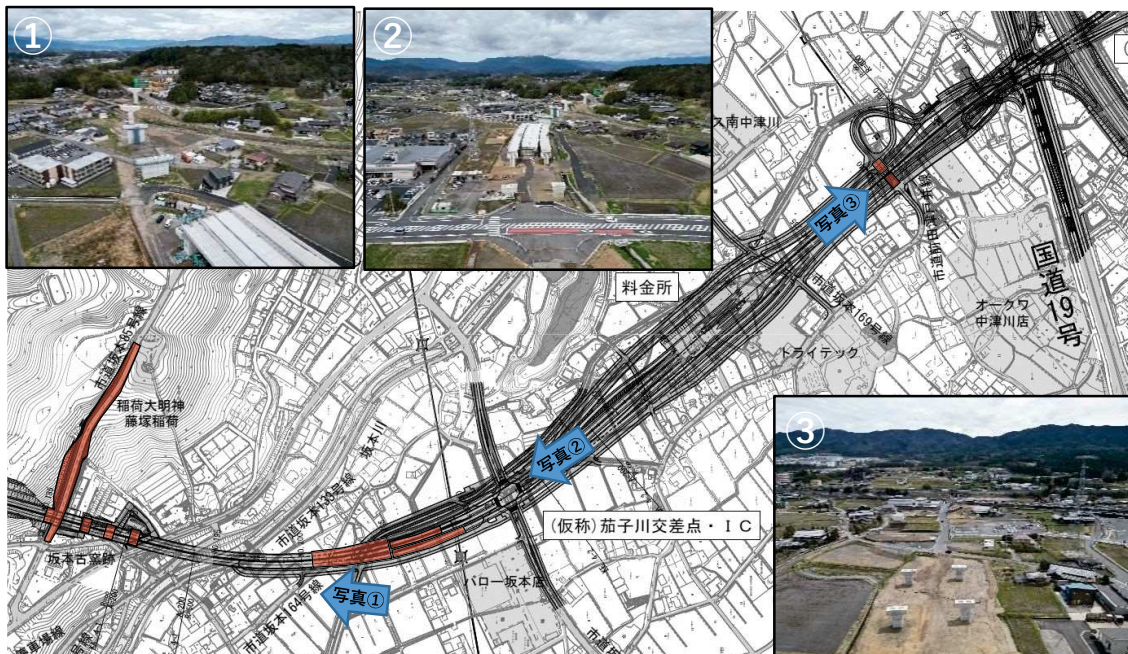

【工事概要】



受注者	主な工種	完成日途	5月主な作業	4月末進捗率	備考
(株)安部日鋼工業	橋梁上部工	R6.7末	橋面工	99%	
昭和ワッパ工業(株)	橋梁上部工	R6.5末	橋面工	95%	
角藤・篠田JV	橋梁上部工	R7.3末	上部工	50%	
(株)中島工務店	橋梁下部工	R7.3末	橋脚工、橋台工	15%	
(株)加地工務店	道路改良	R7.3末	道路改良工	7%	
(株)吉川工務店	橋梁下部工	R7.3末	起工測量、仮設道路工	1%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

患那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課
担 当：中村、土田、渡邊、平野
電 話：0573-26-1111
(内線：233・234・236)

濃飛横断自動車道安全協議会

会長：近藤（鳴海組）
副会長：原（加地工務店）、田中（中島工務店）
電話：080-2639-9981（近藤）
090-4085-7812（原）
090-7439-8538（田中）

濃飛横断自動車道事業

茄子川地内工事だより

2024年

4月

vol.20

お知らせ

濃飛横断自動車道（中津川工区）事業は、令和2年度より茄子川地内で橋梁下部工工事に着手いたしました。

茄子川地内では、これまでに橋梁下部工・上部工工事、第二野田川の付替え工事を進めてまいりました。

令和6年は、新たに3つの工事（橋梁下部工等）に着手しております。工事に伴い資材の運搬を予定しておりますので、交通マナーや交通ルールを守り運搬して参ります。

ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

工事状況等

【工事箇所】

③

①

②

写真①

写真②

写真③

工事箇所

【工事概要】

受注者	主な工種	完成目途	4月主な作業	3月末進捗率	備考
㈱安部日鋼工業	橋梁上部工	R6.7末	橋面工	98%	
昭和ソクリート工業㈱	橋梁上部工	R6.5末	橋面工	90%	
角藤・篠田JV	橋梁上部工	R7.3末	仮設工	5%	新規
㈱中島工務店	橋梁下部工	R7.3末	橋脚工・橋台工	6%	新規
㈱加地工務店	道路改良	R7.3末	道路改良工	5%	新規

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課

担 当：中村、土田、渡邊

電 話：0573-26-1111(内線：233・234・236)

濃飛横断自動車道安全協議会

代表者：原（加地工務店）

電 話：090-4085-7812（原）
