

駒場トンネル（名古屋方） 工事便り

2025 年
3 月
vol. 36

お知らせ

先日の臨時回覧でもお知らせしました通り、市道 69 号線下にて追加の沈下抑制対策を行いながら、トンネル本体の掘削工事を行っております。引き続きトンネルの掘削作業では、細心の注意を払って施工いたします。また、各所への土砂運搬、材料搬入車両など、工事用車両の運行時には路面状況をよく確認し、安全運転を心掛けます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

工事状況等（2025 年 2 月 10 日時点）


【工事工程】

工種	発生土の運搬先	2 月	3 月	4 月
トンネル工	土地区画整理事業等			



写真 トンネル施工状況

【進捗図】

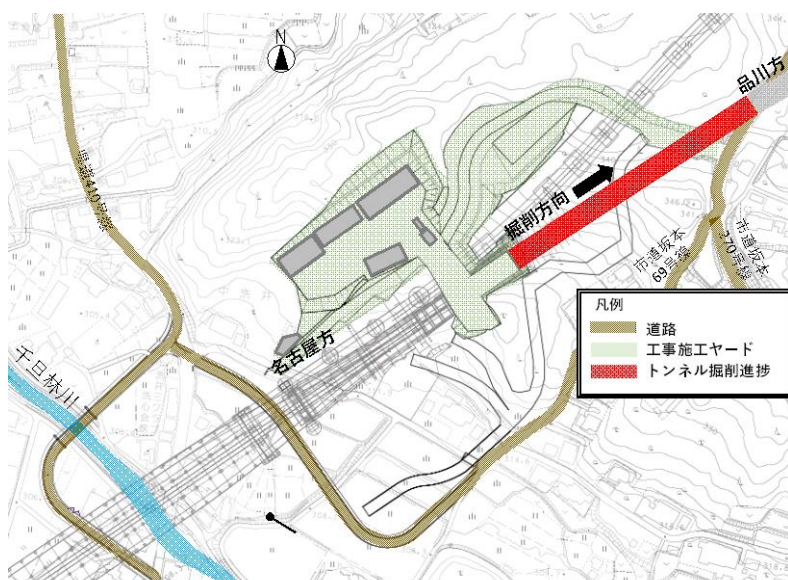

【工事内容】

- ・本坑を品川方へ掘削しています。
 - ・現在、約 204m の掘削が完了しています。
- （本線トンネル全長 4,708m）

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

3 月

日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

現場稼働日 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）

住 所 中津川市駒場 2292

電 話 0573-64-2211

担当者 桑高、濱田、河竹、佐藤、岡本

駒場トンネル（名古屋方） 工事便り

2025 年
2 月
vol. 35

お知らせ

トンネル本体の掘削工事が順調に進んでおり、掘進が190m付近に到達しました。引き続きトンネル掘削作業では、細心の注意を払って施工いたします。また、各所への土砂運搬、材料搬入車両など、工事用車両の運行時には路面状況をよく確認し、安全運転を心掛けます。

なお、年明けから再び昼夜でのトンネル掘削作業を行っております。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

工事状況等（2025 年 1 月 10 日時点）

【工事工程】

工種	発生土の運搬先	1 月	2 月	3 月
トンネル工	土地区画整理事業等			

【進捗図】

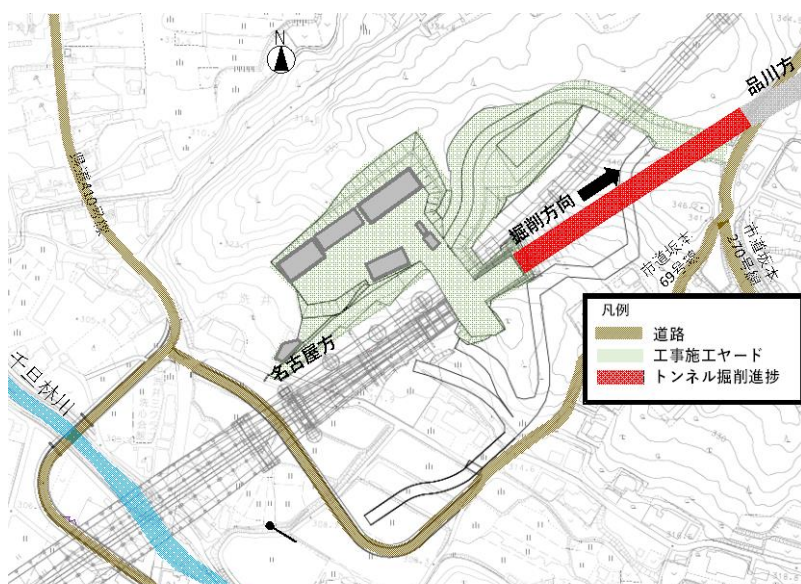


写真 トンネル坑内

【工事内容】

- ・本坑を品川方へ掘削しています。
 - ・現在、約 190m の掘削が完了しています。
- （本線トンネル全長 4,708m）

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

2月

日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

現場稼働日 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）

住 所 中津川市駒場 2292

電 話 0573-64-2211

担当者 桑高、濱田、河竹、佐藤、岡本

駒場トンネル（名古屋方） 工事便り

2025 年
1 月
vol. 34

お知らせ

トンネル本体の掘削工事が順調に進んでおり、掘進が170m付近に到達しました。引き続きトンネル掘削作業では、細心の注意を払って施工いたします。また、各所への土砂運搬、材料搬入車両など、工事用車両の運行時には、安全運転を心掛けます。

なお、年明けから再び昼夜でのトンネル掘削作業を行います。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

工事状況等（2024 年 12 月 10 日時点）

【工事工程】

工種	発生土の運搬先	1 月	2 月	3 月
トンネル工	土地区画整理事業等			

【進捗図】

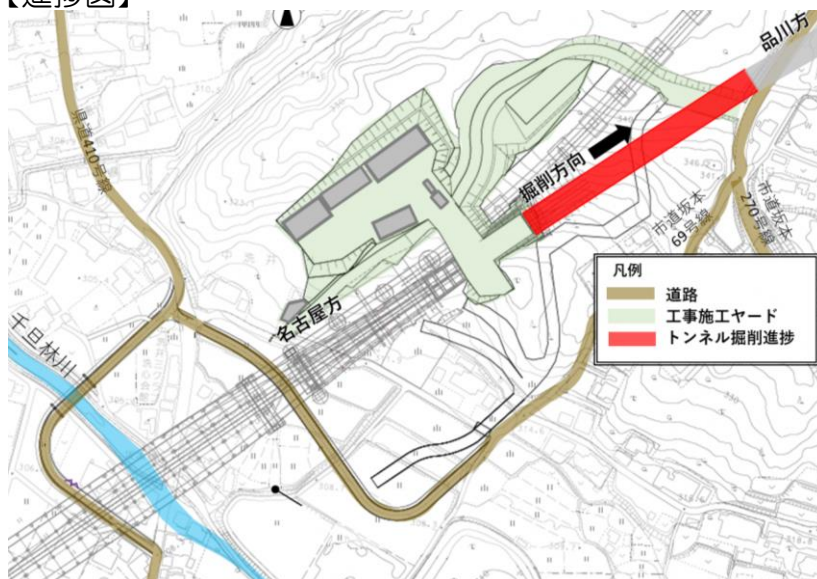


写真 トンネル坑内

【工事内容】

- ・本坑を品川方へ掘削しています。
 - ・現在、約 168m の掘削が完了しています。
- （本線トンネル全長 4,708m）

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

1 月

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

現場稼働日 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）

住 所 中津川市駒場 2292

電 話 0573-64-2211

担当者 桑高、濱田、河竹、佐藤、岡本

駒場トンネル（名古屋方） 工事便り

2024年
12月
vol. 33

お知らせ

トンネル本体の掘削工事が順調に進んでおり、掘削延長が140mを超えました。市道直下の掘削も控えており、引き続きトンネル掘削作業では、細心の注意を払って施工いたします。また、各所への土砂運搬、材料搬入車両など、工事用車両通行時は安全運転を心掛けます

なお、年明けから再び昼夜でのトンネル掘削作業を予定しております。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

工事状況等（2024年11月10日時点）

【工事工程】

工種	発生土の運搬先	11月	12月	1月
トンネル工	土地区画整理事業等			

【進捗図】

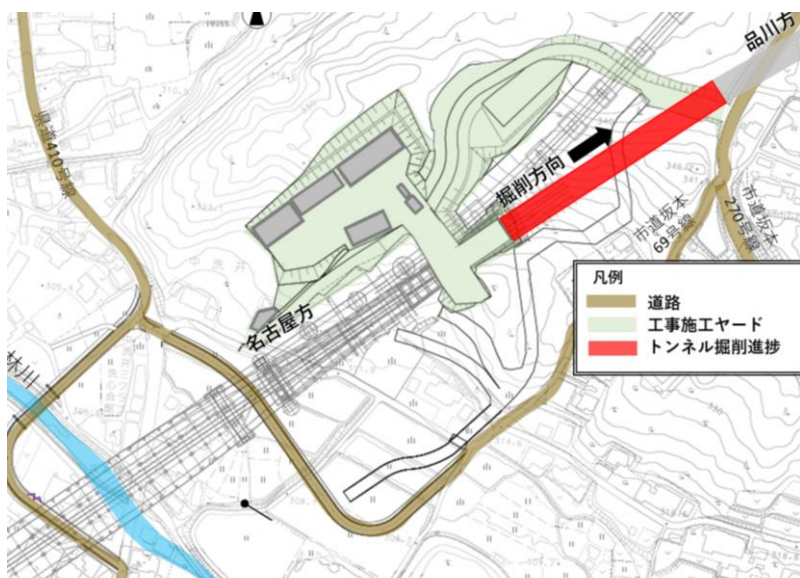


写真 トンネル坑内

【工事内容】

- ・本坑を品川方へ掘削しています。
 - ・現在、約146mの掘削が完了しています。
- （本線トンネル全長 4,708m）

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

12月

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

現場稼働日 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）

住所 中津川市駒場 2292

電話 0573-64-2211

担当者 桑高、濱田、河竹、佐藤、岡本

駒場トンネル（名古屋方） 工事便り

2024年
11月
vol. 32

お知らせ

トンネル本体の掘削工事が順調に進んでおり、掘進長が100mを越えました。引き続き、細心の注意を払って施工いたします。また、各所への土砂運搬、材料搬入車両など、工事用車両通行時は安全運転を心掛けます。

なお、10月からは昼間のみの作業となっております。引き続き、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

工事状況等（2024年10月10日時点）


【工事工程】

工種	発生土の運搬先	10月	11月	12月
トンネル工	土地区画整理事業等			



写真 トンネル坑内

【進捗図】

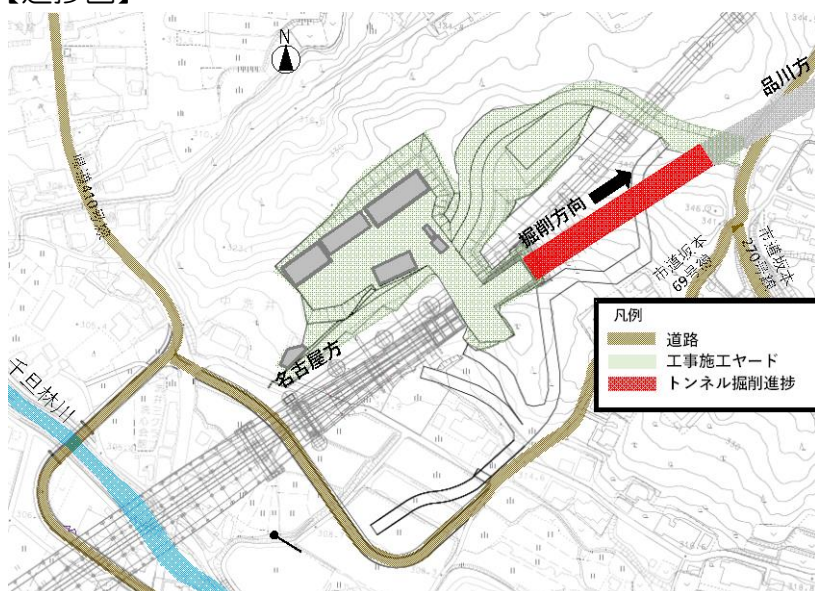

【工事内容】

- ・本坑を品川方へ掘削しています。
 - ・現在、約124mの掘削が完了しています。
- （本線トンネル全長 4,708m）

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

11月

日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

現場稼働日 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）

住所 中津川市駒場 2292

電話 0573-64-2211

担当者 桑高、濱田、河竹、佐藤、岡本

駒場トンネル（名古屋方） 工事便り

2024年
10月
vol. 31

お知らせ

トンネル本体の掘削工事が順調に進んでおります。引き続き、トンネル掘削作業では、細心の注意を払って施工いたします。材料搬入車両も含めて、工事用車両通行時は安全運転を心掛けます。

なお、9月から昼夜作業でのトンネル工事を行っていましたが、10月からは昼間作業のみとなります。引き続き、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

工事状況等（2024年9月10日時点）

【工事工程】

工種	発生土の運搬先	10月	11月	12月
トンネル工	土地区画整理事業等			

【進捗図】

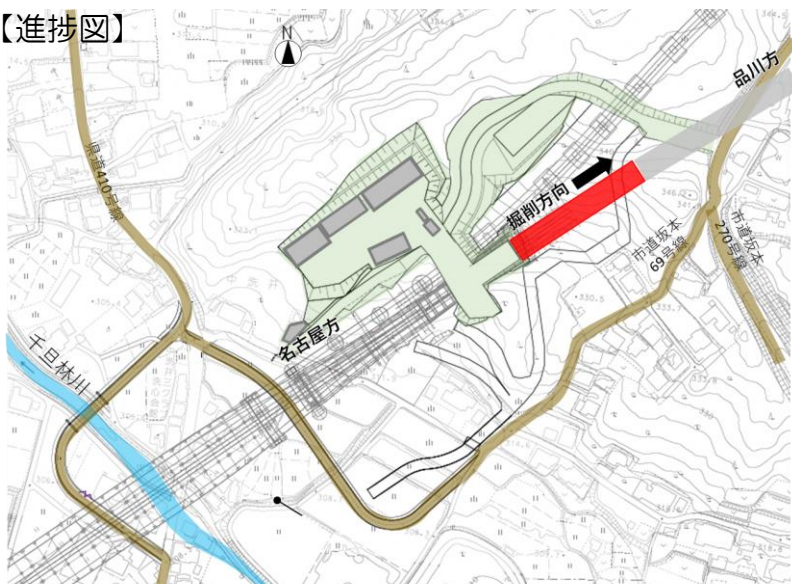


写真 トンネル坑内

【工事内容】

- ・本坑を品川方へ掘削しています。
- ・現在、約93mの掘削が完了しています。

（本線トンネル全長 4,708m）

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

10月

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
		現場稼働日		休工日		

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）

住 所 中津川市駒場 2292

電 話 0573-64-2211

担当者 桑高、濱田、河竹、佐藤、岡本

駒場トンネル（名古屋方） 工事便り

2024年
9月
vol. 30

お知らせ

トンネル本体の掘削工事が順調に進んでおります。引き続き、トンネル掘削作業では、細心の注意を払って施工いたします。材料搬入車両も含めて、工事用車両通行時は安全運転を心掛けます。

なお、9月から昼夜でのトンネル工事を予定しております。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

工事状況等（2024年8月10日時点）

【工事工程】

工種	発生土の運搬先	9月	10月	11月
トンネル工	土地区画整理事業ほか			

【進捗図】

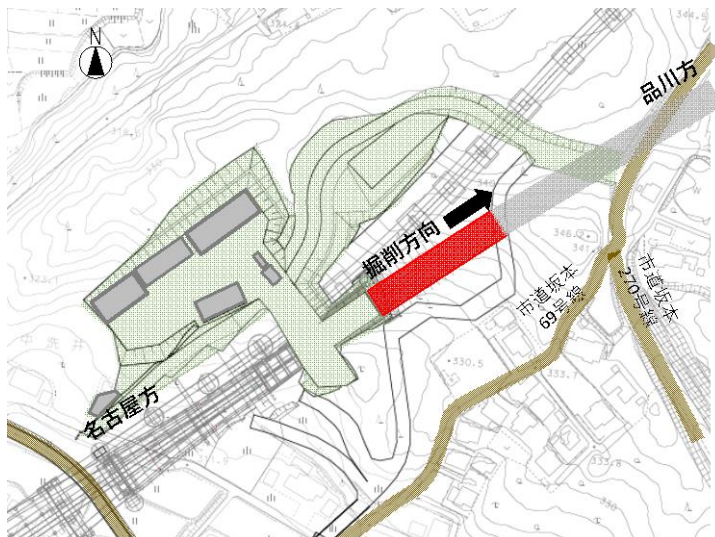


写真 トンネル坑内状況

【工事内容】

- ・本坑を品川方へ掘削しています。
- ・現在、約78mの掘削が完了しています。

（本線トンネル全長 4,708m）

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

9月

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

現場稼働日 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）

住所 中津川市駒場 2292

電話 0573-64-2211

担当者 桑高、濱田、河竹、佐藤、岡本

駒場トンネル（名古屋方） 工事便り

2024年
8月
vol. 29

お知らせ

トンネル本体の掘削工事が順調に進んでおります。引き続き、トンネル掘削作業では、細心の注意を払って施工いたします。材料搬入車両も含めて、工事用車両通行時は安全運転を心掛けます

なお、お盆明けから昼夜でのトンネル工事を予定しております。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

詳細については、決まり次第、皆様にご連絡させていただきます。

工事状況等（2024年7月10日時点）


【工事工程】

工種	発生土の運搬先	8月	9月	10月
トンネル工	土地区画整理事業			



写真 トンネル掘削状況

【進捗図】

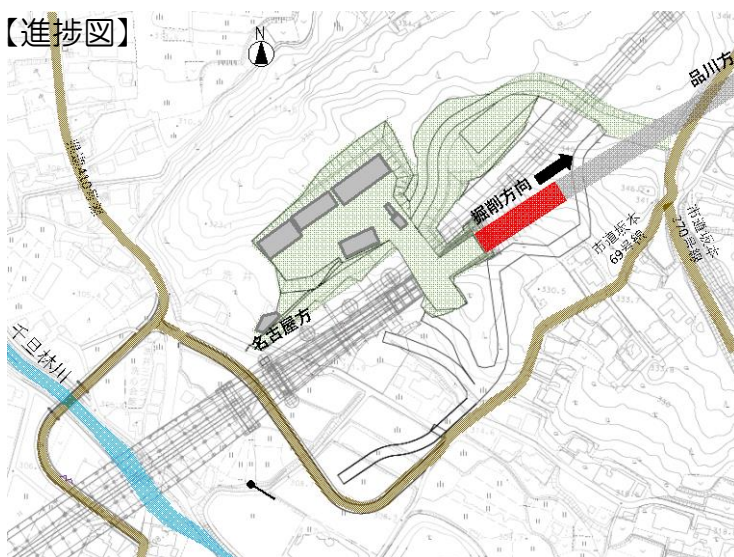

【工事内容】

- ・本坑を品川方へ掘削しています。
- ・現在、約60mの掘削が完了しています。

（本線トンネル全長4,708m）

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

8月

日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

現場稼働日 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）

住所 中津川市駒場2292

電話 0573-64-2211

担当者 桑高、濱田、河竹、佐藤、岡本

駒場トンネル（名古屋方） 工事便り

2024年
7月
vol. 28

お知らせ

トンネル本体の掘削工事が順調に進んでおります。トンネル底部についても、吹付けコンクリートで地山を補強しながら施工いたします。引き続き、トンネル掘削作業では、細心の注意を払って施工いたします。

お盆明けから昼夜間作業での、トンネル掘削工事を予定しております。それに先立ち、夜間作業時の施工状況等を確認するための試験施工を予定しています。実施時期は7月中旬ごろを予定しております。

工事状況等（2024年6月10日時点）

【工事工程】

工種	発生土の運搬先	7月	8月	9月
トンネル工	土地区画整理事業			

【進捗図】

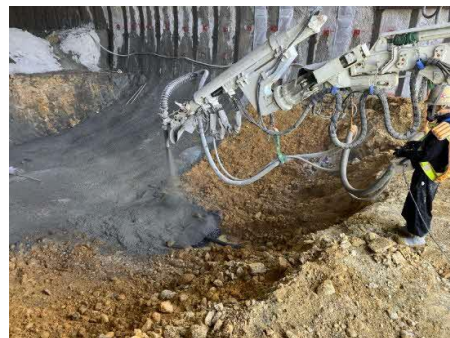
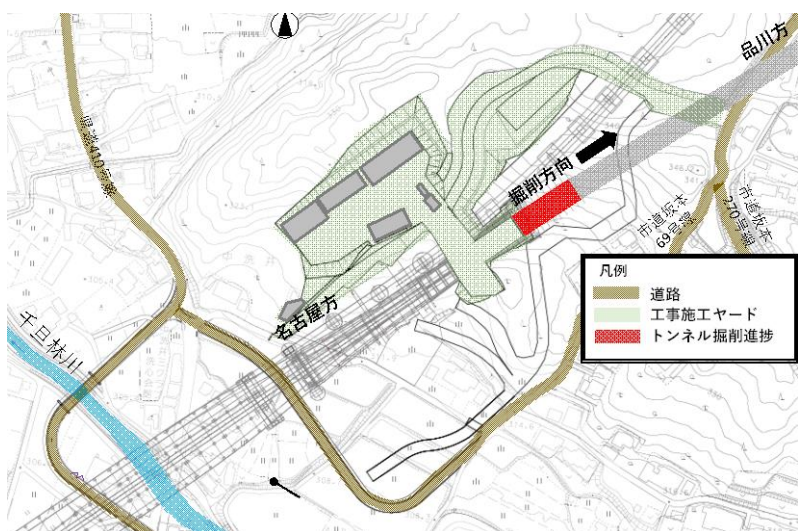


写真 トンネル吹付状況

【工事内容】

- ・本坑を品川方へ掘削しています。
 - ・現在、約41mの掘削が完了しています。
- （本線トンネル全長 4,708m）

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

7月

日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
	現場稼働日		休工日			

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）

住 所 中津川市駒場 2292

電 話 0573-64-2211

担当者 桑高、濱田、河竹、佐藤、岡本

駒場トンネル（名古屋方） 工事便り

2024年
6月
vol. 27

お知らせ

トンネル本体の掘削工事が順調に進んでおります。掘削が完了したら直ちにコンクリートを吹き付けて地山を固めながら進めております。

引き続き、トンネル掘削作業では、細心の注意を払って施工いたします。また、材料搬入車両や発生土搬出車両など工事用車両通行時は安全運転を心掛けます。

工事状況等（2024年5月時点）

【工事工程】

工種	発生土の運搬先	6月	7月	8月
トンネル工	土地区画整理事業			

【進捗図】

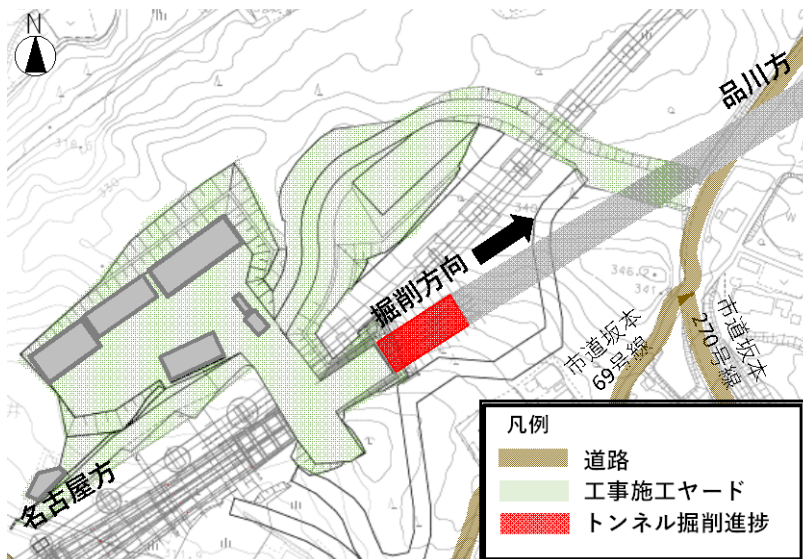


写真 トンネル掘削状況

【工事内容】

- ・本坑を品川方へ掘削しています。
- ・現在、約31mの掘削が完了しています。

（本線トンネル全長4,708m）

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

6月

日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

現場稼働日 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）

住所 中津川市駒場2292

電話 0573-64-2211

担当者 桑高、濱田、河竹、佐藤、岡本

駒場トンネル（名古屋方） 工事便り

2024年
5月
vol. 26

お知らせ

トンネル本体の掘削工事が順調に進んでおります。1日に1～2メートルずつ掘削を行っております。また、発生土の搬出作業も行っております。

引き続き、トンネル掘削作業では、細心の注意を払って施工いたします。また、材料搬入車両や発生土搬出車両など工事用車両通行時は安全運転を心掛けます。

工事状況等（2024年4月10日時点）

【工事工程】

工種	発生土の運搬先	5月	6月	7月
トンネル工	土地区画整理事業			

【進捗図】

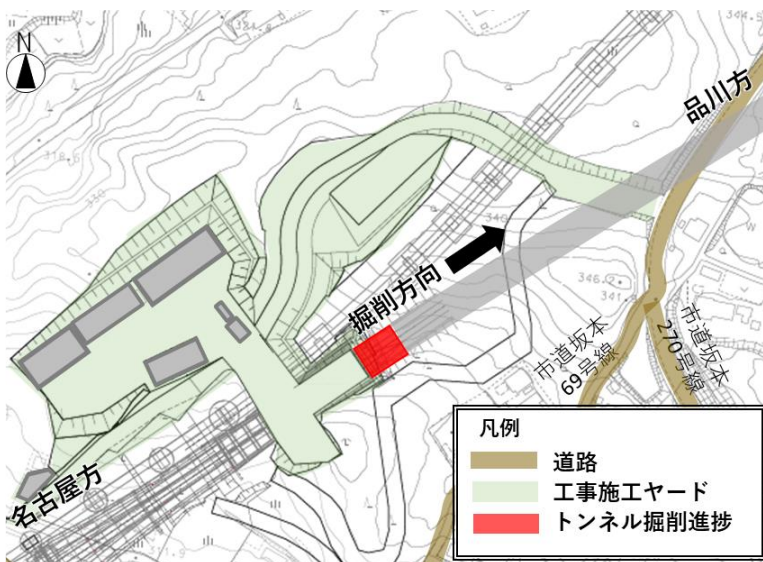


写真 トンネル掘削状況

【工事内容】

- ・本坑を品川方へ掘削しています。
7m分の掘削が完了しています。

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

5月

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

現場稼働日

休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）

住 所 中津川市駒場 2292

電 話 0573-64-2211

担当者 桑高、濱田、河竹、佐藤、岡本

駒場トンネル（名古屋方） 工事便り

2024年
4月
vol. 25

お知らせ

トンネル本体の工事が始まり、トンネルの入口（坑口）を設置する作業を進めております。坑口設置完了後、本格的にトンネル掘削を行っていきます。掘削作業に伴い、発生土の搬出作業も行っていきます。

引き続き、トンネル掘削作業では、細心の注意を払って施工いたします。また、材料搬入車両や発生土搬出車両など工事用車両通行時は安全運転を心掛けます。

工事状況等（2024年3月時点）

主に、トンネル本体工事を進めております。

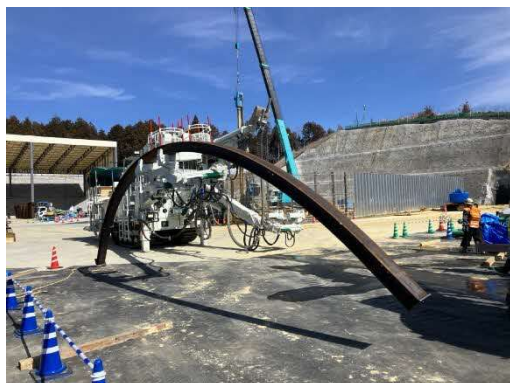


写真 トンネル使用機械



写真 トンネル坑口設置状況

【工事工程】

工 種	発生土の運搬先	4月	5月	6月
トンネル工	土地区画整理事業			

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

4月						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				
	現場稼働日		休工日			

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）

住 所 中津川市駒場 2292

電 話 0573-64-2211

担当者 桑高、濱田、河竹、佐藤、岡本
