

お知らせ

清水建設株式会社（単独）でリニア中央新幹線第一木曾川橋りょうほか新設工事を進めています。3月は、山口側ヤードでA1橋台下部工、P3橋脚竹割土留、P4橋脚岩盤掘削、瀬戸側ヤードで進入路整備と散水消雪基地整備を行います。

【お知らせ】

- 法定外道路(下図の赤色明示)を工事のため通行止めを行います。
通行止め期間 2023年3月～2027年12月(予定)
- 瀬戸側の作業に伴い大型車が県道6号を走行いたします。車両がスムーズにすれ違いできるように仮設信号機(センサー式)を設置しております。(稼働の時間 8:30～17:00)
3月は坂本地区への発生土運搬を行わないため、資機材搬入等で大型車両通行がある日のみ信号機を稼働させ、搬入車両の無い日は稼働いたしません。
※信号規制範囲外(進入路整備箇所⇄散水消雪基地)は発生土運搬を行います。大変ご不便をお掛けしますが、ご協力のほど宜しくお願い致します。
- 山口側のコンクリート打設に伴い、1日50台程度の大型車両(生コン車)が国道19号を往来いたします。大変ご不便をお掛けしますが、ご協力のほど宜しくお願い致します。
打設予定日時 2026年3月12日 8:00～16:30
※天候等の状況により、変更になる可能性があります。

今月の作業予定

【作業予定】

○山口側


- A1橋台
→下部工の鉄筋・型枠の組立とコンクリート打設を行います。
- P3橋脚
→竹割土留工を行います。
- P4橋脚
→橋脚設置個所において岩盤の掘削を行います。

○瀬戸側

- 進入路整備
→進入路の整備を行います。
- 散水消雪基地整備
→散水消雪基地の整備を行います。

【工程】

工種		3月	4月	5月
山口側	A1橋台 下部工	■	■	■
	P1橋脚 下部工		■	■
	P3橋脚 竹割土留	■	■	■
	P4橋脚 岩盤掘削	■	■	■
瀬戸側	進入路整備	■	■	■
	散水消雪基地整備	■		

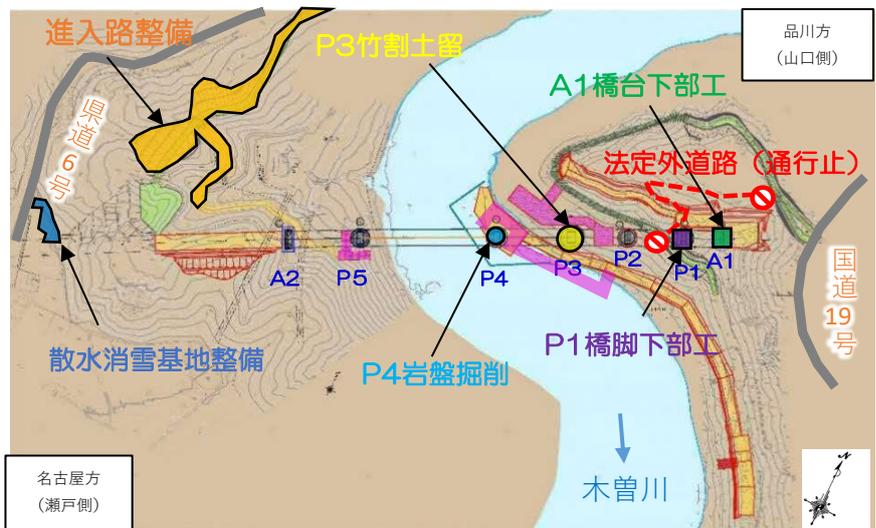

3月							休工予定
日	月	火	水	木	金	土	
1	2	3	4	5	6	7	
8	9	10	11	12	13	14	
15	16	17	18	19	20	21	
22	23	24	25	26	27	28	
29	30	31					

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

清水建設株式会社
第一木曾川橋りょう作業所
住所 中津川市落合2750-1 (株工ナ重機様敷地)
TEL: 0573-64-9077

担当 おざき 尾寄 , まさおか 政岡

しみずまんすりー

第一木曾川橋りょうほか新設工事

2026年
2月

回覧
Vol.39

お知らせ

清水建設株式会社（単独）でリニア中央新幹線第一木曾川橋りょうほか新設工事を進めています。2月は、山口側ヤードでA1橋台下部工、P3橋脚竹割土留、P4橋脚岩盤掘削、瀬戸側ヤードで進入路整備と散水消雪基地整備を行います。

【お知らせ】

- 法定外道路(下図の赤色明示)を工事のため通行止めを行います。
通行止め期間 2023年3月～2027年12月(予定)
- 瀬戸側の作業に伴い大型車が県道6号を走行いたします。車両がスムーズにすれ違いできるように仮設信号機(センサー式)を設置、運用を開始しています。(工事日8:30～17:00)
大変ご不便をお掛けしますが、ご協力のほど宜しくお願い致します。
- 山口側のコンクリート打設に伴い、1日100台程度の大型車両(生コン車)が国道19号を往来いたします。大変ご不便をお掛けしますが、ご協力のほど宜しくお願い致します。
打設予定日時 2026年2月3日及び18日 8:30～16:30
※天候等の状況により、変更になる可能性があります。

今月の作業予定

【作業予定】

○山口側


- A1橋台
→下部工の鉄筋・型枠の組立とコンクリート打設を行います。
- P3橋脚
→竹割土留工を行います。
- P4橋脚
→橋脚設置個所において岩盤の掘削を行います。

○瀬戸側

- 進入路整備
→進入路の整備を行います。
- 散水消雪基地整備
→散水消雪基地の整備を行います。

【工程】

工種		2月	3月	4月
山口側	A1橋台 下部工	■		
	P3橋脚 竹割土留	■		
	P4橋脚 岩盤掘削	■		
瀬戸側	進入路整備	■		
	散水消雪基地整備	■		

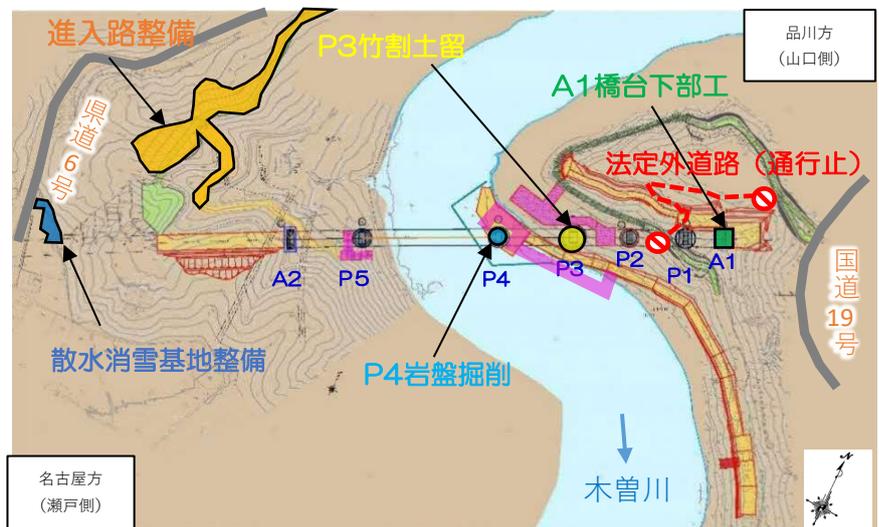

2月							休工予定
日	月	火	水	木	金	土	
1	2	3	4	5	6	7	
8	9	10	11	12	13	14	
15	16	17	18	19	20	21	
22	23	24	25	26	27	28	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

清水建設株式会社
第一木曾川橋りょう作業所
住所 中津川市落合2750-1 (株エナ重機様敷地)
TEL: 0573-64-9077

担当 おさき 尾寄 , まさおか 政岡

子どもたちに誇れるしごとを。
SHIMIZU CORPORATION
清水建設

お知らせ

清水建設株式会社（単独）でリニア中央新幹線第一木曾川橋りょうほか新設工事を進めています。1月は、山口側ヤードでA1橋台下部工、P3橋脚竹割土留、P4橋脚岩盤掘削、瀬戸側ヤードで進入路整備と散水消雪基地の造成を行います。

【お知らせ】

- 法定外道路(下図の赤色明示)を工事のため通行止めを行います。
通行止め期間 2023年3月~2027年12月(予定)
- 瀬戸側の作業に伴い大型車が県道6号を走行いたします。車両がスムーズにすれ違いできるように仮設信号機(センサー式)を設置、運用を開始しています。(工事日8:30~17:00)
 大変ご不便をお掛けしますが、ご協力のほど宜しくお願い致します。
- 年末年始は**12月27日(土)から1月4日(日)**まで休工とさせていただきます。

工事進捗状況等 (2025.12.9時点)

【進捗状況】

【工程】

工種		1月	2月	3月
山口側	A1橋台 下部工	■	■	■
	P3橋脚 竹割土留	■	■	■
	P4橋脚 岩盤掘削	■	■	■
瀬戸側	進入路整備	■	■	■
	散水消雪基地整備	■	■	■

○山口側

- A1橋台
 →下部工の足場・鉄筋・型枠の組立を行います。


- P3橋脚
 →竹割土留工を行います。

- P4橋脚
 →橋脚設置個所において岩盤の掘削を行います。

○瀬戸側

- 進入路整備
 →進入路の整備を行います。

- 散水消雪基地整備
 →散水消雪基地の整備を行います。

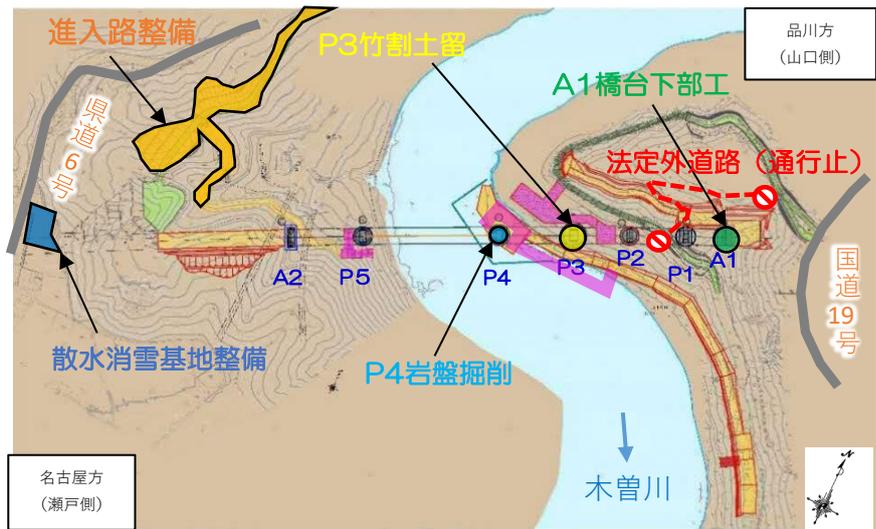

年末年始休工日：12/27(土)~1/4(日)

1月							休工予定
日	月	火	水	木	金	土	
28	29	30	31	1	2	3	
4	5	6	7	8	9	10	
11	12	13	14	15	16	17	
18	19	20	21	22	23	24	
25	26	27	28	29	30	31	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

清水建設株式会社

第一木曾川橋りょう作業所

住所 中津川市落合2750-1 (株エナ重機様敷地)

TEL：0573-64-9077

担当 おさき 尾奇 , まさおか 政岡

子どもたちに誇れるしごとを。

SHIMIZU CORPORATION
清水建設

お知らせ

清水建設株式会社（単独）でリニア中央新幹線第一木曾川橋りょうほか新設工事を進めています。12月は、山口側ヤードでA1橋台下部工、P3竹割土留、P4仮栈橋、P4岩盤掘削、瀬戸側ヤードで進入路整備を行います。

【お知らせ】

- 法定外道路(下図の赤色明示)を工事のため通行止めを行います。
通行止め期間 2023年3月~2027年12月(予定)
- 瀬戸側の作業に伴い大型車が県道6号を走行いたします。車両がスムーズにすれ違いできるように仮設信号機(センサー式)を設置、運用を開始しています。(工事日8:30~17:00)
 大変ご不便をお掛けしますが、ご協力のほど宜しくお願い致します。
- 年末年始は**12月27日(土)から1月4日(日)**まで休工とさせていただきます。

工事進捗状況等 (2025.11.5時点)

【進捗状況】

○山口側


- A1橋台
→下部工の足場・鉄筋の組立を行います。
- P3橋脚
→竹割土留工を行います。
- P4仮栈橋
→仮栈橋架設工を行います。
- P4橋脚
→橋脚設置個所において岩盤の掘削を行います。

○瀬戸側

- 進入路整備
→進入路の整備を行います。

【工程】

工種		12月	1月	2月
山口側	A1橋台 下部工	■	■	■
	P3橋脚 竹割土留	■	■	■
	P4橋脚 仮栈橋	■		
	P4橋脚 岩盤掘削	■	■	■
瀬戸側	進入路整備	■	■	■

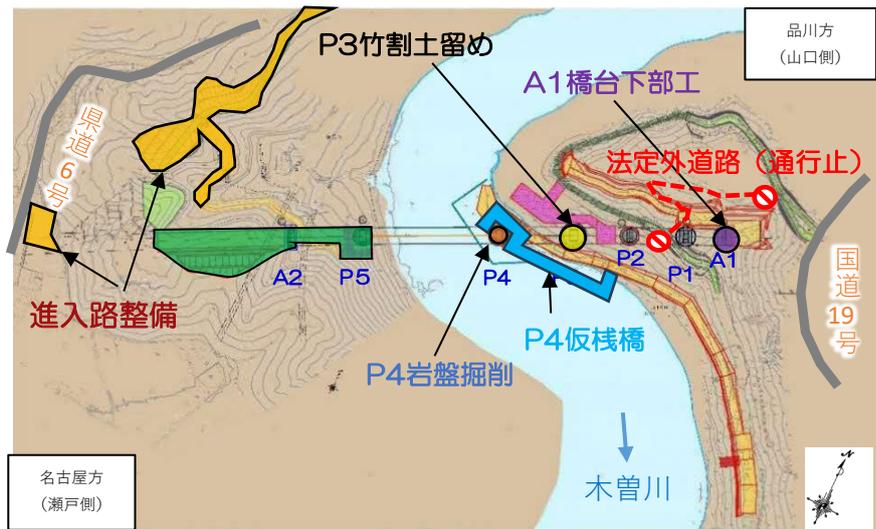

12月							休工予定
日	月	火	水	木	金	土	
30	1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13	
14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	
28	29	30	31	1	2	3	

年末年始休工日：12/27(土)~1/4(日)

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

清水建設株式会社
 第一木曾川橋りょう作業所
 住所 中津川市落合2750-1 (株エナ重機様敷地)
 TEL: 0573-64-9077

担当 おさき 尾崎 , まさおか 政岡

お知らせ

清水建設株式会社（単独）でリニア中央新幹線第一木曾川橋りょうほか新設工事を進めています。11月は、山口側ヤードでA1竹割土留、P3竹割土留、品川仮栈橋、P4仮栈橋、P4仮締切、P4岩盤掘削、瀬戸側ヤードで進入路整備、立木伐採を行います。

【お知らせ】

- 法定外道路(下図の赤色明示)を工事のため通行止めを行います。
通行止め期間 2023年3月～2027年12月(予定)
- 瀬戸側の作業に伴い大型車が県道6号を走行いたします。車両がスムーズにすれ違いできるように仮設信号機(センサー式)を設置、運用を開始しています。(工事日8:30～17:00)
- 瀬戸側現場入口前におきまして、県道6号(下図の赤色表示)の舗装を行うため、一部区間において片側交互通行といたします。
片側交互通行期間 2025年11月10日(月)～11月21日(金)のうち2日間 時間 8:30～17:00
 大変ご不便をお掛けしますがご協力のほど宜しくお願い致します。

工事進捗状況等 (2025.10.15時点)

【進捗状況】

○山口側


- A1橋台
→竹割土留工を行います。
- P3橋脚
→竹割土留工を行います。
- 品川仮栈橋・P4仮栈橋
→仮栈橋架設工事を行います。
- P4橋脚
→仮締切の設置を行います。
→岩盤の掘削を行います。

○瀬戸側

- 進入路整備
→進入路の整備を行います。
- 立木伐採
→土工作業に支障する立木の伐採・除根を行います。

【工程】

工種	11月	12月	1月
山口側	A1橋台 竹割土留		
	A1橋台 下部工		
	P3橋脚 竹割土留		
	品川方 仮栈橋		
	P4橋脚 仮栈橋		
	P4橋脚 仮締切		
	P4橋脚 岩盤掘削		
瀬戸側	進入路整備		
	立木伐採		

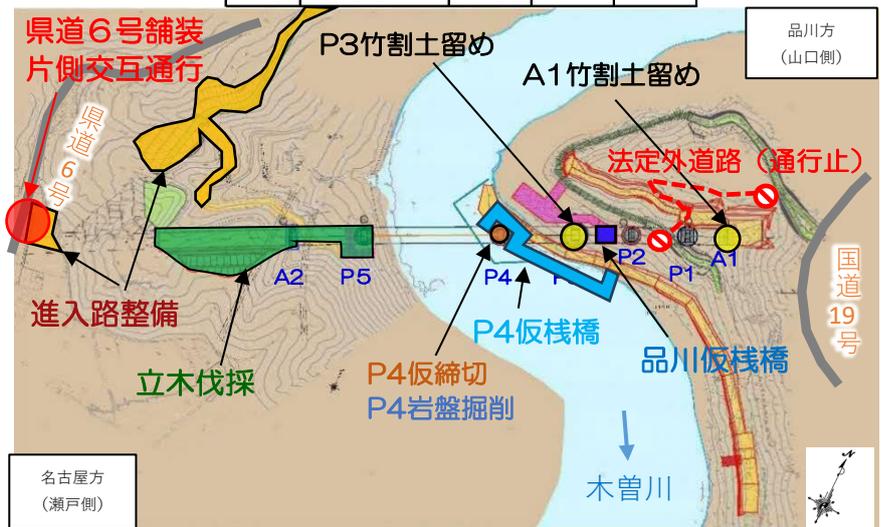

11月							休工予定
日	月	火	水	木	金	土	
						1	
2	3	4	5	6	7	8	
9	10	11	12	13	14	15	
16	17	18	19	20	21	22	
23	24	25	26	27	28	29	
30							

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

清水建設株式会社
 第一木曾川橋りょう作業所
 住所 中津川市落合2750-1 (株エナ重機様敷地)
 TEL: 0573-64-9077
 担当 おさき まさおか
 尾崎 , 政岡

しみずまんすりー

10月

第一木曾川橋りょうほか新設工事

お知らせ

清水建設株式会社（単独）でリニア中央新幹線第一木曾川橋りょうほか新設工事を進めています。10月は、山口側ヤードでA1竹割土留、P3竹割土留、品川仮栈橋、P4仮栈橋、P4仮締切、瀬戸側ヤードで進入路整備、立木伐採を行います。

【お知らせ】

- 法定外道路(下図の赤色明示) を工事のため通行止めを行います。
通行止め期間 令和5年3月～令和9年12月(予定)
- 瀬戸側の作業に伴い大型車が県道6号を走行いたします。車両がスムーズにすれ違いできるように仮設信号機(センサー式)を設置、運用を開始しています。(工事日8:30~17:00)
 大変ご不便をお掛けしますがご協力のほど宜しくお願い致します。

工事進捗状況等 (2025.9.4時点)

【進捗状況】

○山口側


- A1橋台
→竹割土留め工を行います。
- P3橋脚
→竹割土留め工を行います。
- 品川仮栈橋・P4仮栈橋
→仮栈橋架設工事を行います。
- P4仮締切
→橋脚箇所において仮締切の設置を行います。

○瀬戸側

- 進入路整備
→進入路の整備を行います。
- 立木伐採
→土工事作業に支障する立木の伐採・除根を行います。

【工程】

工種	10月	11月	12月
A1橋台 竹割式土留 (山口側)	■		
A1橋台 下部工 (山口側)		■	■
P3橋脚 竹割式土留 (山口側)	■	■	■
品川方 仮栈橋 (山口側)	■	■	■
P4橋脚 仮栈橋 (山口側)	■	■	■
P4橋脚 仮締切 (山口側)	■	■	
進入路整備 (瀬戸側)	■	■	■
立木伐採 (瀬戸側)	■	■	■

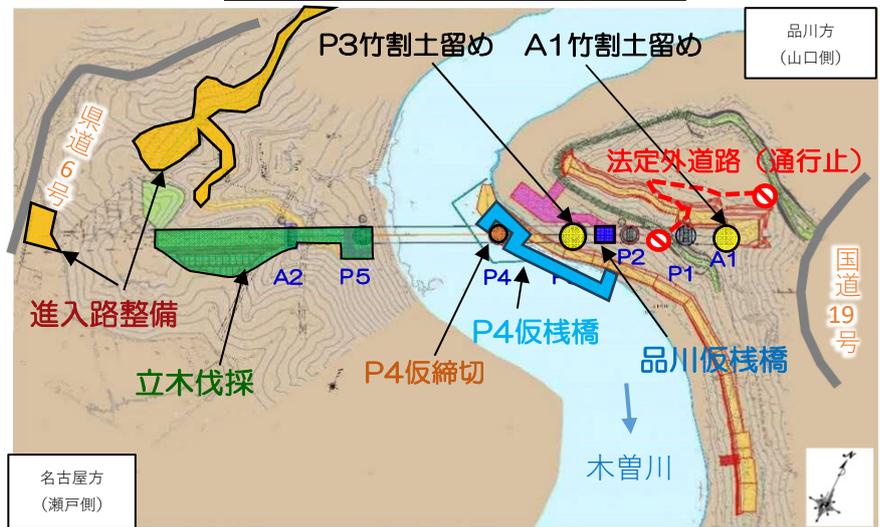

10月							休工予定
日	月	火	水	木	金	土	
28			1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11	
12	13	14	15	16	17	18	
19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29	30	31		

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

清水建設株式会社
 第一木曾川橋りょう作業所
 住所 中津川市落合2750-1 (株エナ重機様敷地)
 TEL: 0573-64-9077
 担当 おざき 尾崎 , まさおか 政岡

しみずまんすりー

9月

第一木曾川橋りょうほか新設工事

Vol.34

お知らせ

清水建設株式会社（単独）でリニア中央新幹線第一木曾川橋りょうほか新設工事を進めています。9月は、山口側ヤードでA1竹割土留、品川仮栈橋、P4仮栈橋、P4仮締切、瀬戸側ヤードで進入路整備、立木伐採を行います。

【お知らせ】

- ・法定外道路(下図の赤色明示)を工事のため通行止めを行います。
通行止め期間 令和5年3月～令和9年12月(予定)
- ・瀬戸側の作業に伴い大型車が県道6号を走行いたします。車両がスムーズにすれ違いできるように仮設信号機(センサー式)を設置、運用を開始しています。(工事日8:30~17:00)
 大変ご不便をお掛けしますがご協力のほど宜しくお願い致します。

工事進捗状況等(2025.8.4時点)

【進捗状況】

○山口側


- ・A1橋台
 →竹割土留め工を行います。
- ・品川仮栈橋・P4仮栈橋
 →仮栈橋の架設工事を行います。
- ・P4仮締切
 →橋脚箇所において仮締切の設置を行います。

○瀬戸側

- ・進入路整備
 →進入路の整備を行います。
- ・立木伐採
 →土工事作業に支障する立木の伐採・除根を行います。

【工程】

工種	9月	10月	11月
A1橋台 行割式土留(山口側)	■	■	
A1橋台 下部工(山口側)			■
P3橋脚 行割式土留(山口側)		■	■
品川方 仮栈橋(山口側)	■	■	■
P4橋脚 仮栈橋(山口側)	■	■	■
P4橋脚 仮締切(山口側)	■	■	■
進入路整備(瀬戸側)	■	■	■
立木伐採(瀬戸側)	■	■	■

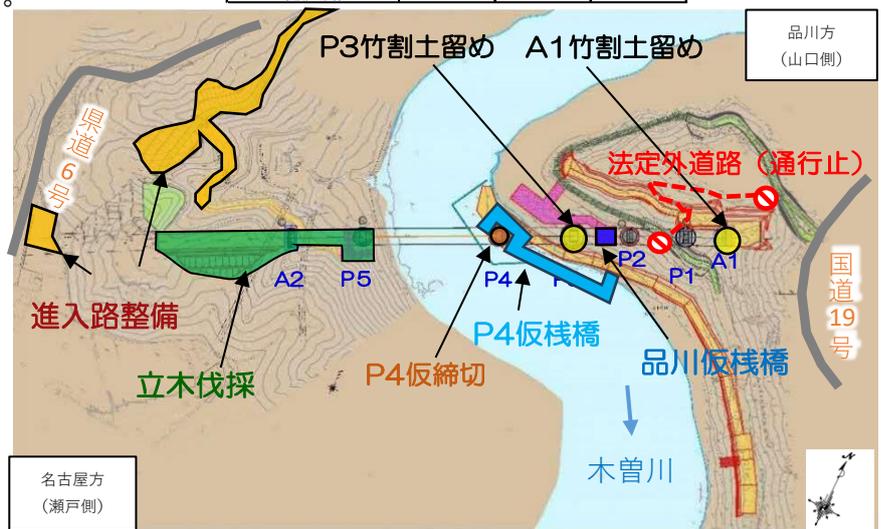

	9月						休工予定
日	月	火	水	木	金	土	
31	1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13	
14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	
28	29	30					

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

清水建設株式会社
 第一木曾川橋りょう作業所
 住所 中津川市落合2750-1 (株エナ重機様敷地)
 TEL: 0573-64-9077

担当 おさき 尾奇 , まさおか 政岡



しみずまんすりー

8月

第一木曾川橋りょうほか新設工事

Vol.33

お知らせ

清水建設株式会社（単独）でリニア中央新幹線第一木曾川橋りょうほか新設工事を進めています。8月は、山口側ヤードでA1竹割土留め工、品川・P4仮栈橋工、P4仮締切、瀬戸側ヤードで進入路整備、立木伐採工を行います。

【お知らせ】

- 法定外道路(下図の赤色明示) を工事のため通行止めを行います。
通行止め期間 令和5年3月～令和9年12月(予定)
- 瀬戸側の作業に伴い大型車が県道6号を走行いたします。車両がスムーズにすれ違いできるように仮設信号機(センサー式)を設置、運用を開始しています。(工事日8:30~17:00)
 大変ご不便をお掛けしますがご協力のほど宜しくお願い致します。

工事進捗状況等 (2025.7.17時点)

【進捗状況】

【工程】


工 種	8月	9月	10月
A1橋台 竹割式土留 (山口側)	■	■	■
品川仮栈橋 (山口側)	■	■	
P4橋脚 仮栈橋 (山口側)	■	■	■
P4橋脚 仮締切 (山口側)	■	■	■
進入路 (瀬戸側)	■	■	■
立木伐採工 (瀬戸側)	■	■	■

○山口側

- A1橋台
→竹割土留め工を行います。
- 品川仮栈橋・P4仮栈橋
→仮栈橋の架設工事を行います。
- P4仮締切
→橋脚箇所において仮締切の設置を行います。

○瀬戸側

- 進入路整備
→進入路の整備を行います。
- 立木伐採工
→土工事作業に支障する立木の伐採・除根を行います。

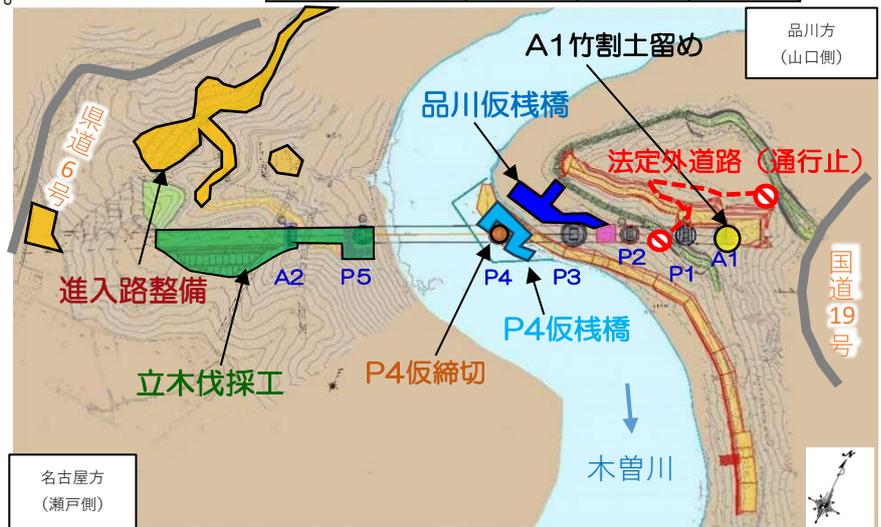

8月							休工予定
日	月	火	水	木	金	土	
27					1	2	
3	4	5	6	7	8	9	
10	11	12	13	14	15	16	
17	18	19	20	21	22	23	
24	25	26	27	28	29	30	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

清水建設株式会社
 第一木曾川橋りょう作業所
 住所 中津川市落合2750-1 (株エナ重機様敷地)
 TEL: 0573-64-9077

担当 おさき 尾奇 , まさおか 政岡



お知らせ

清水建設株式会社（単独）でリニア中央新幹線第一木曾川橋りょうほか新設工事を進めています。7月は、山口側ヤードでA1竹割土留め工、品川・P4仮栈橋工、P4仮締切、瀬戸側ヤードで進入路整備、立木伐採工を行います。

【お知らせ】

- 法定外道路(下図の赤色明示) を工事のため通行止めを行います。
通行止め期間 令和5年3月～令和9年12月(予定)
- 瀬戸側の作業に伴い大型車が県道6号を走行いたします。車両がスムーズにすれ違いできるように仮設信号機(センサー式)を設置、運用を開始しています。(工事日8:30~17:00)
 大変ご不便をお掛けしますがご協力のほど宜しくお願い致します。

工事進捗状況等 (2025.6.20時点)

【進捗状況】

【工程】


工種	7月	8月	9月
A1橋台(山口側)	A1竹割土留め		
品川仮栈橋(山口側)	品川仮栈橋工		
P4橋脚 仮栈橋(山口側)	P4仮栈橋		
P4橋脚 仮締切(山口側)	P4仮締切		
進入路(瀬戸側)	進入路整備		
立木伐採工(瀬戸側)	伐採工		

○山口側

- A1橋台
→竹割土留め工を行います。
- 品川仮栈橋・P4仮栈橋
→仮栈橋の架設工事を行います。
- P4仮締切
→橋脚箇所において仮締切の設置を行います。

○瀬戸側

- 進入路整備
→進入路の整備を行います。
- 立木伐採工
→土工事作業に支障する立木の伐採・除根を行います。

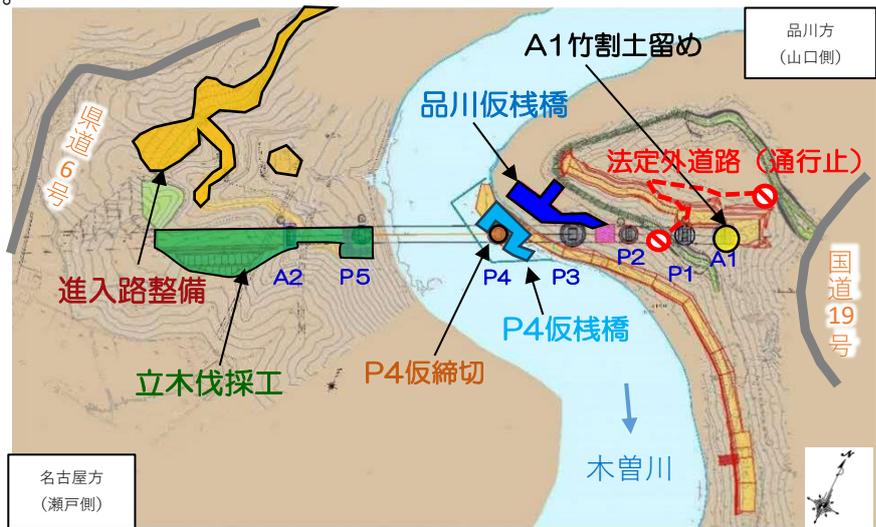

7月							休工予定
日	月	火	水	木	金	土	
29		1	2	3	4	5	
6	7	8	9	10	11	12	
13	14	15	16	17	18	19	
20	21	22	23	24	25	26	
27	28	29	30	31			

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

清水建設株式会社
 第一木曾川橋りょう作業所
 住所 中津川市落合2750-1 (株工ナ重機様敷地)
 TEL: 0573-64-9077

担当 せき 關, おさき 尾寄, まさおか 政岡



しみずまんすりー

6月

第一木曾川橋りょうほか新設工事

Vol.31

お知らせ

清水建設株式会社（単独）でリニア中央新幹線第一木曾川橋りょうほか新設工事を進めています。6月は、山口側ヤードでA1竹割土留め工、品川・P4仮栈橋工、P4仮締切、瀬戸側ヤードで進入路整備を行います。

【お知らせ】

- ・法定外道路(下図の赤色明示) を工事のため通行止めを行います。
通行止め期間 令和5年3月～令和9年12月(予定)
- ・瀬戸側の作業に伴い大型車が県道6号を走行いたします。車両がスムーズにすれ違いできるように仮設信号機(センサー式)を設置、運用を開始しています。(工事日8:30~17:00)
 大変ご不便をお掛けしますがご協力のほど宜しくお願い致します。

工事進捗状況等 (2025.5.19時点)

【進捗状況】

【工程】


工種	6月	7月	8月
A1橋台 (山口側)	A1竹割土留め		
品川仮栈橋 (山口側)	品川仮栈橋工		
P4橋脚 仮栈橋 (山口側)	P4仮栈橋		
P4橋脚 仮締切 (山口側)	P4仮締切		
進入路 (瀬戸側)	進入路整備		

○山口側

- ・A1橋台
→竹割土留め工を行います。
- ・品川仮栈橋・P4仮栈橋
→仮栈橋の架設工事を行います。
- ・P4仮締切
→橋脚箇所において仮締切の設置を行います。

○瀬戸側

- ・進入路整備
→進入路の整備を行います。

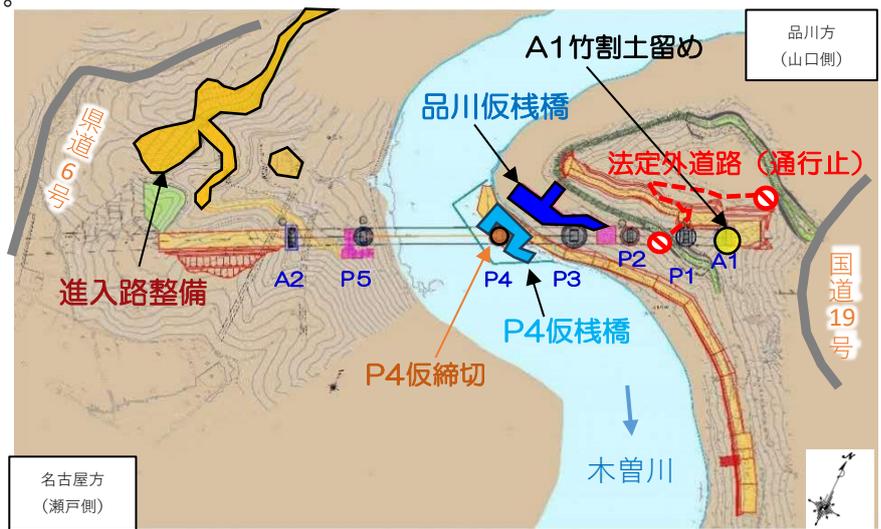

6月							休工予定
日	月	火	水	木	金	土	
1	2	3	4	5	6	7	
8	9	10	11	12	13	14	
15	16	17	18	19	20	21	
22	23	24	25	26	27	28	
29	30						

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

清水建設株式会社
 第一木曾川橋りょう作業所
 住所 中津川市落合2750-1 (株エナ重機様敷地)
 TEL: 0573-64-9077

担当 せき 関, おざき 尾崎, まさおか 政岡

お知らせ

清水建設株式会社（単独）でリニア中央新幹線第一木曾川橋りょうほか新設工事を進めています。5月は、山口側ヤードでA1竹割土留め工、品川・P4仮栈橋工、P4進入路整備、瀬戸側ヤードで進入路整備を行います。

【お知らせ】

- 法定外道路(下図の赤色明示)を工事のため通行止めを行います。
通行止め期間 令和5年3月~令和9年12月(予定)
- 瀬戸側の作業に伴い大型車が県道6号を走行いたします。車両がスムーズにすれ違いできるように仮設信号機(センサー式)を設置、運用を開始しています。(工事日8:30~17:00)
 大変ご不便をお掛けしますがご協力のほど宜しくお願い致します。

GW休工予定：4/26(土)~5/6(火)

工事進捗状況等 (2025.4.15時点)

【進捗状況】

【工程】


工種	5月	6月	7月
A1橋台 (山口側)	A1竹割土留め		
品川仮栈橋 (山口側)	品川仮栈橋工		
P4橋脚 仮栈橋・仮締切 (山口側)	P4仮栈橋工		
		P4仮締切工	
P4進入路 (山口側)	進入路整備		
進入路 (瀬戸側)	進入路整備		

○山口側

- A1橋台
→竹割土留め工を行います。
- 品川仮栈橋・P4仮栈橋
→仮栈橋の架設工事を行います。
- P4進入路整備
→進入路の整備を行います。

○瀬戸側

- 進入路整備
→進入路の整備を行います。

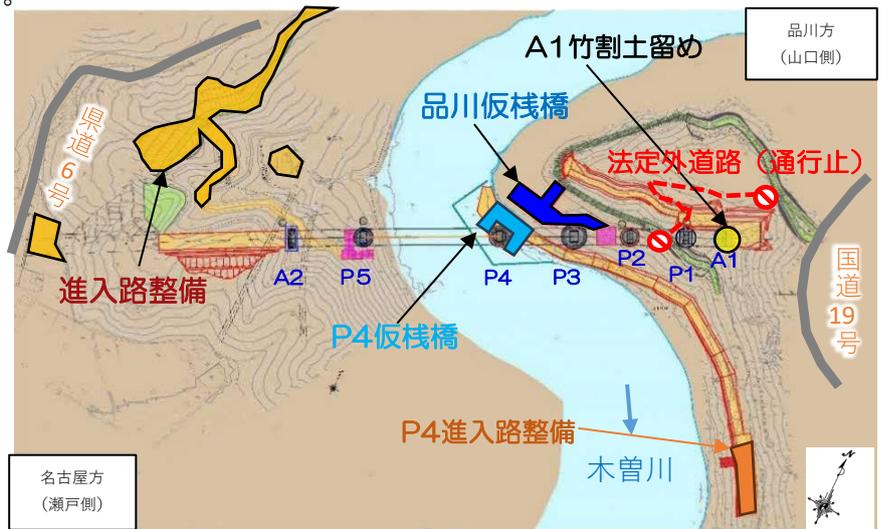

5月						休工予定
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

清水建設株式会社
 第一木曾川橋りょう作業所
 住所 中津川市落合2750-1 (株エナ重機様敷地)
 TEL: 0573-64-9077

担当 せき 関, おさき 尾寄, まさおか 政岡



しみずまんすりー

4月

第一木曾川橋りょうほか新設工事

Vol.29

お知らせ

清水建設株式会社（単独）でリニア中央新幹線第一木曾川橋りょうほか新設工事を進めています。4月は、山口側ヤードでA1・P1竹割土留め工、品川・P4仮栈橋工、瀬戸側ヤードで進入路整備を行います。

【お知らせ】

- 法定外道路(下図の赤色明示)を工事のため通行止めを行います。
通行止め期間 令和5年3月~令和9年12月(予定)
- 瀬戸側の作業に伴い大型車が県道6号を走行いたします。車両がスムーズにすれ違いできるように仮設信号機(センサー式)を設置、運用を開始しています。**(工事日8:30~17:00)**
 大変ご不便をお掛けしますがご協力のほど宜しくお願い致します。

GW休工予定：4/26(土)~5/6(火)

工事進捗状況等(2025.3.15時点)

【進捗状況】

【工程】


工種	4月	5月	6月
A1橋台(山口側)	A1竹割土留め		
P1橋脚(山口側)	P1竹割土留め		
品川仮栈橋(山口側)	品川仮栈橋工		
P4橋脚 仮栈橋(山口側)	P4仮栈橋工		
P4進入路(山口側)	進入路整備		
進入路(瀬戸側)	進入路整備		

○山口側

- A1・P1
→竹割土留め工を行います。
- 品川仮栈橋・P4仮栈橋
→仮栈橋の架設工事を行います。
- P4進入路整備
→進入路の整備を行います。

○瀬戸側

- 進入路整備
→進入路および沈砂池の整備を行います。

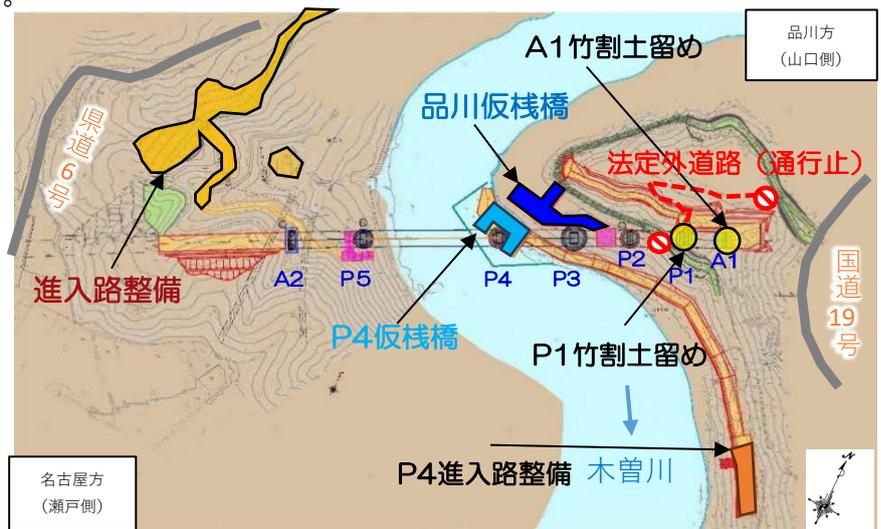

4月							休工予定
日	月	火	水	木	金	土	
		1	2	3	4	5	
6	7	8	9	10	11	12	
13	14	15	16	17	18	19	
20	21	22	23	24	25	26	
27	28	29	30	1	2	3	
4	5	6					

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

清水建設株式会社
 第一木曾川橋りょう作業所
 住所 中津川市落合2750-1(株エナ重機様敷地)
 TEL: 0573-64-9077

担当 せき 關, おさき 尾寄, まさおか 政岡
