

中央新幹線自立式ガイドウェイ側壁 製作保管（中津川地区）工事だより

2026年
3月
vol. 42

お知らせ

中央新幹線ガイドウェイ資材置場ヤード内にて舗装工、ガイドウェイ搬入工、電気部品保管工、電気部品取付工、ガイドウェイ保管工の工事を進めます。

工事に伴い資材等の運搬を予定していますので、交通マナーや交通ルールを守り工事を進めます。地域のみなさまにはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

現場状況等（2026. 2. 6日時点）

- ・舗装工：工事ヤード内の舗装をしています。
- ・電気部品保管工、電気部品取付工：電気部品を搬入・保管・取付しています。
- ・ガイドウェイ搬入工、ガイドウェイ保管工：ガイドウェイを搬入・保管しています。



ガイドウェイ保管・電気部品取付状況



本工事の工事範囲

【工事工程】

工 種	3月	4月	5月	備考
舗装工				工事ヤード内の舗装を行います。
ガイドウェイ搬入工				ガイドウェイを搬入します。
電気部品保管工				電気部品を搬入、保管します。
電気部品取付工				テント内で電気部品の取付を行います。
ガイドウェイ保管工				ガイドウェイを保管します。

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

3月						
日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

□ 現場稼働日 □ 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

・舗装工、ガイドウェイ搬入工、ガイドウェイ保管工
三井住友建設・ジェイアール東海建設JV 担当：池田

住所 中津川市千旦林1574地内

電話 0573-78-2515

・電気部品保管工、電気部品取付工

JR東海テクノクリエイト(株) 担当：古川

住所 中津川市千旦林1574地内

電話 0573-89-0110

中央新幹線自立式ガイドウェイ側壁 製作保管（中津川地区）工事だより

2026年
2月
vol. 41

お知らせ

中央新幹線ガイドウェイ資材置場ヤード内にて舗装工、ガイドウェイ保管工、電気部品取付工、電気部品保管工の工事を進めます。

工事に伴い資材等の運搬を予定していますので、交通マナーや交通ルールを守り工事を進めます。地域のみなさまにはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

現場状況等（2026. 1. 7日時点）

- ・基礎工・舗装工：コンクリートで基礎を構築し、工事ヤード内の舗装をしています。
- ・電気部品保管工：電気部品を搬入・保管しています。



基礎工・電気部品取付テント等設置



本工事の工事範囲

【工事工程】

工 種	2月	3月	4月	備考
舗装工				工事ヤード内の舗装を行います。
ガイドウェイ搬入工				ガイドウェイを搬入します。
電気部品保管工				電気部品を搬入、保管します。
電気部品取付工				テント内で電気部品の取付を行います。
ガイドウェイ保管工				ガイドウェイを保管します。

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

2月						
日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

□ 現場稼働日 ■ 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

・舗装工、ガイドウェイ搬入工、ガイドウェイ保管工
三井住友建設・ジェイアール東海建設JV 担当：池田

住所 中津川市千旦林1574地内

電話 0573-78-2515

・電気部品保管工、電気部品取付工

JR東海テクノクリエイト(株) 担当：古川

住所 中津川市千旦林1574地内

電話 0573-89-0110

中央新幹線自立式ガイドウェイ側壁 製作保管（中津川地区）工事だより

2026年
1月
vol. 40

お知らせ

中央新幹線ガイドウェイ資材置場ヤード内にて基礎工・舗装工、電気部品保管工の工事を進めます。

工事に伴い資材等の運搬を予定していますので、交通マナーや交通ルールを守り工事を進めます。地域のみなさまにはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

現場状況等（2025. 12. 8日時点）

- ・基礎工・舗装工：コンクリートで基礎を構築し、工事ヤード内の舗装をしています。
- ・電気部品保管工：電気部品を搬入・保管しています。



基礎工・電気部品取付テント等設置



本工事の工事範囲

【工事工程】

工 種	1 月	2 月	3 月	備考
基礎工・舗装工				コンクリートで基礎を構築し、工事ヤード内の舗装を行います。
ガイドウェイ保管工				ガイドウェイを搬入、保管します。
電気部品取付工				テント内で電気部品の取付を行います。
電気部品保管工				電気部品を搬入、保管します。

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

1月

日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

□ 現場稼働日 ■ 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

・基礎工・舗装工、ガイドウェイ保管工
三井住友建設・ジェイアール東海建設JV 担当：池田

住所 中津川市千旦林1574地内

電話 0573-78-2515

・電気部品取付工、電気部品保管工

JR東海テクノクリエイト(株) 担当：古川

住所 中津川市千旦林1574地内

電話 0573-89-0110

中央新幹線自立式ガイドウェイ側壁 製作保管（中津川地区）工事だより

2025年
12月
vol. 39

お知らせ

中央新幹線ガイドウェイ資材置場ヤード内にて基礎工、舗装工、電気部品取付準備の工事を進めます。

工事に伴い資材等の運搬を予定していますので、交通マナーや交通ルールを守り工事を進めます。地域のみなさまにはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

現場状況等（2025. 11. 7日時点）

- ・基礎工：コンクリートで基礎を構築をします。
- ・舗装工：工事ヤード内の舗装を行います。
- ・電気部品取付準備工：電気部品取付の準備を行います。



基礎工設置状況



本工事の工事範囲

【工事工程】

工 種	12月	1月	2月	備考
基礎工				コンクリートで基礎を構築します。
舗装工				工事ヤード内の舗装を行います。
電気部品取付準備工				電気部品取付の準備を行います。

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

12月

日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

□ 現場稼働日 ■ 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

- ・基礎工 ・舗装工
三井住友建設・ジェイアール東海建設JV 担当：池田
住所 中津川市千旦林1574地内
電話 0573-78-2515
- ・電気部品取付準備工
JR東海テクノクリエイト(株) 担当：古川
住所 中津川市千旦林1574地内
電話 0573-89-0110

中央新幹線自立式ガイドウェイ側壁 製作保管（中津川地区）工事だより

2025年
11月
vol. 38

お知らせ

中央新幹線ガイドウェイ資材置場ヤード内にて基礎工、舗装工、電気部品取付テント内機械設備設置、事務所設置の工事を進めます。

工事に伴い資材等の運搬を予定していますので、交通マナーや交通ルールを守り工事を進めます。地域のみなさまにはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

現場状況等（2025. 10. 6日時点）

- ・盛土工（他工事発生日）：搬入した土で掘削部を盛土しています。
- ・電気部品取付テント内機械設備設置：電気部品取付テント内で機械設備を設置しています。
- ・事務所設置：電気部品取付関係の事務所を7月から設置しています。



盛土工・電気部品取付テント等設置



本工事の工事範囲

【工事工程】

工 種	11月	12月	1月	備考
基礎工				コンクリートで基礎を構築します。
舗装工				工事ヤード内の舗装を行います。
電気部品取付テント内機械設備設置				電気部品取付テント内に機械設備を設置します。
事務所設置				電気部品取付関係の事務所を設置します。

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

11月						
日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

現場稼働日 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

- ・基礎工 ・舗装工
三井住友建設・ジェイアール東海建設JV 担当：池田
住所 中津川市千旦林1574地内
電話 0573-78-2515
- ・電気部品取付テント内機械設備設置工事
- ・事務所設置
JR東海テクノクリエイト(株) 担当：古川
住所 中津川市千旦林1574地内
電話 0573-89-0110

中央新幹線自立式ガイドウェイ側壁 製作保管（中津川地区）工事だより

2025年
10月
vol. 37

お知らせ

中央新幹線ガイドウェイ資材置場ヤード内にて盛土工、基礎工、電気部品取付テント内機械設備設置、事務所設置の工事を進めます。

工事に伴い資材等の運搬を予定していますので、交通マナーや交通ルールを守り工事を進めます。地域のみなさまにはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

現場状況等（2025. 9. 8日時点）

- ・盛土工（他工事発生土）：搬入した土で掘削部を盛土しています。
- ・電気部品取付テント内機械設備設置：電気部品取付テント内で機械設備を設置します。
- ・事務所設置：電気部品取付関係の事務所を7月から設置しています。



盛土工・電気部品取付テント等設置



本工事の工事範囲

【工事工程】

工 種	10月	11月	12月	備考
盛土工（他工事発生土）				主にトンネル発生土をダンプで搬入し盛土します。
基礎工				コンクリートで基礎を構築します。
電気部品取付けテント内機械設備設置				電気部品取付テント内に機械設備を設置します。
事務所設置				電気部品取付関係の事務所を設置します。

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

10月						
日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
			現場稼働日			休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

- ・盛土工 ・基礎工
三井住友建設・ジェイアール東海建設JV 担当：池田
住所 中津川市千旦林1574地内
電話 0573-78-2515
- ・電気部品取付テント内機械設備設置工事
・事務所設置
東海交通機械(株) 担当：古川
(10/1～社名変更 JR東海テクノクリエイト(株))
住所 中津川市千旦林1574地内
電話 0573-89-0110

中央新幹線自立式ガイドウェイ側壁 製作保管（中津川地区）工事だより

2025年
9月
vol. 36

お知らせ

中央新幹線ガイドウェイ資材置場ヤード内にて盛土工、電気部品取付テント等設置、事務所設置の工事を進めます。


工事に伴い資材等の運搬を予定していますので、交通マナーや交通ルールを守り工事を進めます。地域のみなさまにはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

現場状況等（2025. 8. 7日時点）

- ・盛土工（他工事発生土）：搬入した土で掘削部を盛土しています。
- ・電気部品取付テント等設置：電気部品取付テント等の構築をしています。
- ・事務所設置：電気部品取付関係の事務所を7月から設置しています。



盛土工・電気部品取付テント等設置

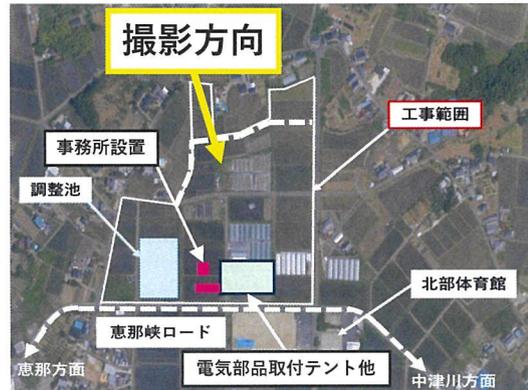

本工事の工事範囲

【工事工程】

工 種	9月	10月	11月	備考
盛土工（他工事発生土）				主にトンネル発生土をダンプで搬入し盛土します。
電気部品取付テント等設置				電気部品取付テント等の設置をします。
事務所設置				電気部品取付関係の事務所を設置します。

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

9月

日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

現場稼働日
 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

- ・盛土工
三井住友建設・ジェイアール東海建設JV 担当：池田
住所 中津川市千旦林1574地内
電話 0573-78-2515
- ・電気部品取付テント等設置工
ジェイアール東海建設 中津川作業所 担当：熊田
電話 0573-67-7167
- ・事務所設置
郡リース 担当：須崎
住所 名古屋市中村区那古野1-38-1 星光桜通りビル
電話 052-551-1661
- ・電気部品取付テント内機械設備設置工事
東海交通機械 担当：古川
住所 中津川市千旦林1574地内
電話 090-4850-0153

中央新幹線自立式ガイドウェイ側壁 製作保管（中津川地区）工事だより

2025年
8月
vol. 35

お知らせ

中央新幹線ガイドウェイ資材置場ヤード内にて盛土工、電気部品取付テント等設置、事務所設置の工事を進めます。


工事に伴い資材等の運搬を予定していますので、交通マナーや交通ルールを守り工事を進めます。地域のみなさまにはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

現場状況等（2025. 7. 14日時点）

- ・盛土工（他工事発生土）：搬入した土で掘削部を盛土しています。
- ・電気部品取付テント等設置：電気部品取付テント等の構築をしています。
- ・事務所設置：電気部品取付関係の事務所を7月から設置しています。



盛土工・電気部品取付テント等設置

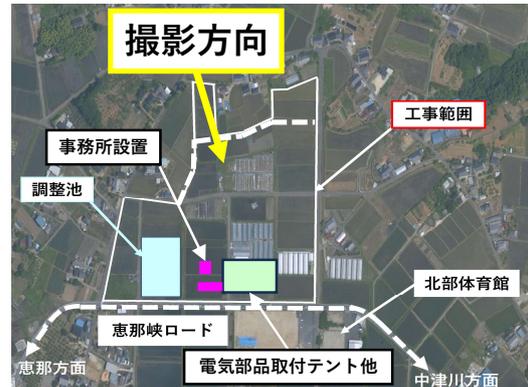

本工事の工事範囲

【工事工程】

工 種	8月	9月	10月	備考
盛土工（他工事発生土）	■	■	■	主にトンネル発生土をダンプで搬入し盛土します。
電気部品取付けテント等設置	■	■	■	電気部品取付テント等の設置をします。
事務所設置	■	■	■	電気部品取付関係の事務所を設置します。

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

8月						
日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
		現場稼働日				休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

- ・盛土工
三井住友建設・ジェイアール東海建設JV 担当：池田
住所 中津川市千旦林1574地内
電話 0573-78-2515
- ・電気部品取付テント等設置工
ジェイアール東海建設 中津川作業所 担当：熊田
電話 0573-67-7167
- ・事務所設置
郡リース 担当：須崎
住所 名古屋市中村区那古野1-38-1 星光桜通りビル
電話 052-551-1661
- ・電気部品取付テント内機械設備設置工事
東海交通機械 担当：古川
住所 名古屋市中村区名駅南1-23-23 新笹島ビル7F
電話 090-4850-0153

中央新幹線自立式ガイドウェイ側壁 製作保管（中津川地区）工事だより

2025年
7月
vol. 34

お知らせ

中央新幹線ガイドウェイ資材置場ヤード内にて盛土工、電気部品取付テント等設置、事務所設置の工事を進めます。


工事に伴い資材等の運搬を予定していますので、交通マナーや交通ルールを守り工事を進めます。地域のみなさまにはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

現場状況等（2025. 6. 14日時点）

- 盛土工（他工事発生土）：搬入した土で掘削部を盛土しています。
- 電気部品取付テント等設置：電気部品取付テント等の構築をしています。
- 事務所設置：電気部品取付関係の事務所を7月から設置します。



盛土工

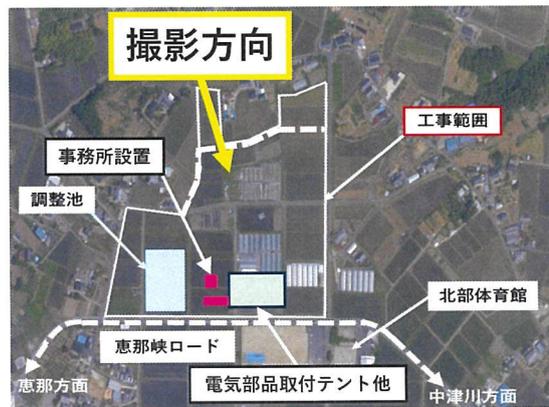

本工事の工事範囲

【工事工程】

工種	7月	8月	9月	備考
盛土工（他工事発生土）				主にトンネル発生土をダンプで搬入し盛土します。
電気部品取付けテント等設置				電気部品取付テント等の設置をします。
事務所設置				電気部品取付関係の事務所を設置します。

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

7月						
日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
		現場稼働日		休日		

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

- 盛土工
三井住友建設・ジェイアール東海建設JV 担当：池田
住所 中津川市千旦林1574地内
電話 0573-78-2515
- 電気部品取付テント等設置工
ジェイアール東海建設 中津川作業所 担当：熊田
電話 0573-67-7167
- 事務所設置
郡リース 担当：須崎
住所 名古屋市中村区那古野1-38-1 星光桜通りビル
電話 052-551-1661

中央新幹線自立式ガイドウェイ側壁 製作保管（中津川地区）工事だより

2025年
6月
vol. 33

お知らせ


中央新幹線ガイドウェイ資材置場ヤード内にて盛土工、電気部品取付テント等設置の工事を進めます。
工事に伴い資材等の運搬を予定していますので、交通マナーや交通ルールを守り工事を進めます。地域のみなさまにはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

現場状況等（2025. 5. 15日時点）

- ・盛土工（他工事発生土）：搬入した土で掘削部を盛土しています。
- ・電気部品取付テント等設置工：電気部品取付テント等の構築をしています。



盛土工

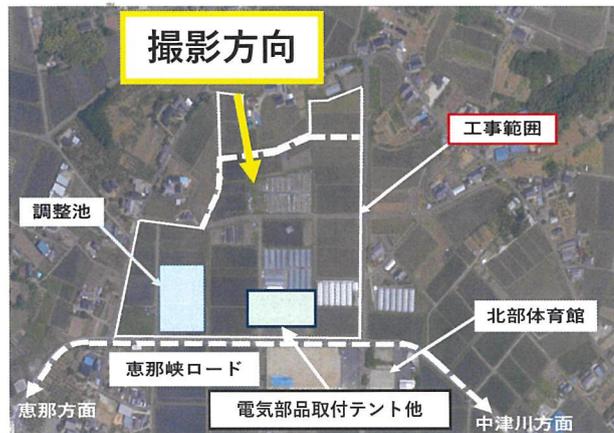

本工事の工事範囲

【工事工程】

工 種	6月	7月	8月	備考
盛土工（他工事発生土）	■			主にトンネル発生土をダンプで搬入し盛土します。
電気部品取付けテント等設置工	■			電気部品取付テント等の設置をします。

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

6月						
日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	現場稼働日				休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

- ・盛土工
三井住友建設・ジェイアール東海建設JV 担当：池田
住所 中津川市千旦林1574地内
電話 0573-78-2515
- ・電気部品取付テント等設置工
ジェイアール東海建設 中津川作業所 担当：熊田
住所 中津川市千旦林1574地内
電話 0573-67-7167

中央新幹線自立式ガイドウェイ側壁 製作保管（中津川地区）工事だより

2025年
5月
vol. 32

お知らせ


中央新幹線ガイドウェイ資材置場ヤード内にて盛土工、電気部品取付テント等設置の工事を進めます。
工事に伴い資材等の運搬を予定していますので、交通マナーや交通ルールを守り工事を進めます。地域のみなさまにはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

現場状況等（2025. 4. 15日時点）

- ・盛土工（他工事発生土）：搬入した土で掘削部を盛土しています。
- ・電気部品取付テント等設置工：電気部品取付テント等の構築をしています。



盛土工

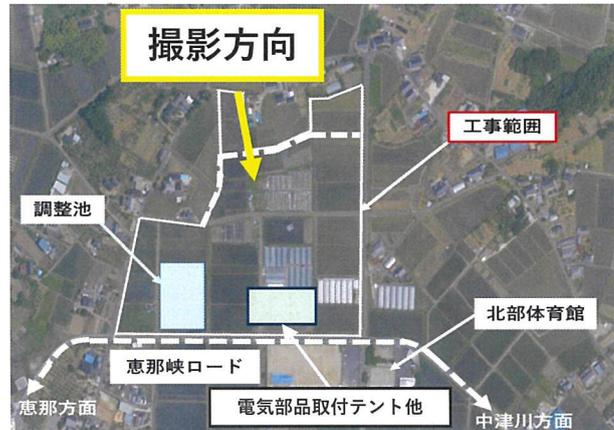

本工事の工事範囲

【工事工程】

工 種	5月	6月	7月	備考
盛土工（他工事発生土）				主にトンネル発生土をダンプで搬入し盛土します。
電気部品取付けテント等設置工				電気部品取付テント等の設置をします。

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

5月						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
			現場稼働日			休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

- ・盛土工
三井住友建設・ジェイアール東海建設JV 担当：池田
住所 中津川市千旦林1574地内
電話 0573-78-2515
- ・電気部品取付テント等設置工
ジェイアール東海建設 中津川作業所 担当：熊田
住所 中津川市千旦林1574地内
電話 0573-67-7167

中央新幹線自立式ガイドウェイ側壁 製作保管（中津川地区）工事だより

2025年
4月
vol. 31

お知らせ


中央新幹線ガイドウェイ資材置場ヤード内にて盛土工、門型クレーン設置工、電気部品取付テント等設置工の工事を進めます。
工事に伴い資材等の運搬を予定していますので、交通マナーや交通ルールを守り工事を進めます。地域のみなさまにはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

現場状況等（2025. 3. 13日時点）

- ・門型クレーン設置工：門型クレーンの設置をしています。
- ・電気部品取付テント等設置工：電気部品取付テント等の構築準備をしています。



門型クレーン設置工

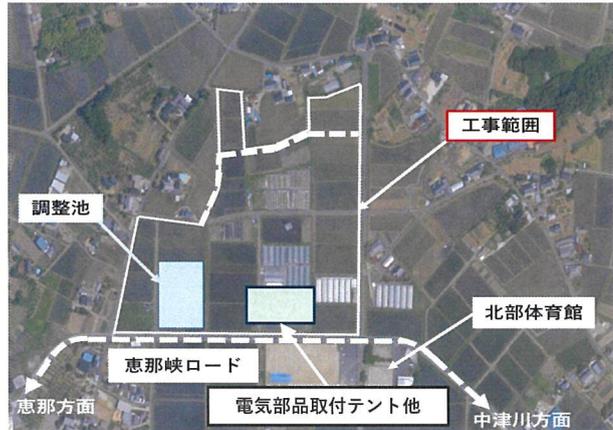

本工事の工事範囲

【工事工程】

工 種	4 月	5 月	6 月	備考
盛土工（他工事発生土）				主にトンネル発生土をダンプで搬入し盛土します。
門型クレーン設置工				門型クレーンの設置をします。
電気部品取付けテント等設置工				電気部品取付テント等の設置をします。

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

		4月				
日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
		現場稼働日			休工日	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

- ・盛土工・門型クレーン設置工
三井住友建設・ジェイアール東海建設IV 担当：池田
住所 中津川市千旦林1574地内
電話 0573-78-2515
- ・電気部品取付テント等設置工
ジェイアール東海建設名古屋統括作業所 担当：熊田
住所 愛知県名古屋市中村区亀島 2-1-1
電話 052-454-3522
