

瀬戸トンネル 工事便り

2022年
12
vol. 41

お知らせ

☆12月の作業予定

12月の主な作業は、引き続きトンネル掘削とズリのダンプ運搬です。早いもので、今年も残り1ヶ月です。今年は、皆さまのご理解もあり、5月から工事を再開し、トンネル掘削を進めさせていただいております。年末年始は約1週間の休工を予定とし、来年も引き続き工事を進めて参りますので、宜しくお願い致します。良いお年をお迎えください。

現在のトンネルの進捗は、斜坑の掘削が約320m（11月15日現在）まで進んでおります（全長は約600m）。野久保断層部分の掘削は、水平ボーリングで前方探査を行って事前に地質を調査し、地山改良を併用しながら慎重に掘削を行い、無事通過しました。湧水も非常に少量でした。

写真は、坑内から坑口方向を見たトンネル内の状況です。



写真-1 トンネル内状況

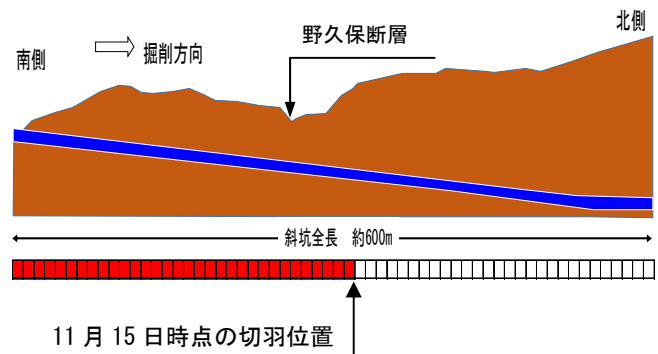


図-1 トンネル掘削進捗縦断面図

主な工事工程

工種	土の運搬先	11月	12月	1月	備考
トンネル掘削 (斜坑)	瀬戸地区 埋立て事業				100~250台 (往復※)

※運行台数は、両方向の合計交通量を示しています

☆工事に関するご意見・お問い合わせ☆
中央新幹線 瀬戸トンネルJV工事事務所
電話0573-64-2980
