

# 瀬戸トンネル 工事便り

2023年

1

vol. 42

## お知らせ

### ☆1月の作業予定

新年、明けましておめでとうございます。2023年は、斜坑の掘削を終え、いよいよリニア中央新幹線が走行する本坑の掘削に着手する予定です。

1月の主な作業は、引き続きトンネル掘削とズリのダンプ運搬です。本年もどうぞ宜しくお願い致します。

現在のトンネルの進捗は、斜坑の掘削が約380m（12月13日現在）まで進んでおります（全長は約600m）。

写真は、発破前の火薬を装填している状況です。高所では、ドリルジャンボに搭載されているマンケージと呼ばれるカゴに人が乗り、低所では、落石防護ネットを人の上部に張って防護した状態で作業を行います。



写真-1 装薬状況

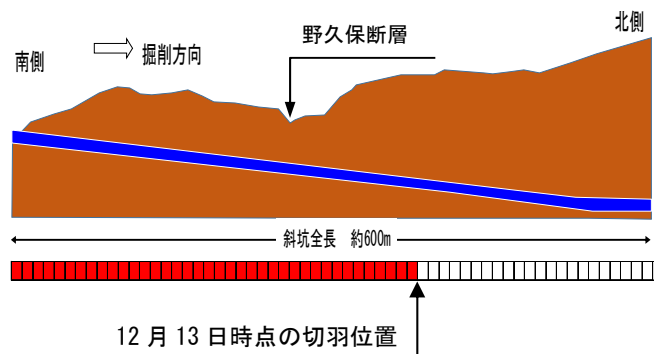


図-1 トンネル掘削進捗縦断面図

### 主な工事工程

工種	土の運搬先	12月	1月	2月	備考
トンネル掘削 (斜坑)	瀬戸地区 埋立て事業	—————			100～250台 (往復※)

※運行台数は、両方向の合計交通量を示しています

☆工事に関するご意見・お問い合わせ☆  
中央新幹線 瀬戸トンネルJV工事事務所  
電話0573-64-2980
