

中央アルプストンネル (山口) 工事だより

2023年
3月
vol. 69

お知らせ

今月も本坑の品川方への掘削およびコンクリート工事を進めます。
梅や桜の季節ではありますが、寒の戻りで急に冷えたりする時期でもありますので、
車両の運転時にはスリップをしないように十分注意してまいります。
皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

工事状況等 (2023.2.10時点)

【進捗状況】

- トンネル工：現在、本坑を品川方へ掘削しています。約 1,430m分の掘削が完了し、順調に掘削を進めております。その後方でコンクリート工事を施工しています。
トンネルの切羽は安定しており、切羽面での湧水も多くありません。


【工事工程】

工種	3月	4月	5月	備考
トンネル工				
発生土運搬 (坂本地区)				1日50台(4往復)程度運搬予定
(中津西地区)				1日15台(5往復)程度運搬予定
(馬籠地区)				状況により運搬することあり



本坑

【進捗図】

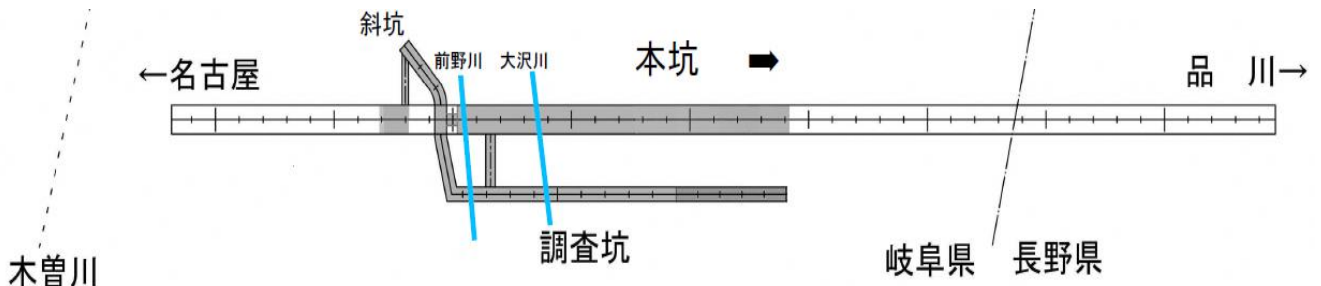

3月

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

発生土運搬予定日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

鹿島・日本国土開発・吉川特定建設工事共同企業体
中央アルプストンネル(山口)JV工事事務所
住所 中津川市山口1605-1
電話 0573-67-9317
(渉外担当：永柄、発生土運搬担当：熊谷)
