

中央アルプストンネル(山口) 工事だより

2023年
9月
vol. 75

お知らせ

今月も本坑の品川方への掘削と路盤および覆工コンクリート工事を進めます。
天候の急変に加え、台風上陸が多い季節になってきましたので、車両運行時には車間距離の確保と安全な速度による走行に留意して参ります。
皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

工事状況等(2023.8.10時点)

【進捗状況】

- トンネル工：現在、本坑を品川方へ掘削しています。約1,820m分の掘削が完了しています。その後方で路盤と覆工のコンクリート打設工事を交互に行っています。


【工事工程】

工種	9月	10月	11月	備考
トンネル工				
発生土運搬 (坂本地区)				1日50台(4往復)程度運搬予定
(中津西地区)				1日10台(5往復)程度運搬予定
(馬籠地区)				状況により運搬することあり



中津川消防署との救護訓練状況

【進捗図】

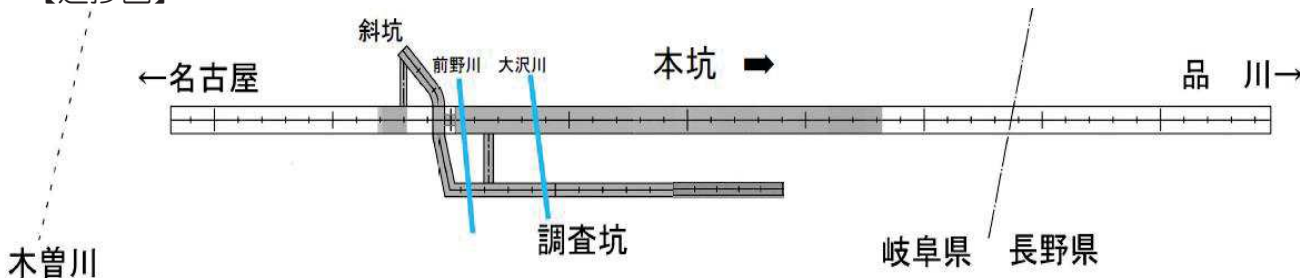

9月						
日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
<input type="checkbox"/> 発生土運搬予定日						

【工事に関するご意見・お問い合わせ】
 鹿島・日本国土開発・吉川特定建設工事共同企業体
 中央アルプストンネル(山口)JV工事事務所
 住所 中津川市山口1605-1
 電話 0573-67-9317
 (渉外担当：永柄、発生土運搬担当：熊谷)
