

中央アルプストンネル (山口)  
工事だより

2023年  
11月  
vol. 77

お知らせ

今月も引き続き、本坑の品川方への掘削を進めます。路盤および覆工コンクリート工事は年内まで一時的に休止することから、生コン車の運搬が従来よりも減る見込みです。工事の施工、ダンプの運転とも安全第一に進めて参ります。皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

工事状況等 (2023. 10. 11 時点)

【進捗状況】

- トンネル工：現在、本坑を品川方へ掘削しています。約 1,880m分の掘削が完了しています。その後方で路盤と覆工のコンクリート打設工事を交互に行っています。


【工事工程】

工種	11月	12月	1月	備考
トンネル工				
発生土運搬 (坂本地区)				1日40台(4往復)程度運搬予定
(中津西地区)				1日10台(5往復)程度運搬予定
(馬籠地区)				状況により運搬することあり



路盤・覆工状況

【進捗図】

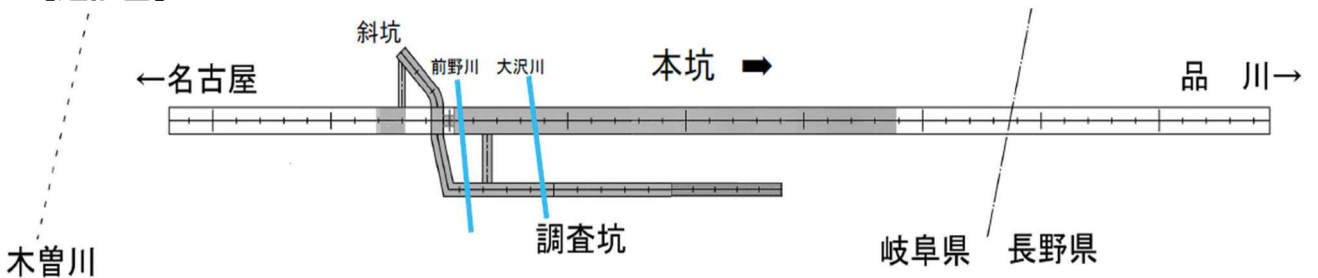

11月

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

発生土運搬予定日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】  
 鹿島・日本国土開発・吉川特定建設工事共同企業体  
 中央アルプストンネル(山口)JV工事事務所  
 住所 中津川市山口1605-1  
 電話 0573-67-9317  
 (渉外担当：永柄、発生土運搬担当：熊谷)
