

第二木曾川橋りょう 工事便り

2025年
3月

お知らせ

【2025年3月の作業予定】

1. P3橋脚基礎工事(仮締切り工)

2. P4橋脚基礎工事(調査ボーリング)


P3、P4橋脚基礎工事は土祝も稼働を予定しています。

※工事の進捗状況により日曜日も作業をさせていただく可能性がありますが、日祝は鋼矢板の打設は行いません。

※上地区取付道路は、舗装等、一部の工事が未了であり、一般車両の通行の安全確保が難しいため、当面は工事専用道として使用します。

緊急時には地元の皆様にもご通行いただけるように致します。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

工事状況等 (2025.2.3 時点)

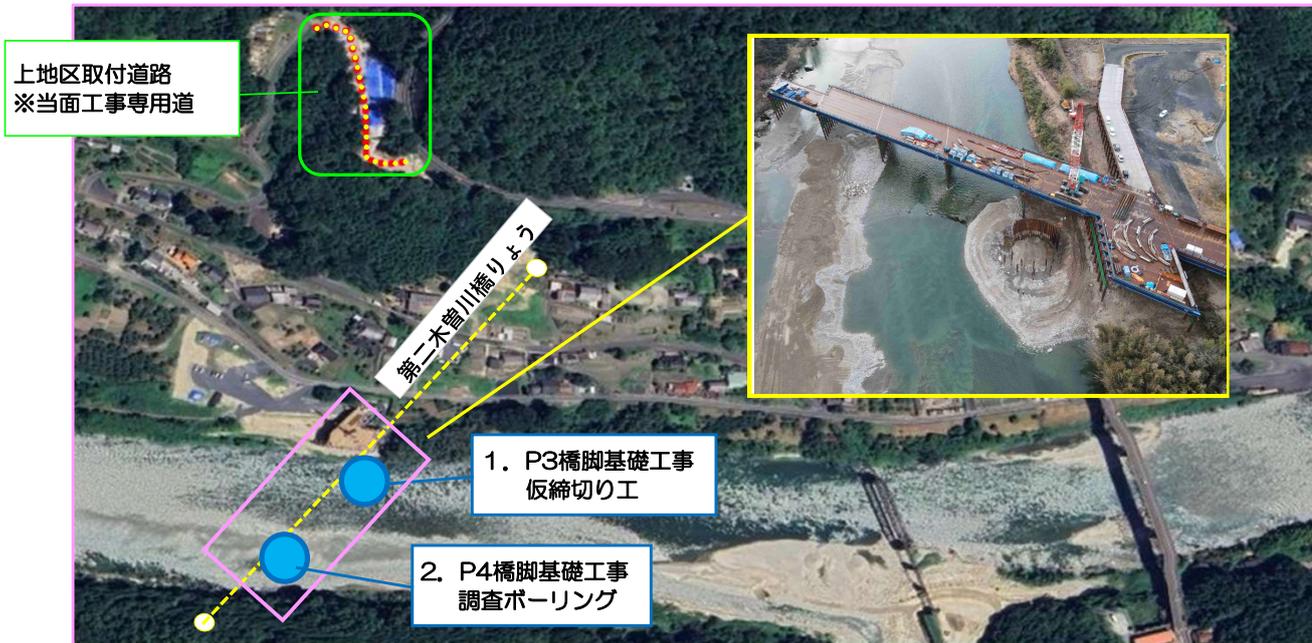

※上地広場から棧橋周辺への立入りはご遠慮下さい。

【工事工程】

月	令和7年3月				4月 上旬	※土祝も稼働 作業時間最大:7:00~19:00
	2月 下旬	上旬	中旬	下旬		
1. P3橋脚基礎工事	仮締切り工					
2. P4橋脚基礎工事	調査ボーリング					

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合がございます。

3月						
日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					
		現場稼働日		休工日		

工事に関するご意見・お問い合わせ

中央新幹線

第二木曾川橋りょうほか新設工事作業所

住所：岐阜県中津川市北野町4-30

電話：0573-67-8517

第二木曾川橋りょう 工事便り

2025年
2月

お知らせ

【2025年2月の作業予定】

1. P3橋脚基礎工事(調査ボーリング、仮締切り工)

2. P4橋脚基礎工事(転石撤去、調査ボーリング)

P3、P4橋脚基礎工事は土祝も稼働を予定しています。

※1月の工事便りで、1月からケーソン設備工事を開始するとお伝えしておりましたが、

現在、河川内で仮締切り工を行っており、転石、岩があることから、その調査や除去作業を実施しています。

※工事の進捗状況により日曜日も作業をさせていただく可能性がありますが、日祝は鋼矢板の打設は行いません。

※上地区取付道路は、舗装等、一部の工事が未了であり、一般車両の通行の安全確保が難しいため、当面は工事専用道として使用します。

緊急時には地元の皆様にもご通行いただけるように致します。ご理解のほどよろしくお願い致します。

工事状況等 (2025.1.8 時点)



※上地広場から棧橋周辺への立入りはご遠慮下さい。

【工事工程】

月	令和7年2月				3月	※土祝も稼働
	下旬	上旬	中旬	下旬		
1. P3橋脚基礎工事	調査ボーリング	仮締切り工				作業時間最大: 7:00~19:00
2. P4橋脚基礎工事	転石撤去、調査ボーリング					

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合がございます。

2月						
日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	
		現場稼働日		休工日		

工事に関するご意見・お問い合わせ

中央新幹線

第二木曾川橋りょうほか新設工事作業所

住所：岐阜県中津川市北野町4-30

電話：0573-67-8517

第二木曾川橋りょう 工事便り

2025年
1月

お知らせ

【2025年1月の作業予定】

1. P3橋脚基礎工事(仮締切り工・ケーソン工)
2. ケーソン設備工事

1. P3橋脚基礎工事 2. ケーソン設備工事は土祝も稼働を予定しています。


2024年の工事は12月27日まで(進捗状況により28日まで)、2025年の工事は1月6日からの予定です。

※工事の進捗状況により日曜日も作業をさせていただく可能性がありますが、日祝は鋼矢板の打設は行いません。

※上地区取付道路は、舗装等、一部の工事が未了であり、一般車両の通行の安全確保が難しいため、当面は工事専用道として使用します。

緊急時には地元の皆様にもご通行いただけるように致します。ご理解のほどよろしく申し上げます。

工事状況等 (2024.12.5 時点)

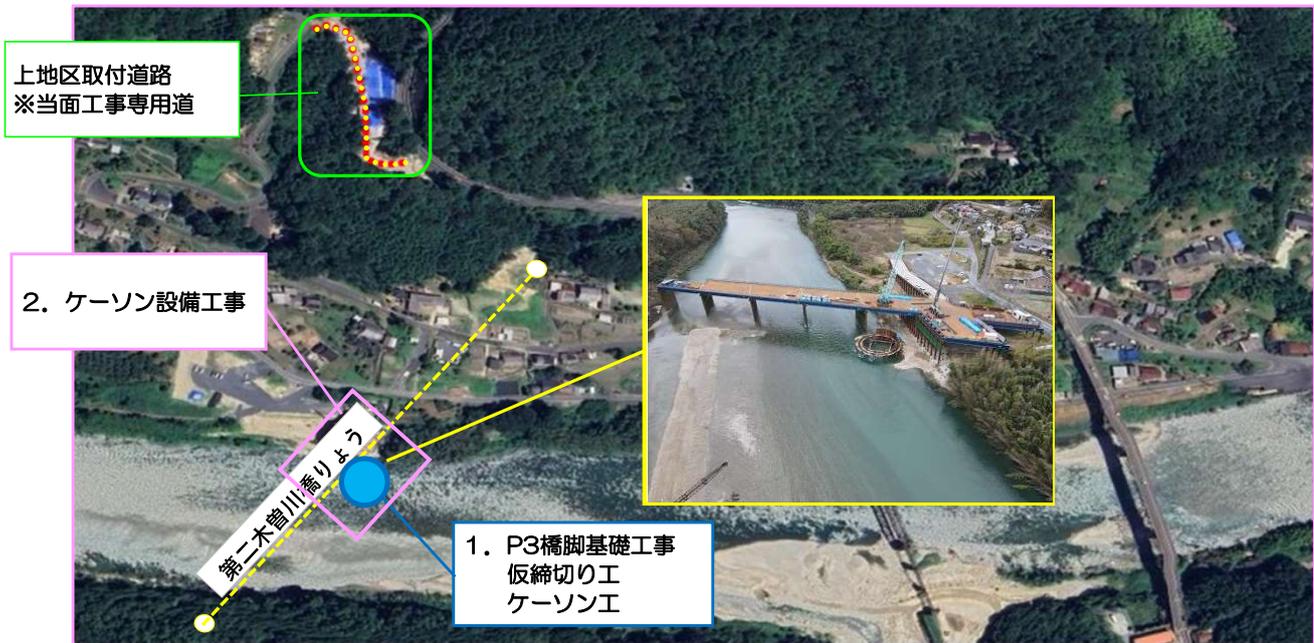

※上地広場から棧橋周辺への立入りはご遠慮下さい。

【工事工程】

月	令和7年1月				2月 上旬	※土祝も稼働
	12月 下旬	上旬	中旬	下旬		
1. P3橋脚基礎工事	先行削孔	仮締切り工・ケーソン工				作業時間最大:7:00~19:00
2. ケーソン設備工事		ケーソン設備				作業時間最大:8:00~17:00

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合がございます。

1月						
日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
			現場稼働日			休工日

工事に関するご意見・お問い合わせ

中央新幹線

第二木曾川橋りょうほか新設工事作業所

住所：岐阜県中津川市北野町4-30

電話：0573-67-8517

第二木曾川橋りょう 工事便り

2024年
12月

お知らせ

【2024年12月の作業予定】

1. P3橋脚基礎工事(仮締切り先行削孔・仮締切り工)
2. ケーソン設備工事

1. P3橋脚基礎工事 2. ケーソン設備工事は土祝も稼働を予定しています。


2024年の工事は12月27日まで、2025年の工事は1月6日からの予定です。

※工事の進捗状況により日曜日も作業をさせていただく可能性がありますが、日祝は鋼矢板の打設は行いません。

※上地区取付道路は、舗装等、一部の工事が未了であり、一般車両の通行の安全確保が難しいため、当面は工事専用道として使用します。

緊急時には地元の皆様にもご通行いただけるように致します。ご理解のほどよろしく申し上げます。

工事状況等 (2024.11.8 時点)

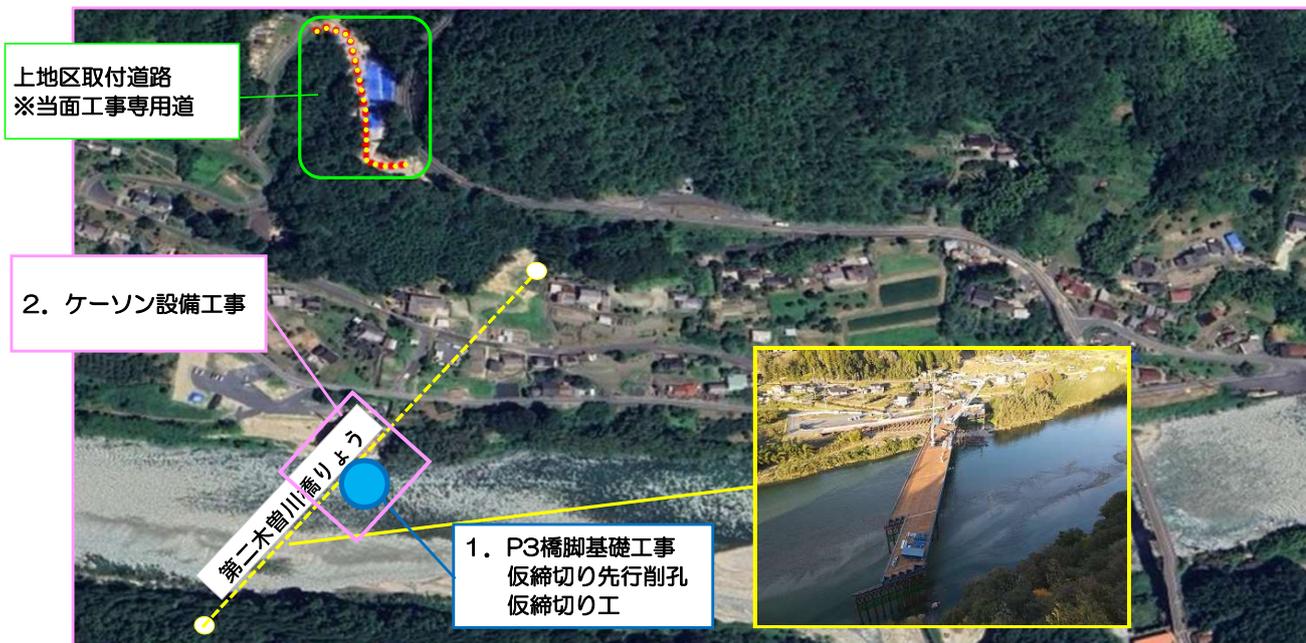

※上地広場から棧橋周辺への立入りはご遠慮下さい。

【工事工程】

月	令和6年12月				令和7年1月	※1・2は土祝も稼働
	11月 下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	
1. P3橋脚基礎工事	仮締切り先行削孔 仮締切り工				ケーソン工	作業時間最大:7:00~19:00
2. ケーソン設備工事			ケーソン設備			作業時間最大:8:00~17:00

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合がございます。

12月						
日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

現場稼働日
 休工日

工事に関するご意見・お問い合わせ

中央新幹線

第二木曾川橋りょうほか新設工事作業所

住所：岐阜県中津川市北野町4-30

電話：0573-67-8517

第二木曾川橋りょう 工事便り

2024年
11月

お知らせ

【2024年11月の作業予定】

1. P3橋脚基礎工事(仮締切り先行削孔・仮締切り工)
2. 仮設電気設備、ケーソン設備工事
3. 上地路盤地質調査(ボーリング調査)

1. P3ケーソン工事 2. 仮設電気設備、ケーソン設備工事は土祝も稼働を予定しています。
※工事の進捗状況により日曜日にも作業をさせていただく可能性がありますが、日祝は鋼矢板の打設は行いません。

3. 上地路盤地質調査は土日を休工します。

※上地区取付道路は、舗装等、一部の工事が未了であり、一般車両の通行の安全確保が難しいため、当面は工事専用道として使用します。

緊急時には地元の皆様にもご通行いただけるように致します。ご理解のほどよろしくお願い致します。

工事状況等 (2024.10.11 時点)



※上地広場から栈橋周辺への立入りはご遠慮下さい。

【工事工程】

月	令和6年11月				12月	※1・2は土祝も稼働 3は土日休工
	10月 下旬	10月 上旬	11月 中旬	11月 下旬		
1. P3橋脚基礎工事	仮締切り先行削孔 仮締切り工				ケーソン工	作業時間最大:7:00~19:00
2. 仮設電気設備 ケーソン設備工事			仮設電気設備	ケーソン設備		作業時間最大:8:00~17:00
3. 上地路盤地質調査	ボーリング調査					作業時間:8:00~17:00

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合がございます。

11月

日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

現場稼働日 休工日

工事に関するご意見・お問い合わせ

中央新幹線

第二木曾川橋りょうほか新設工事作業所

住所：岐阜県中津川市北野町4-30

電話：0573-67-8517

第二木曾川橋りょう 工事便り

2024年
10月

お知らせ

【2024年10月の作業予定】

1. 仮栈橋設置工事(鋼管杭打設・仮栈橋架設)
2. P3橋脚基礎工事(仮締切り先行削孔)
3. 上地区取付道路は11月から工事再開予定
4. 上地路盤地質調査(モノレール設置・ボーリング調査)

1. 仮栈橋設置工事、2. P3橋脚基礎工事は土祝も稼働を予定しています。


※工事の進捗状況により日曜日にも作業をさせていただく可能性がありますが、日祝は杭の打設は行いません。

3. 上地区取付道路、4. 上地路盤地質調査は土日を休工します。

※上地区取付道路は、舗装等、一部の工事が未了であり、一般車両の通行の安全確保が難しいため、当面工事専用道として使用します。

緊急時には地元の皆様にもご通行いただけるように致します。ご理解のほどよろしくお願ひします。

工事状況等 (2024.9.3 時点)

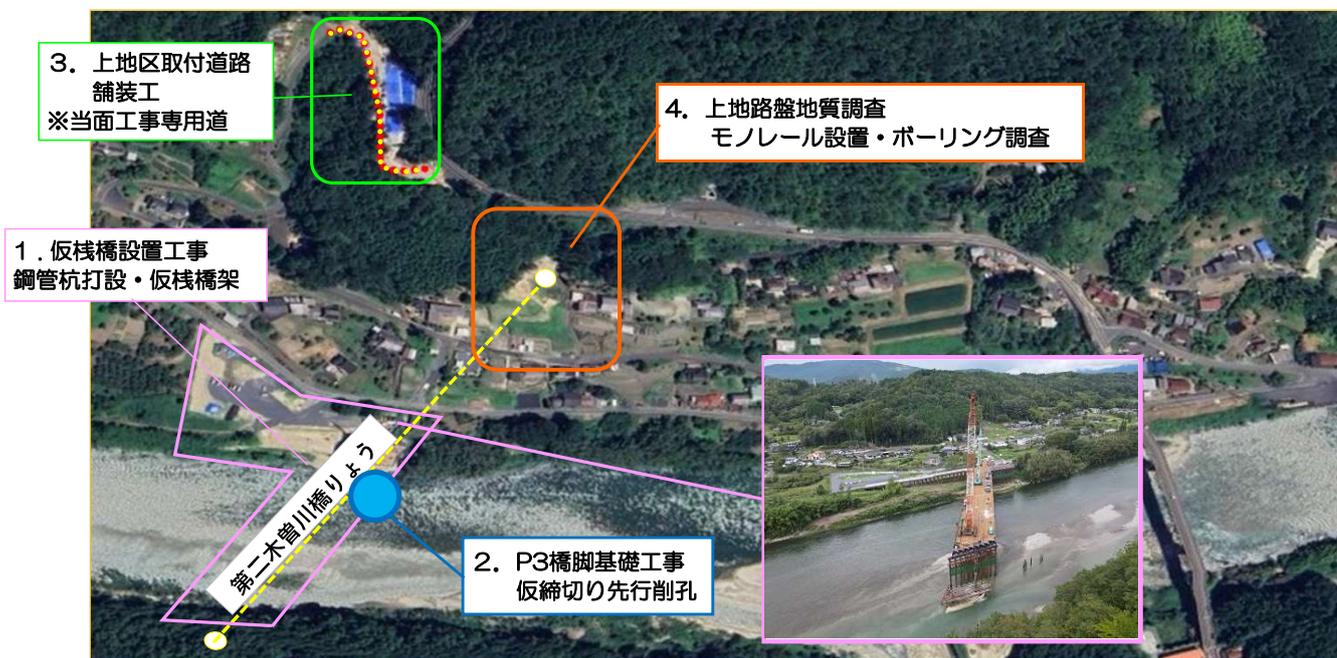

※上地広場から栈橋周辺への立入りはご遠慮下さい。

【工事工程】

月	令和6年10月				11月 上旬	※1・2は土日祝も可動 3・4は土日休工
	9月 下旬	上旬	中旬	下旬		
1. 仮栈橋設置工事	鋼管杭打設・仮栈橋架設					作業時間最大:7:00~19:00 鋼管杭打設 :8:00~17:00
2. P3橋脚基礎工事		仮締切り先行削孔			仮締切り	作業時間最大:7:00~19:00 鋼管杭打設 :8:00~17:00
3. 上地区取付道路					舗装工	作業時間:8:00~17:00
4. 上地路盤地質調査		モノレール設置・ボーリング調査				作業時間:8:00~17:00

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合がございます。

10月

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
		現場稼働日		休工日		

工事に関するご意見・お問い合わせ

中央新幹線

第二木曾川橋りょうほか新設工事作業所

住所：岐阜県中津川市北野町4-30

電話：0573-67-8517

第二木曾川橋りょう 工事便り

2024年
9月

お知らせ

【2024年9月の作業予定】

仮栈橋設置工事(鋼管杭打設・仮栈橋架設)

日曜日は休工を基本とします。

※上地区取付道路は、舗装等、一部の工事が未了であり、一般車両の通行の安全確保が難しいため、当面工事専用道として使用します。

緊急時には地元の皆様にもご通行いただけるように致します。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

工事状況等 (2024.8.1 時点)



※上地広場から栈橋周辺への立入りはご遠慮下さい。

【工事工程】

月	令和6年9月				10月 上旬	※日曜日休工
	8月 下旬	上旬	中旬	下旬		
1. 仮栈橋設置工事	鋼管杭打設・仮栈橋架設					作業時間最大:7:00~19:00 鋼管杭打設 :8:00~17:00

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合がございます。

9月						
日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					
			現場稼働日			休工日

工事に関するご意見・お問い合わせ

中央新幹線

第二木曾川橋りょうほか新設工事作業所

住所 : 岐阜県中津川市北野町4-30

電話 : 0573-67-8517

第二木曾川橋りょう 工事便り

2024年
8月

お知らせ

【2024年8月の作業予定】

仮栈橋設置工事(鋼管杭打設・仮栈橋架設)

土曜日・日曜日は休工を基本としますが、平日に悪天候が続く場合は悪天候日を休工とし土曜日稼働とさせていただきます場合があります。

8月10日～8月18日は夏季休暇の予定です。

※上地区取付道路は、舗装等、一部の工事が未了であり、一般車両の通行の安全確保が難しいため、当面工事専用道として使用します。

緊急時には地元の皆様にもご通行いただけるように致します。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

工事状況等 (2024.6.26 時点)



※上地広場から栈橋周辺への立入りはご遠慮下さい。

【工事工程】

月	令和6年8月				9月 上旬	※土曜日・日曜日休工
	7月 下旬	上旬	中旬	下旬		
1. 仮栈橋設置工事	鋼管杭打設・仮栈橋架設					作業時間最大:7:00~19:00 鋼管杭打設 :8:00~17:00
2. A1P1ヤード 造成工事				仮囲い設置		

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合がございます。

8月						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
		現場稼働日		休工日		

工事に関するご意見・お問い合わせ

中央新幹線

第二木曾川橋りょうほか新設工事作業所

住所 : 岐阜県中津川市北野町4-30

電話 : 0573-67-8517

第二木曾川橋りょう 工事便り

2024年
7月

お知らせ

【2024年7月の作業予定】

土曜日・日曜日は休工します。

仮栈橋設置工事(鋼管杭打設・仮栈橋架設)

※上地区取付道路は緊急時には上地区の皆様にご通行いただけますが、通常は当面工事専用道として使用いたしますこと、ご理解願います。

工事状況等 (2024.6.5 時点)



※上地広場から栈橋周辺への立入りはご遠慮下さい。

【工事工程】

月	令和6年7月				8月	※土曜日・日曜日休工
	6月 下旬	6月 中旬	7月 中旬	7月 下旬		
1. 仮栈橋設置工事	鋼管杭打設・仮栈橋架設					作業時間最大:7:00~19:00 鋼管杭打設 :8:00~17:00
2. A1P1ヤード 造成工事				仮囲い設置		

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合がございます。

7月						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

■ 現場稼働日 ■ 休工日

工事に関するご意見・お問い合わせ

中央新幹線
第二木曾川橋りょうほか新設工事作業所
住所：岐阜県中津川市北野町4-30
電話：0573-67-8517

第二木曾川橋りょう 工事便り

2024年
6月

お知らせ

【2024年6月の作業予定】

土曜日・日曜日は休工します。

仮栈橋設置工事(鋼管杭打設・仮栈橋架設)

上地区取付道路(排水工・道路工)を予定しています。

※上地区取付道路は緊急時には上地区の皆様にご通行いただけますが、通常は当面工事専用道として使用いたしますこと、ご理解願います。

工事状況等 (2024.5.10 時点)



※上地広場から栈橋周辺への立入りはご遠慮下さい。

【工事工程】

月	令和6年6月				7月 上旬	※土曜日・日曜日休工
	5月 下旬	上旬	中旬	下旬		
1. 仮栈橋設置工事	鋼管杭打設・仮栈橋架設					作業時間最大:7:00~19:00 鋼管杭打設 :8:00~17:00
2. 上地区取付道路	排水工・道路工					6月から未舗装で工事用道路として使用します

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合がございます。

6月						
日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						
		現場稼働日		休工日		

工事に関するご意見・お問い合わせ

中央新幹線
第二木曾川橋りょうほか新設工事作業所
住所：岐阜県中津川市北野町4-30
電話：0573-67-8517

第二木曾川橋りょう 工事便り

2024年
5月

お知らせ

【2024年5月の作業予定】

土曜日も作業し、日曜日祝日は休工します。

仮栈橋設置工事(鋼管杭打設・仮栈橋架設)

上地区取付道路(土工事・排水工・道路工・法面工)を予定しています。

※上地区取付道路は6月以降当面、未舗装で工事用道路として使用します。上地区の皆様は緊急時のみ、ご利用
いただくようご協力をお願いします。

ゴールデンウィーク中の現場閉所は4/28～5/6を予定しています。

工事状況等 (2024.4.5 時点)



※上地広場に仮囲いなどの資機材を仮置きさせていただくことがあります。

【工事工程】

月	令和6年5月					6月 上旬	※土曜日：稼働・日曜日祝日休工 4/28～5/6現場閉所 作業時間最大：7:00～19:00 鋼管杭打設：8:00～17:00
	4月 下旬	上旬	中旬	下旬			
1. 仮栈橋設置工事	鋼管杭打設・仮栈橋架設						
2. 上地区取付道路	土工事・排水工・道路工・法面工						6月から未舗装で工事用道路として使用します

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合がございます。

5月						
日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
現場稼働日			休工日			

工事に関するご意見・お問い合わせ

中央新幹線

第二木曾川橋りょうほか新設工事作業所

住所：岐阜県中津川市北野町4-30

電話：0573-67-8517

第二木曾川橋りょう 工事便り

2024年
4月

お知らせ

【2024年4月の作業予定】
土曜日も作業し、日曜日祝日は休工します。
仮栈橋設置工事(鋼管杭打設・仮栈橋架設)
上地区取付道路(土工事・排水工・道路工・法面工)を予定しています。
ゴールデンウィーク中の現場閉所は4/28～5/6を予定しています。

工事状況等 (2024.3.11 時点)



※上地広場に仮囲いなどの資機材を仮置きさせていただくことがあります。

【工事工程】

月	令和6年4月				5月	※土曜日:稼働・日曜日祝日休工 4/28～5/6現場閉所
	3月 下旬	上旬	中旬	下旬		
1. 仮栈橋設置工事	鋼管杭打設・仮栈橋架設					作業時間最大:7:00～19:00 鋼管杭打設 :8:00～17:00
2. 上地区取付道路	土工事・排水工・道路工・法面工				道路工	

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合がございます。

4月

日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

■ 現場稼働日 ■ 休工日

工事に関するご意見・お問い合わせ

中央新幹線
第二木曾川橋りょうほか新設工事作業所
住所 : 岐阜県中津川市北野町4-30
電話 : 0573-67-8517
