

瀬戸トンネル 工事便り

2022年
9月
vol. 38

お知らせ

☆9月の作業予定

9月の主な作業は、引き続きトンネル掘削とズリのダンプ運搬です。トンネルの岩質は花崗岩という硬質な岩で、発破掘削（昼夜間）で施工を進めています。掘削箇所より先の地質は、水平ボーリングや削孔検層という前方探査を行いながら、トンネルの施工を実施しています。

現在のトンネルの進捗は、斜坑の掘削が約160m（8月17日現在）まで進んでおります（全長は約600m）。

写真は、先日実施した中津川消防署との避難・救護・通報訓練の状況で、AEDの使い方等を教えていただきました。現場には、AEDを常設しております。



写真-1 救護（AED使用）訓練

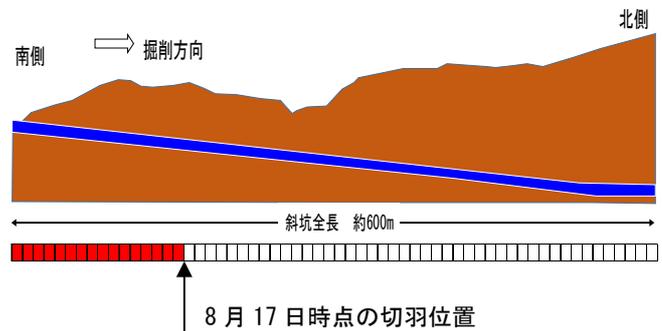


図-1 トンネル掘削進捗縦断図

主な工事工程

工種	土の運搬先	8月	9月	10月	備考
トンネル掘削 (斜坑)	瀬戸地区 埋立て事業				100~250台 (往復※)

※運行台数は、両方向の合計交通量を示しています

☆工事に関するご意見・お問い合わせ☆
中央新幹線 瀬戸トンネルJV工事事務所
電話0573-64-2980
