

瀬戸トンネル 工事便り

2023年
2月
vol. 43

お知らせ

☆2月の作業予定

2月の主な作業は、引き続きトンネル掘削とズリのダンプ運搬です。斜坑の掘削が終わった後は、斜坑と本坑の交差部の掘削、水槽や水中ポンプ等の仮設備の設置を行い、本坑の掘削に着手します。まだまだ寒い日は続きますので、凍結によるスリップ事故に気をつけ、安全運転に努めます。

現在のトンネルの進捗は、斜坑の掘削が約460m（1月17日現在）まで進んでおります（全長は約600m）。

写真は、拡幅部（手前）と標準部（奥側）の境界です。機械が離合するスペースを確保するため、拡幅部（延長約30m）を2箇所設けています。



写真-1 拡幅部と標準部

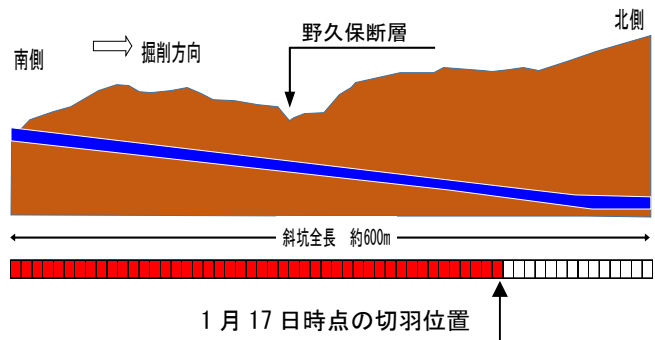


図-1 トンネル掘削進捗縦断図

主な工事工程

| 工種 | 土の運搬先 | 1月 | 2月 | 3月 | 備考 |
|----------------|---------------|----|----|----|-------------------|
| トンネル掘削 (斜坑) | 瀬戸地区 埋立て事業 | ■ | ■ | | 100~300台 (往復※) |
| 交差部 (斜坑・本坑) | 同上 | | | ■ | |

※運行台数は、両方向の合計交通量を示しています

☆工事に関するご意見・お問い合わせ☆
中央新幹線 瀬戸トンネルJV工事事務所
電話0573-64-2980
