回覧

中央新幹線第二木曽川橋りょう

第二木曽川橋りょう　工事便り


2026年
11月

お知らせ

【2026年11月の作業予定】
1. P3、P4ケーソン　仮締切鋼矢板打設、足場組立、ケーソン設備設置
2. P2橋脚基礎工事　掘削、残土搬出、土留工(吹付け、ロックボルト)
3. 巨石撤去

P3、P4、巨石撤去の工事は土祝も稼働をさせていただき、12月上旬からP3、P4工事で昼夜施工を予定しております。
※上地区取付道路は、一般供用開始しています。
　工事用道路としても、P2橋脚基礎工事の残土搬出車両等(ダンプ:最大18台／日、生コン車:最大5台／日)の通行を予定しています。皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。
※P2橋脚基礎の掘削工事において、硬い岩盤を掘削するために火薬を用いた発破作業を行います。市道の一時的な通行止め、発破作業地点から100m以内にお住まいの方(事前に同意書を記載して頂いている方)について発破時の建物内への退避にご協力お願い致します。
※P2橋脚基礎の発破時間については、10:00～17:00を予定しております。なお、発破予定については、仮囲いの市道に面する箇所に掲示し、周知致します。

工事状況等（2026.10.5時点）

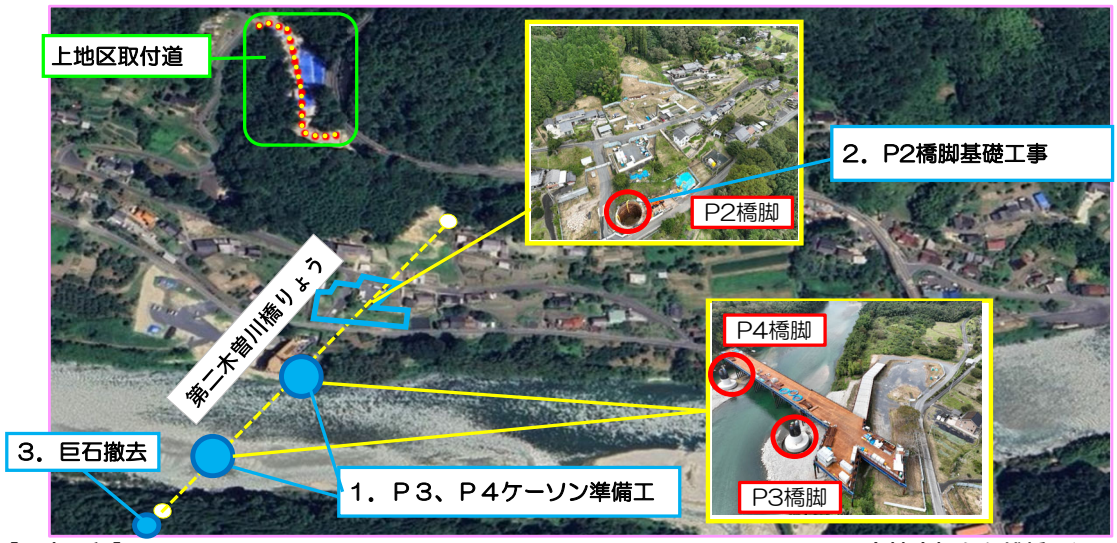

【工事工程】　※上地広場から桟橋周辺への立入りはご遠慮下さい。

月		10月	2026年11月			12月	
		下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	
1. P3ｹｰｿﾝ	昼	準備工	仮締切鋼矢板打設	足場組立	ｹｰｿﾝ設備設置	ｹｰｿﾝ掘削	昼間作業時間最大:7:00～22:00 夜間作業時間最大:17:00～8:00 ※工事状況等により変更の可能性があります。 土祝も稼働します。
	夜					ｹｰｿﾝ掘削	
1. P4ｹｰｿﾝ	昼	準備工	仮締切鋼矢板打設	足場組立	ｹｰｿﾝ設備設置	ｹｰｿﾝ掘削	
	夜					ｹｰｿﾝ掘削	
2. P2橋脚基礎工事		掘削、残土搬出、土留工(吹付け、ロックボルト)					作業時間最大:8:00～18:00 ダンプ通行予定時間:8:00～17:00
3. 巨石撤去		巨石小割り・運搬					作業時間最大:8:00～18:00 土祝も稼働します。

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合がございます。

11月

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

現場稼働日　休工日

工事に関するご意見・お問い合わせ

清水建設株式会社
中央新幹線　第二木曽川橋りょうほか新設工事作業所
住所　：　岐阜県中津川市北野町4-30
電話　：　0573-67-8517
